

# Chiapas


## Puente Rizo de Oro



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

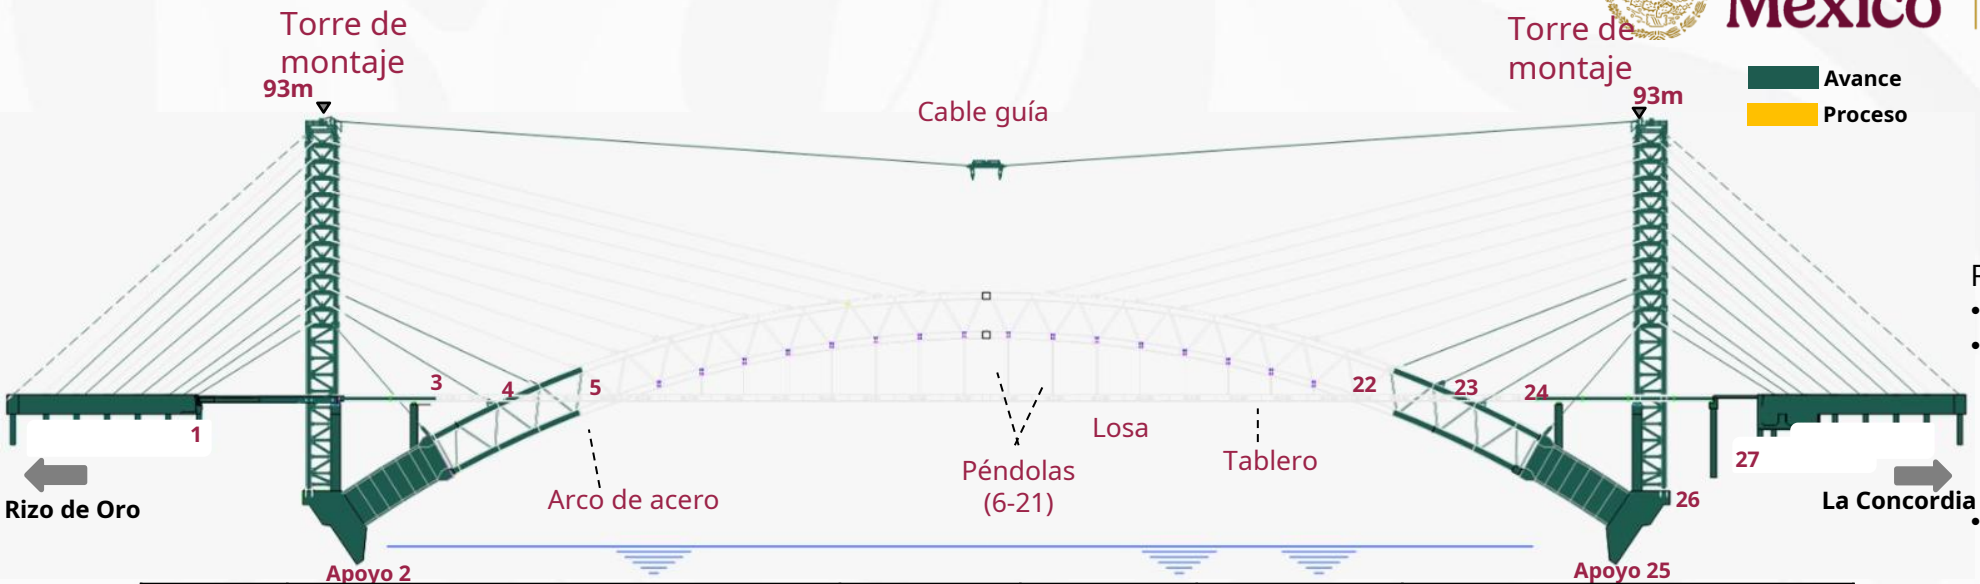

### Avance físico

- Programado: 83.27%
- Real: 83.53%
- Incremento Semanal: 0.37%
- Financiero: 83.17%

### RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- Condiciones climatológicas.
- Adecuación del carro de izaje: Esta tarea incluye el reforzamiento del sistema de tracción y la revisión de las tensiones de los cables longitudinales y transversales.
- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra

No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	11/11/25 al 17/11/25	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	2	2	1	Ejecutado el cabezal 4
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	Prueba de carga progresiva
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t )	2,731	761	1,970	92.9	92.9
	Montaje de Dovela de Superestructura (946 t )	946.70	367.74	578	41	41



**Inversión total:** 1,482.2 mdp  
**2023-2024:** 1,222.2 mdp  
**2025:** 260.0 mdp



**Inicio:** septiembre de 2023  
**Término:** 30 de junio de 2026



**Meta:** 1 Puente (405 m)  
1.7 km camino de acceso



**5,715** empleos generados



**300 mil** habitantes beneficiados




**60 min** de ahorro en tiempo

# Chiapas

## Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	11/11/25 al 17/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 85%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	761	1,970	92.9	92.9	Montaje con grúa sobre neumático.
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Empresas	
• <b>Contratista:</b> COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• <b>Supervisión:</b> JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

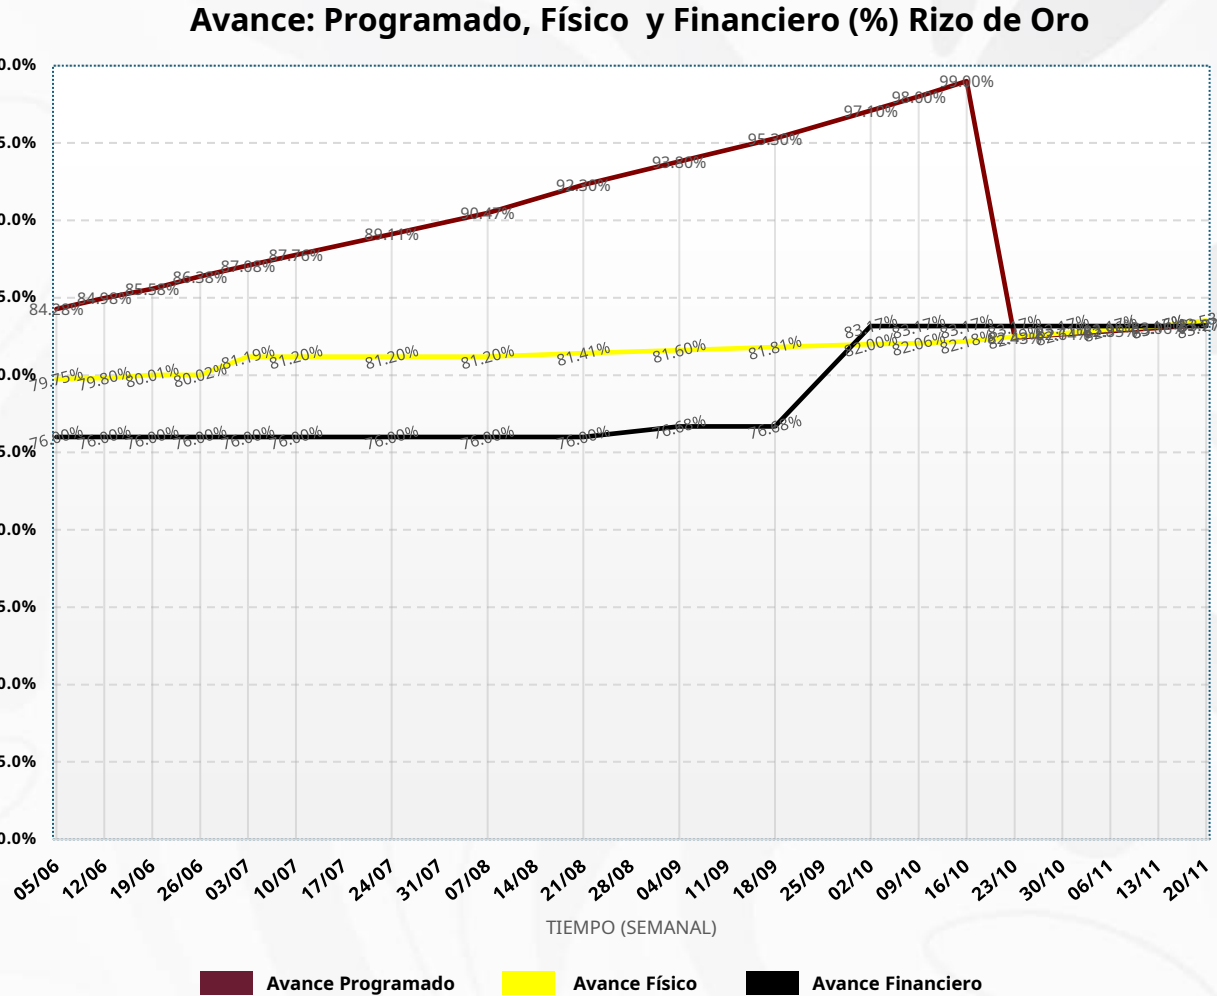

	04/11/25 al 10/11/25	11/11/25 al 17/11/25
Fuerza de Trabajo (personas)	200	200
Maquinaria	81	80
