


Puente Vehicular Nichupté



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Programado: 90.5%
- Real: 89.8%
- Semanal: 0.70%
- Financiero: 95.5%

(REPROGRAMACION)

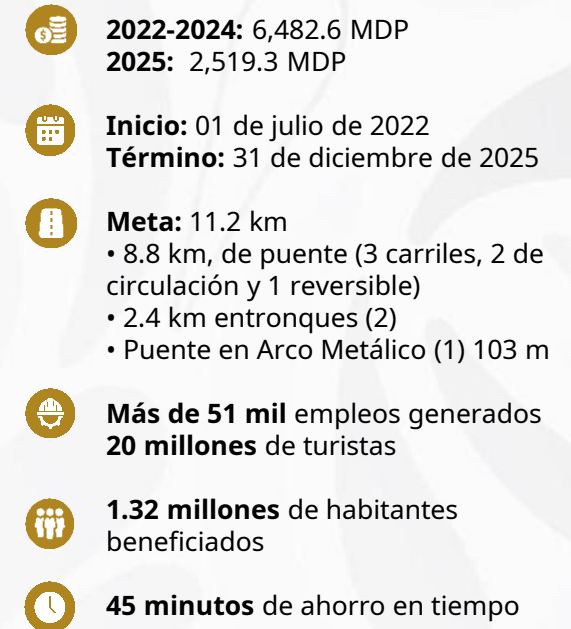


Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 30 octubre al 05 de noviembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	1	1	Octubre 2025
Columnas (pza)	926	910.6	10	1	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	237	3	2	Octubre 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	226	14	2	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulkán)	16	15	1	0	Octubre 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,604	54	14	Octubre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,497	161	18	Noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	134	16	0	Noviembre 2025
Fabricación de prelosas (pza)	44,809	38,642	6,167	1,505	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	33,060	11,749	1,800	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	207.9	73.2	4.5	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	10,739.4	10,030.2	244	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	9,432	11,337.5	341	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

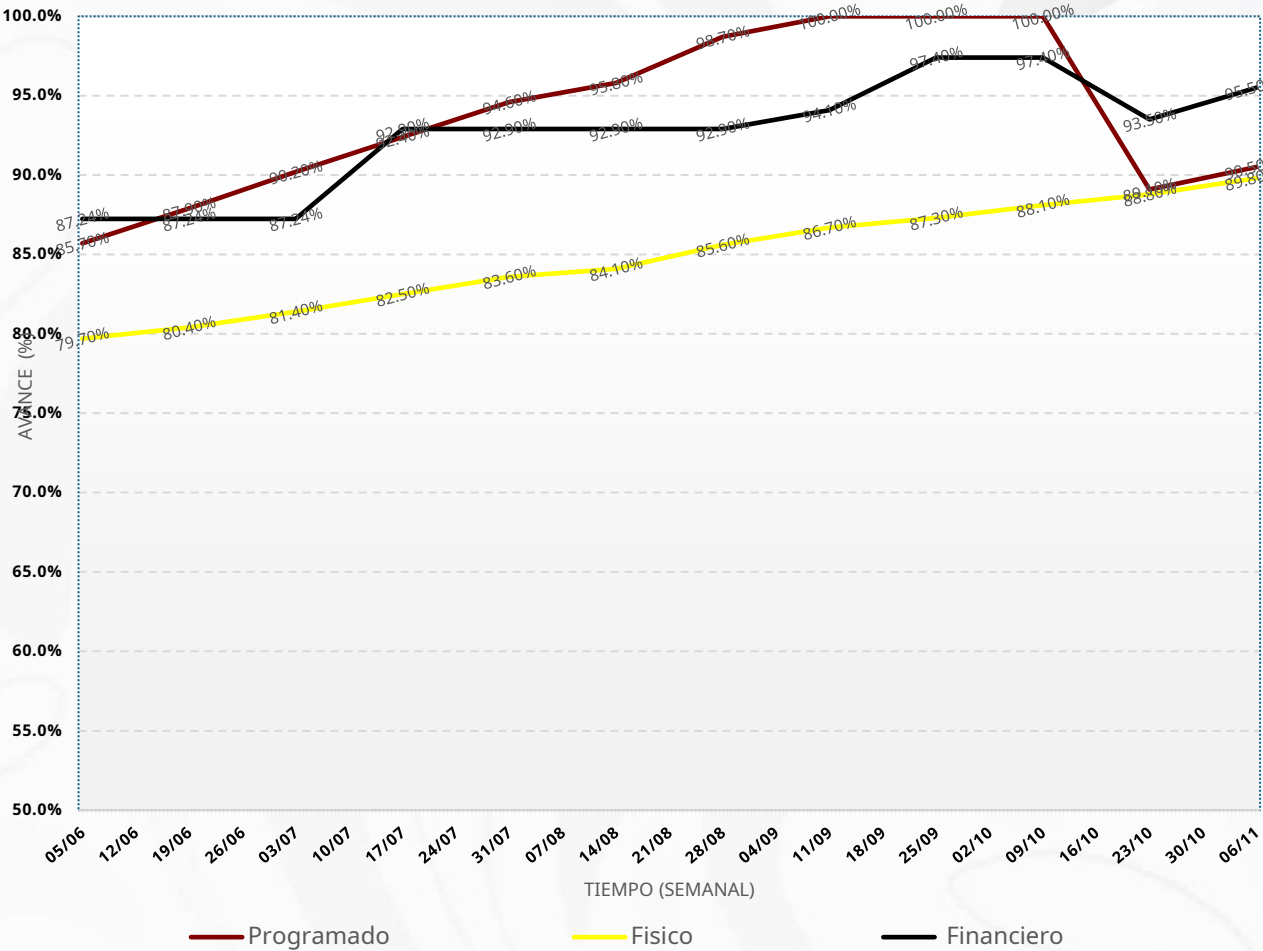

	23 al 29 de octubre	30 de octubre al 05 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	788	787
Maquinaria	88	86
