

Chiapas


Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

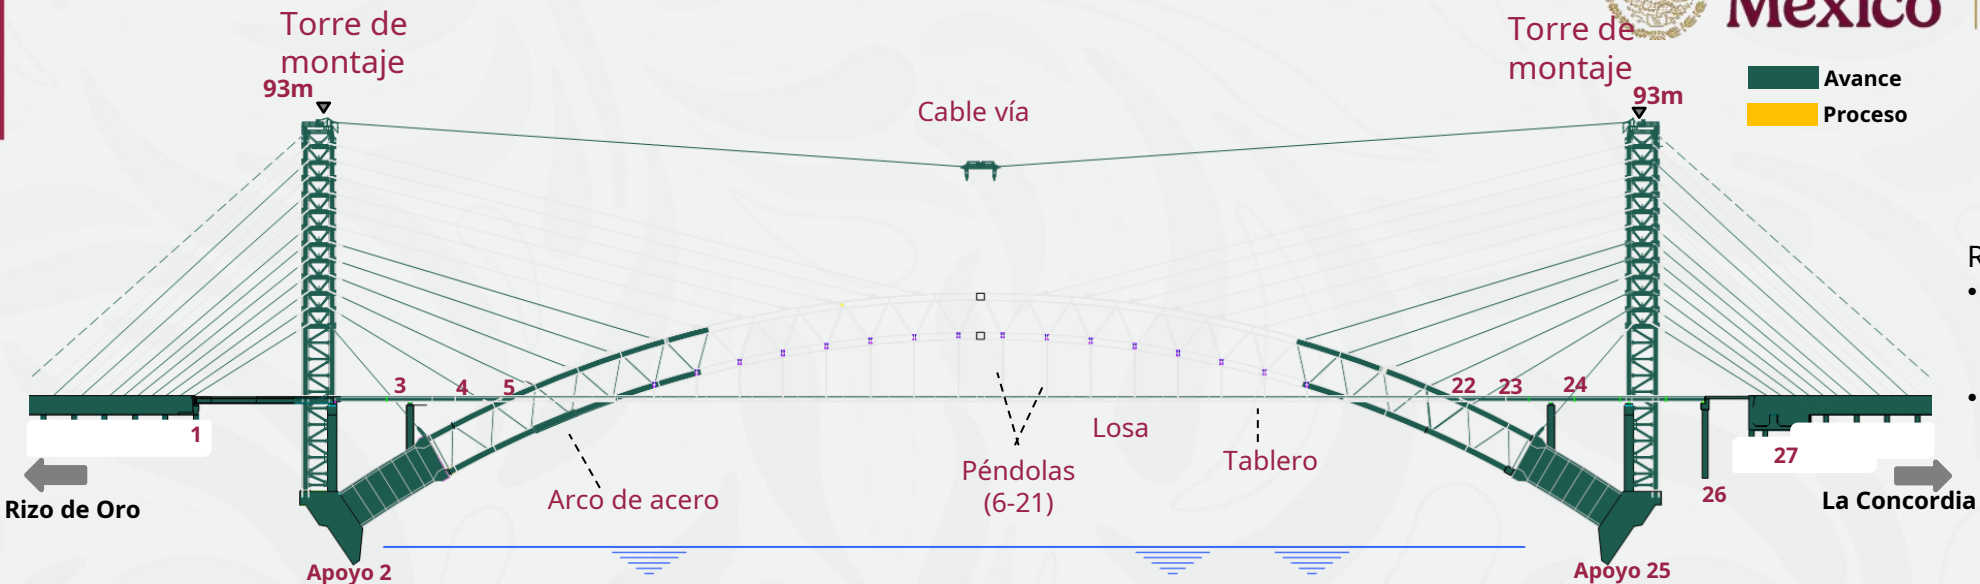

Avance físico

- Programado: 87.00%
- Real: 85.82%
- Incremento Semanal: 0.22%
- Financiero: 75.43%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	27/01/26 al 02/02/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,730.41	1,408	1,322.42	63.26	63.26
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	13.31	13.69	0.59	0.59
6-21	Péndolas	Pza.	16	0	16	Sin iniciar	
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	14	23	0	0
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74		
	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45		
	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfáltico)	m³	1,681	0	1,681	Sin iniciar	
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0



Inversión total: 1,381.8 mdp
2023-2025: 1,381.8 mdp
2026: 450 mdp (requerido)



Inicio: septiembre de 2023
Término: junio de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados




60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	27/01/26 al 02/02/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	1,408	1,322.42	63.26	63.26	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

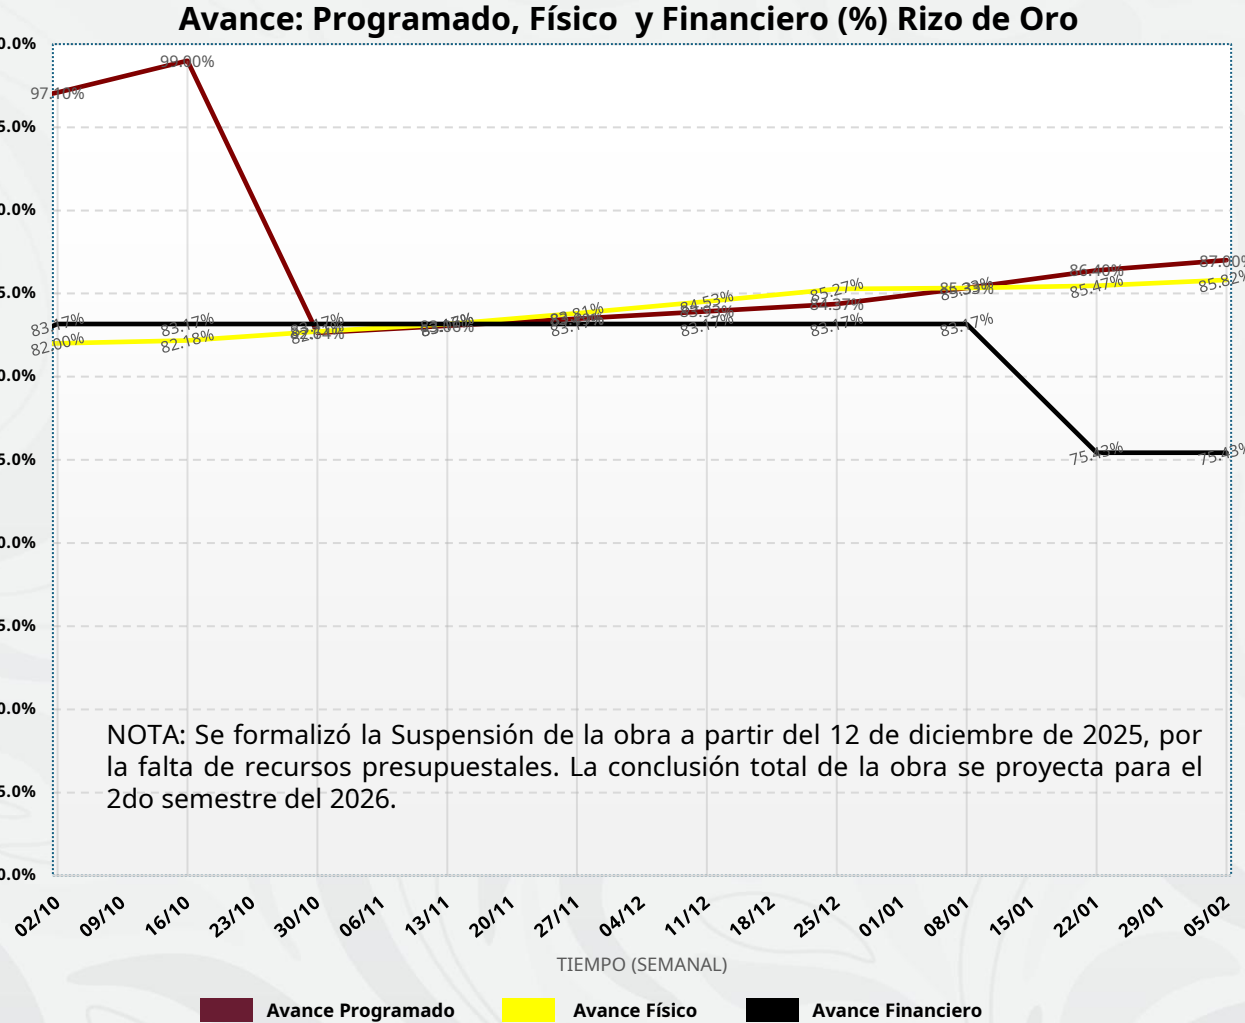

	19/01/26 al 26/01/26	27/01/26 al 02/02/26
Fuerza de Trabajo (personas)	220	210
Maquinaria	92	92
