


Chiapas

Puente Rizo de Oro



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

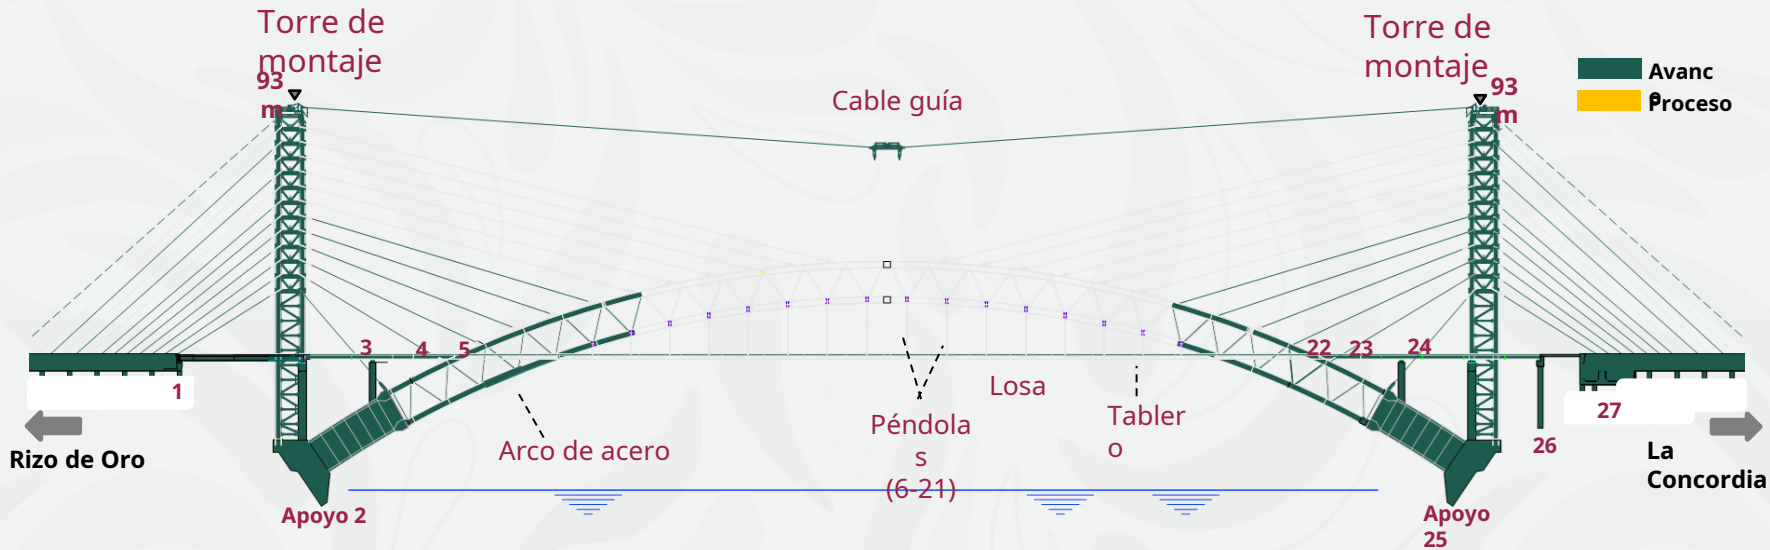

Avance físico

- Programado: 86.40%
- Real: 85.47%
- Incremento Semanal: 0.0%
- Financiero: 75.43%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	13/01/26 al 19/01/26	
					Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco (Ton)	2,730.41	1,306	1,424.41	38.75	0
3-24	Montaje de Dovela de arco (Pza)	27	12.36	14.64	0	0
6-21	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Ton)	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Pza)	37	14	23	0	0
1-27	Losa (m)	404	152.26	251.44		
	Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45		
	Parapeto (m)	982.96	0	1,008	Sin iniciar	0
1,2	Juntas de calzada (pza) tr-180	2	0	2	Sin iniciar	0
26	Juntas de calzada (pza) tr-380	1	0	1	Sin iniciar	0
27	Juntas de calzada (pza) tr-50	1	0	1	Sin iniciar	0



Inversión total: 1,381.8 mdp
2023-2025: 1,381.8 mdp
2026: 450 mdp (requerido)



Inicio: septiembre de 2023
Término: 31 de junio de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



4,145 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo

Chiapas


Puente Rizo de Oro

ACTUALIZADA



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	13/01/26 al 19/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	1,306	1,424.41	38.75	38.75	Montaje de las sección lateral DA-07
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44			
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45			
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m³)	1,518	0	1,518	--	--	Sin iniciar

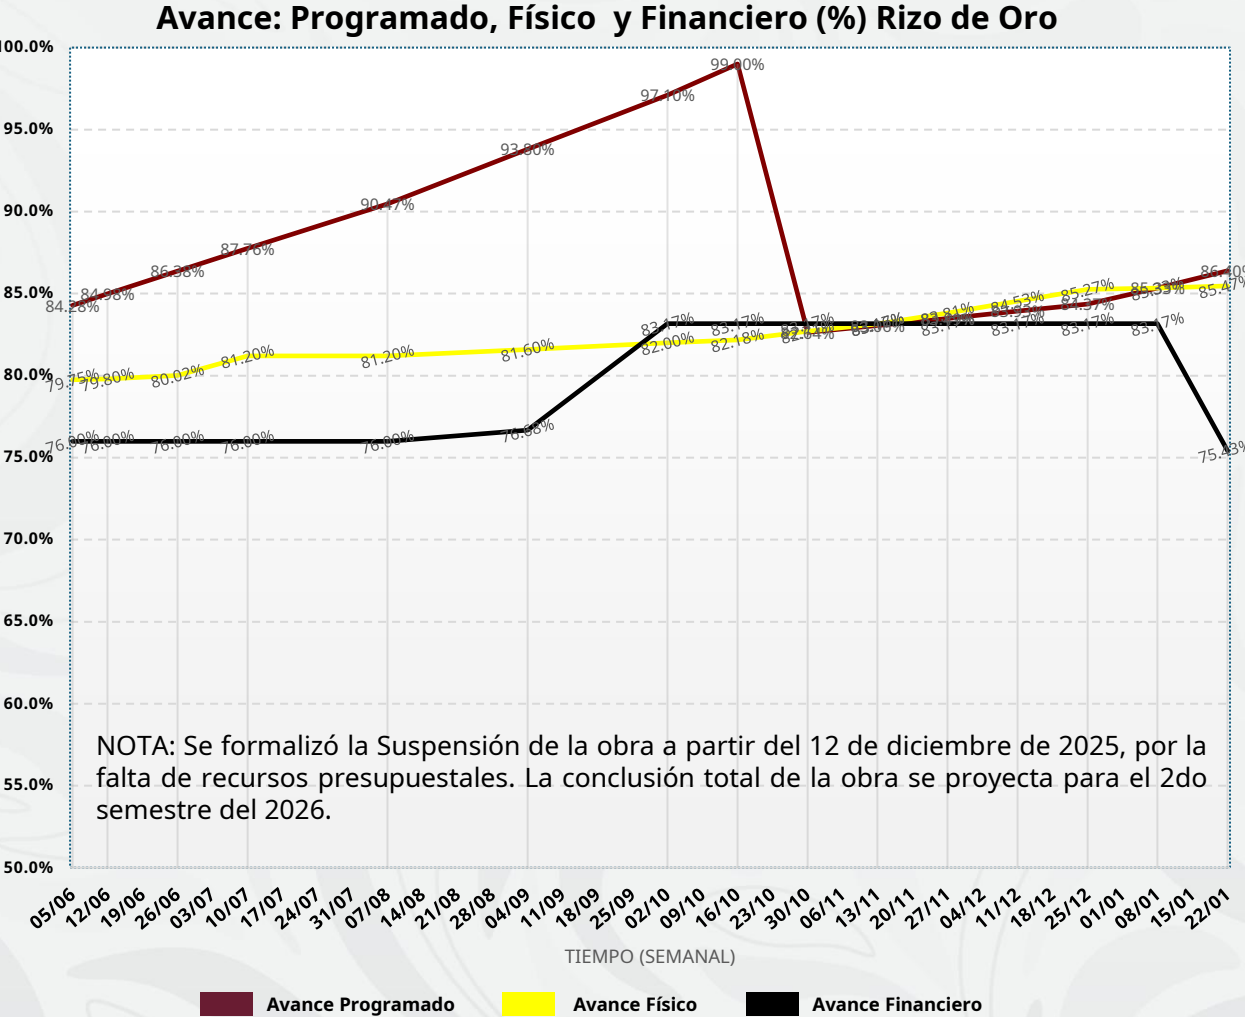

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

	06/01/26 al 12/01/26	13/01/26 al 19/01/26
Fuerza de Trabajo (personas)	176	218
Maquinaria	84	83
