


Chiapas

Puente Rizo de Oro

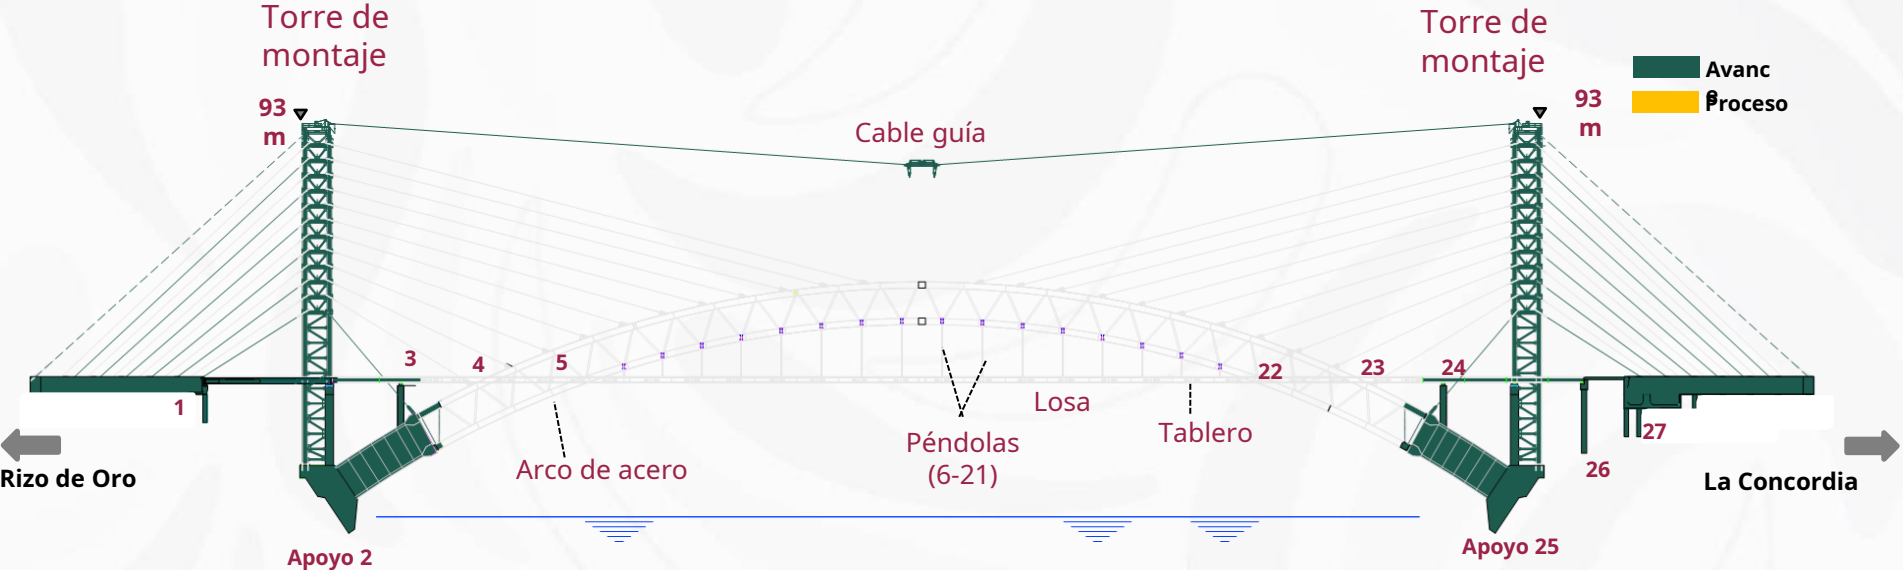

- Avance físico**
- Programado: 89.11%
 - Real: 81.20%
 - Incremento Semanal: 0.00%
 - Financiero: 76%

-  **Inversión total: 1,482.2 mdp**
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp
-  **Inicio:** septiembre de 2023
Término: 31 de octubre de 2025
-  **Meta:** 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso
-  **5,715** empleos generados
-  **300 mil** habitantes beneficiados
-  **60 min** de ahorro en tiempo


No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	18/07/25 al 24/07/2025	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	0	4	Sin iniciar	
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	Prueba de carga en vacío

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18/07/25 al 24/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 72%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	153	2,578	--	--	
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m³)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

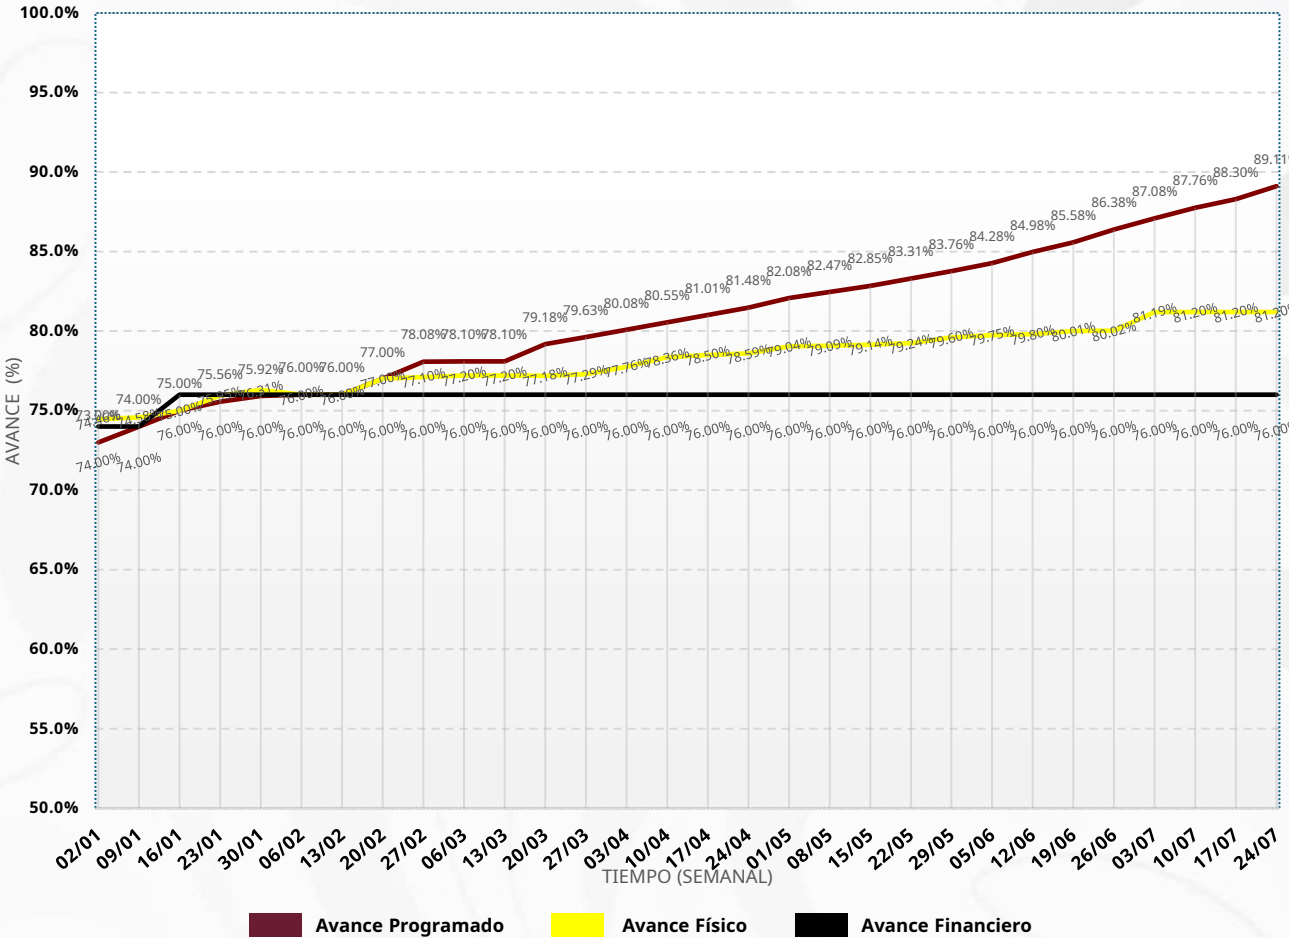

	11 de julio al 24 de julio	18 de julio al 24 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	225	225
Maquinaria	79	79
