

# Chiapas


## Puente Rizo de Oro



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

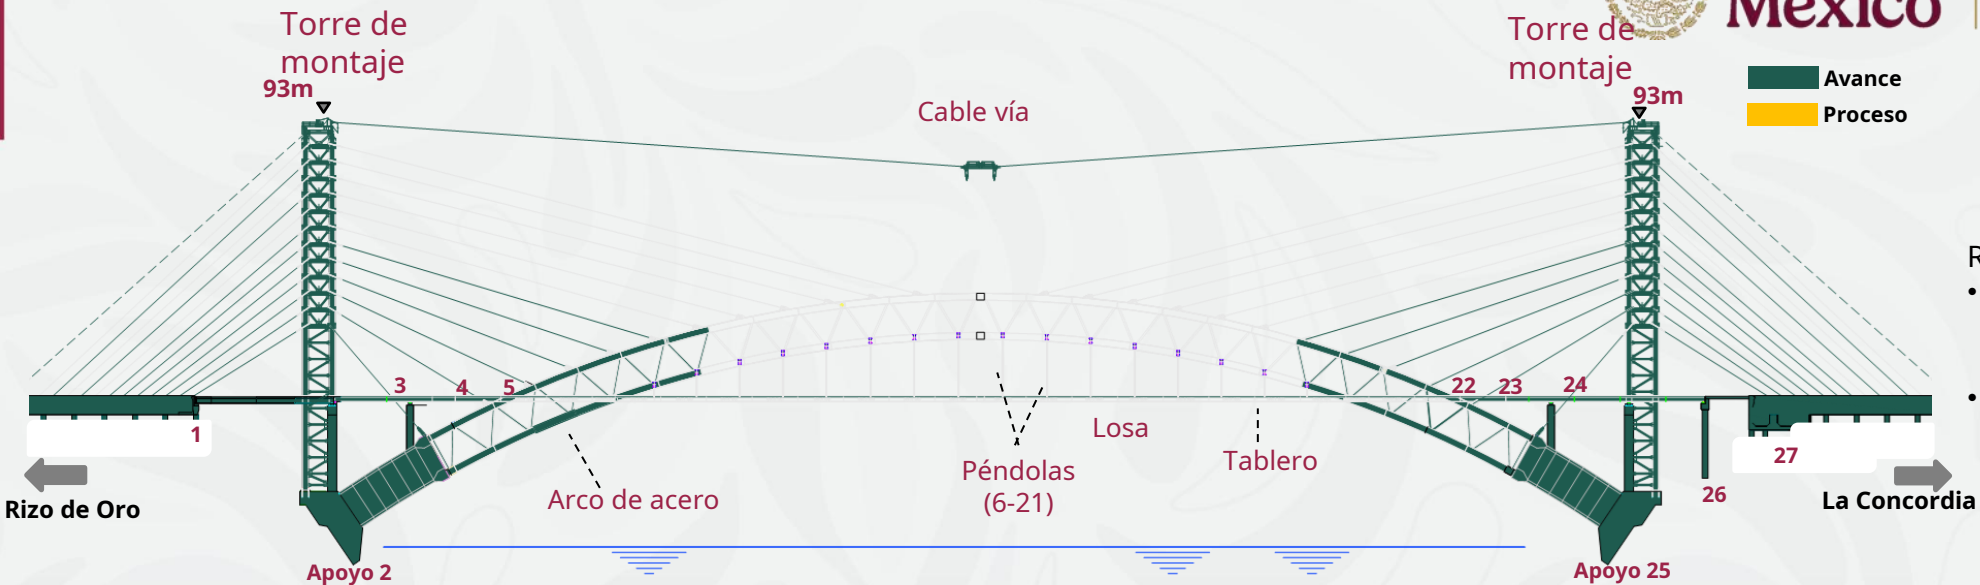

### Avance físico

- Programado: 86.70%
- Real: 85.60%
- Incremento Semanal: 0.13%
- Financiero: 75.43%

### RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	20/01/26 al 26/01/26	
					Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco (Ton)	2,730.41	1,345	1,386	38.75	38.75
3-24	Montaje de Dovela de arco (Pza)	27	12.72	14.28	0.36	0.36
6-21	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Ton)	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Pza)	37	14	23	0	0
1-27	Losa (m)	404	152.26	251.44		
	Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45		
	Parapeto (m)	982.96	0	1,008	Sin iniciar	0
1,2	Juntas de calzada (pza) tr-180	2	0	2	Sin iniciar	0
26	Juntas de calzada (pza) tr-380	1	0	1	Sin iniciar	0
27	Juntas de calzada (pza) tr-50	1	0	1	Sin iniciar	0



**Inversión total:** 1,381.8 mdp  
**2023-2025:** 1,381.8 mdp  
**2026:** 450 mdp (requerido)



**Inicio:** septiembre de 2023  
**Término:** 30 de octubre de 2026



**Meta:** 1 Puente (405 m)  
1.7 km camino de acceso



**5,715** empleos generados



**300 mil** habitantes beneficiados




**60 min** de ahorro en tiempo

# Chiapas

## Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/01/26 al 26/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	1,306	1,424.41	38.75	38.75	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44			
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45			
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,518	0	1,518	--	--	Sin iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

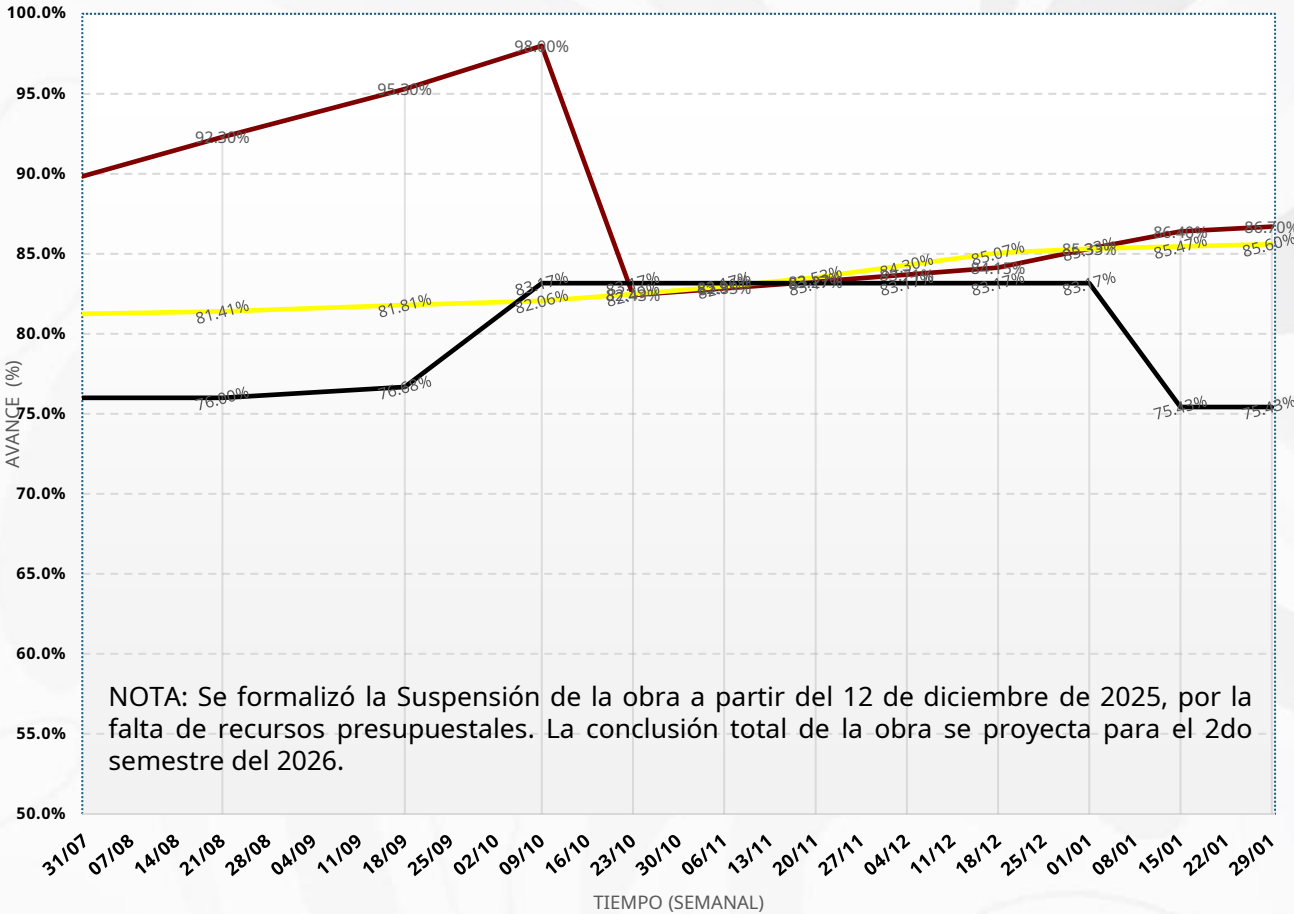

NOTA: Se formalizó la Suspensión de la obra a partir del 12 de diciembre de 2025, por la falta de recursos presupuestales. La conclusión total de la obra se proyecta para el 2do semestre del 2026.

Empresas	
• <b>Contratista:</b> COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• <b>Supervisión:</b> JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

	13/01/26 al 19/01/26	19/01/26 al 26/01/26
Fuerza de Trabajo (personas)	176	220
Maquinaria	84	92
