

Chiapas Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 86.00%
- Real: 85.47%
- Incremento Semanal: 0.14%
- Financiero: 75.43%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes



Inversión total: 1,831.8 mdp
2023-2025: 1,381.8 mdp
2026: 450 mdp (requerido)



Inicio: septiembre de 2023
Término: 31 de junio de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso




5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo

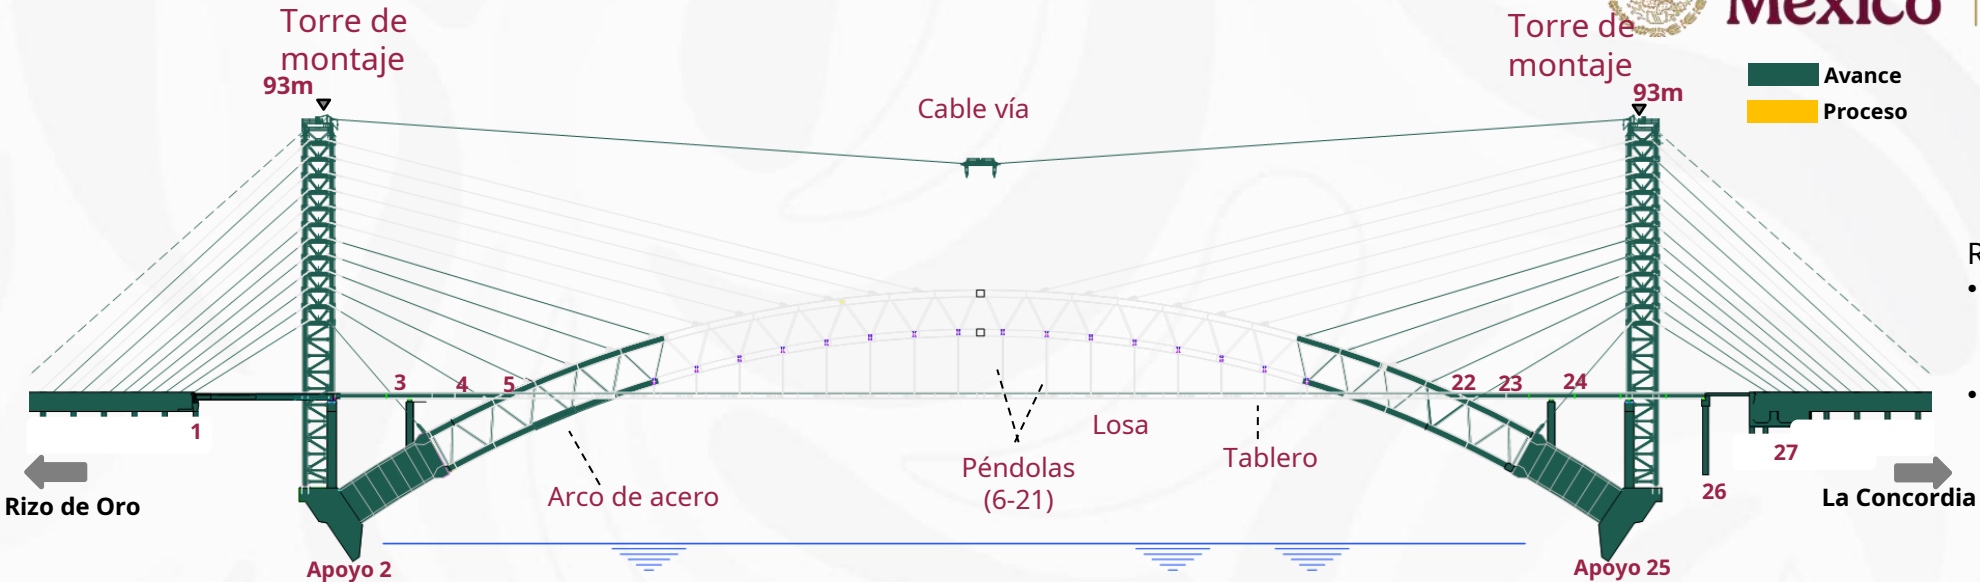


Eje	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	06/01/26 al 12/01/26	
					Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco (Ton)	2,730.41	1,306	1,424.41	38.75	38.75
3-24	Montaje de Dovela de arco (Pza)	27	12.36	14.64	0.36	0.36
6-21	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Ton)	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura (Pza)	37	14	23	0	0
1-27	Losa (m)	404	152.26	251.44	0	0
	Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0
	Parapeto (m)	982.96	0	1,008	Sin iniciar	0
1,2	Juntas de calzada (pza) tr-180	2	0	2	Sin iniciar	0
26	Juntas de calzada (pza) tr-380	1	0	1	Sin iniciar	0
27	Juntas de calzada (pza) tr-50	1	0	1	Sin iniciar	0

Chiapas
Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/01/26 al 12/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	1,306	1,424.41	38.75	38.75	Montaje de las sección lateral DA-07
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44			
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45			
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,518	0	1,518	--	--	Sin iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

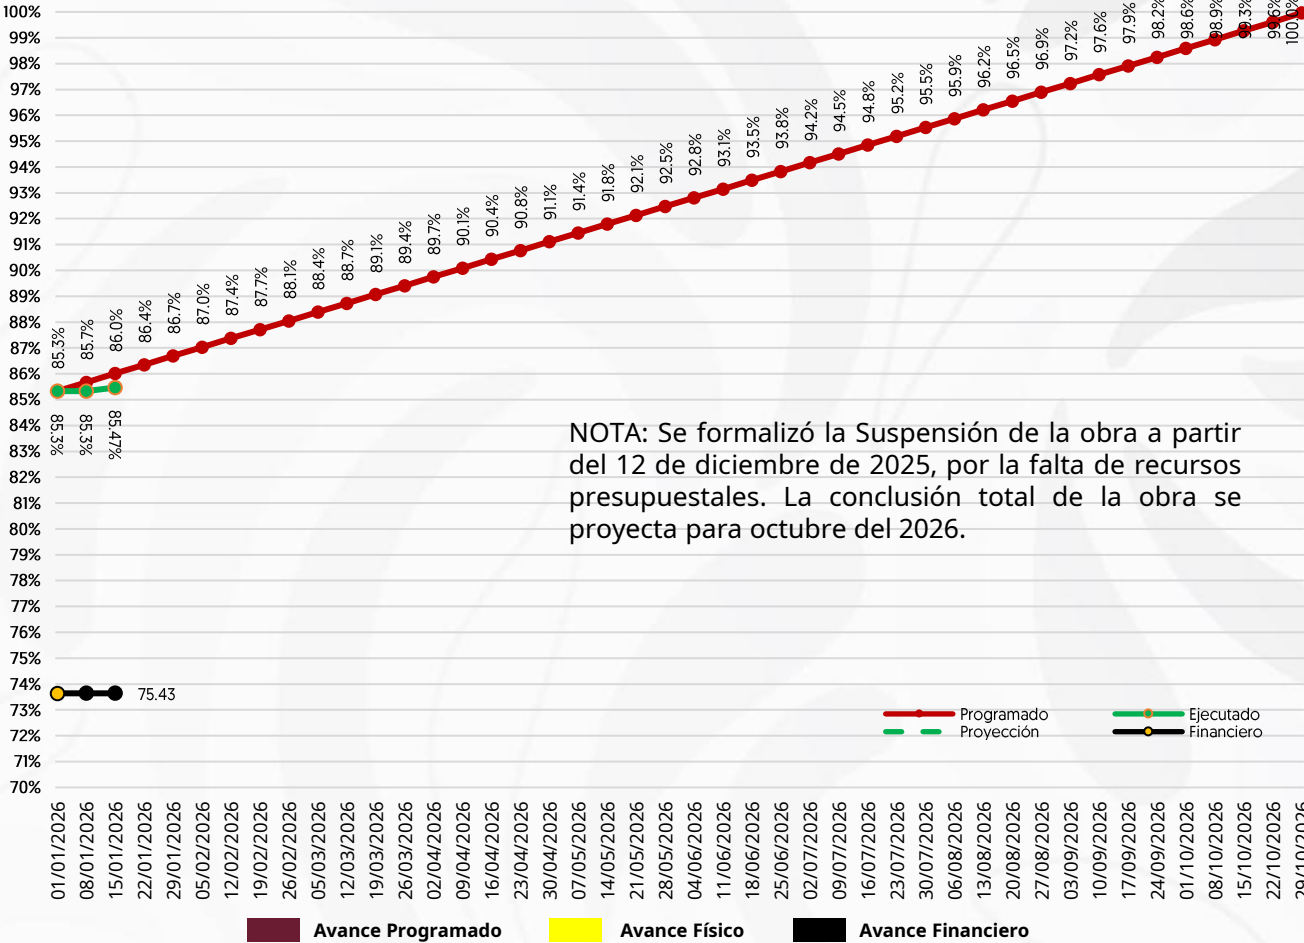

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

	02/01/26 al 05/01/26	06/01/26 al 12/01/26
Fuerza de Trabajo (personas)	73	176
Maquinaria	58	92
