


Chiapas

Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

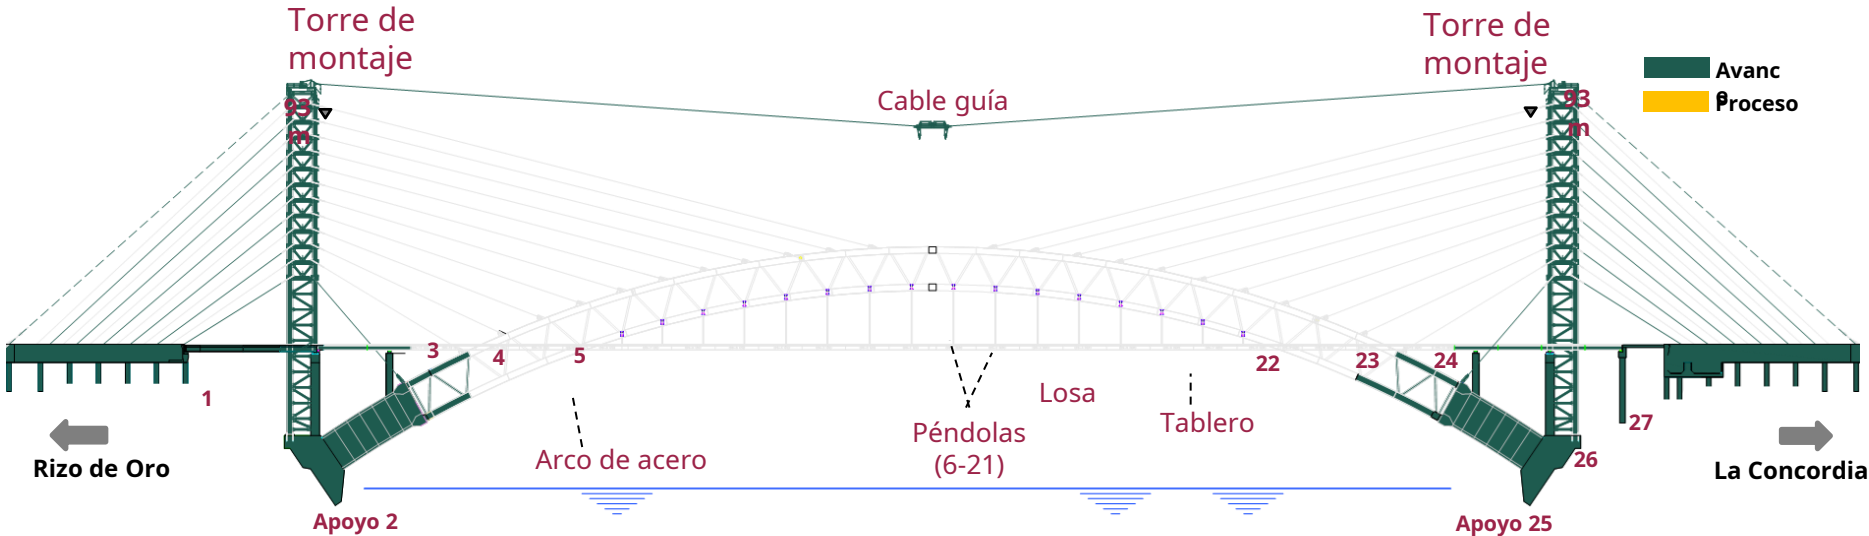

Avance físico

- Programado: 97.10%
- Real: 82.00%
- Incremento Semanal: 0.17%
- Financiero: 83.17%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- Condiciones climatológicas.
- Adecuación del carro de izaje: Esta tarea incluye el reforzamiento del sistema de tracción y la revisión de las tensiones de los cables longitudinales y transversales.
- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra

No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	1	3	0	Ejecutado el cabezal 23
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	reforzamiento del sistema de tracción
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t)	2,731	439.58	2,291	49.86	49.86



Inversión total: 1,482.2 mdp
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp



Inicio: septiembre de 2023
Término: 31 de octubre de 2025



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados




60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 72%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	439.58	2,291	49.86	49.86	Montaje con grúa sobre neumático
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m³)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

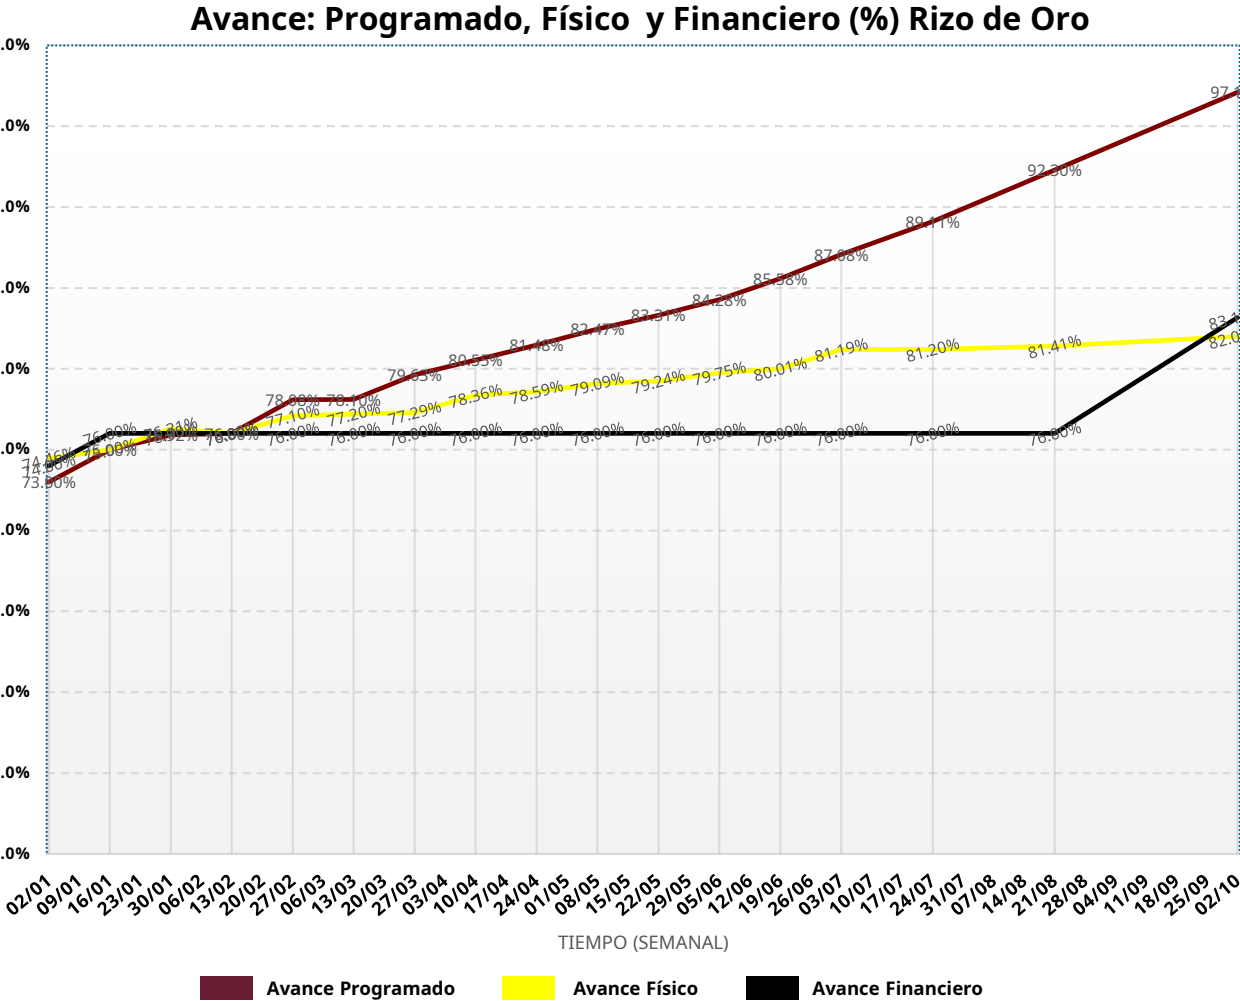

	19/09/25 al 25/09/25	26/09/25 al 02/10/25
Fuerza de Trabajo (personas)	187	187
Maquinaria	79	79
