

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico**

- Programado: 87.0%
- Real: 80.0%
- Semanal: 0.30%
- Financiero: 87.24%

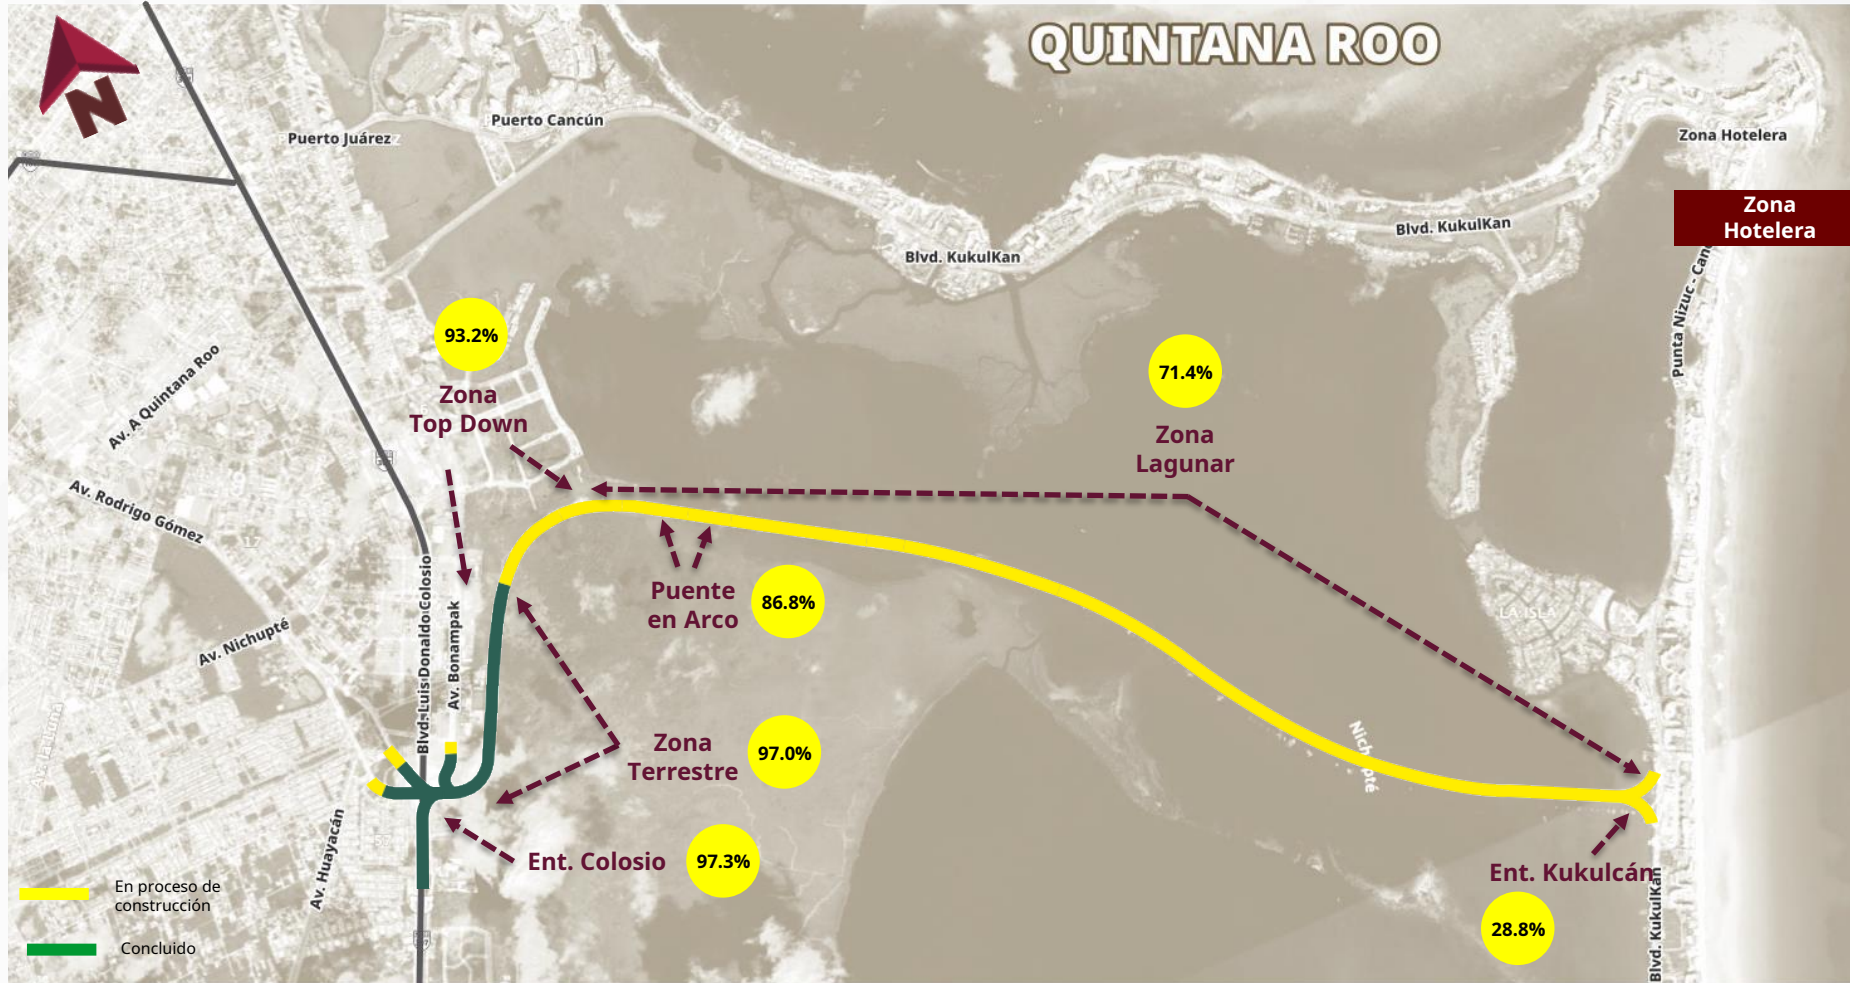

- 2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 20 de diciembre 2025
- Meta:** 11.2 km
  - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
  - 2.4 km entronques (2)
  - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos** generados  
**20 millones** de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 06 al 12 de junio 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,297	14	2	Junio 2025
Trabe de liga (pza)	53	44	9	2	Agosto 2025
Columnas (pza)	926	781	145	1	Octubre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	256	217	39	2	Junio 2025
Montaje de cabezal (pza)	256	184	72	2	Agosto 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,332	326	15	Julio 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	956	702	18	Septiembre 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	29	121	8	Julio 2025
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	11	139	0	Septiembre 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	30,558	14,251	0	Septiembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	20,505	24,304	200	Octubre 2025
Losa (claro)	281	145.85	135.15	2	Octubre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	6,563.1	14,206.4	64	Noviembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	3,910.4	16,859.1	70	Noviembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Noviembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Noviembre 2025
Alumbrados (km)	10.52	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.52	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

