


Chiapas

Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

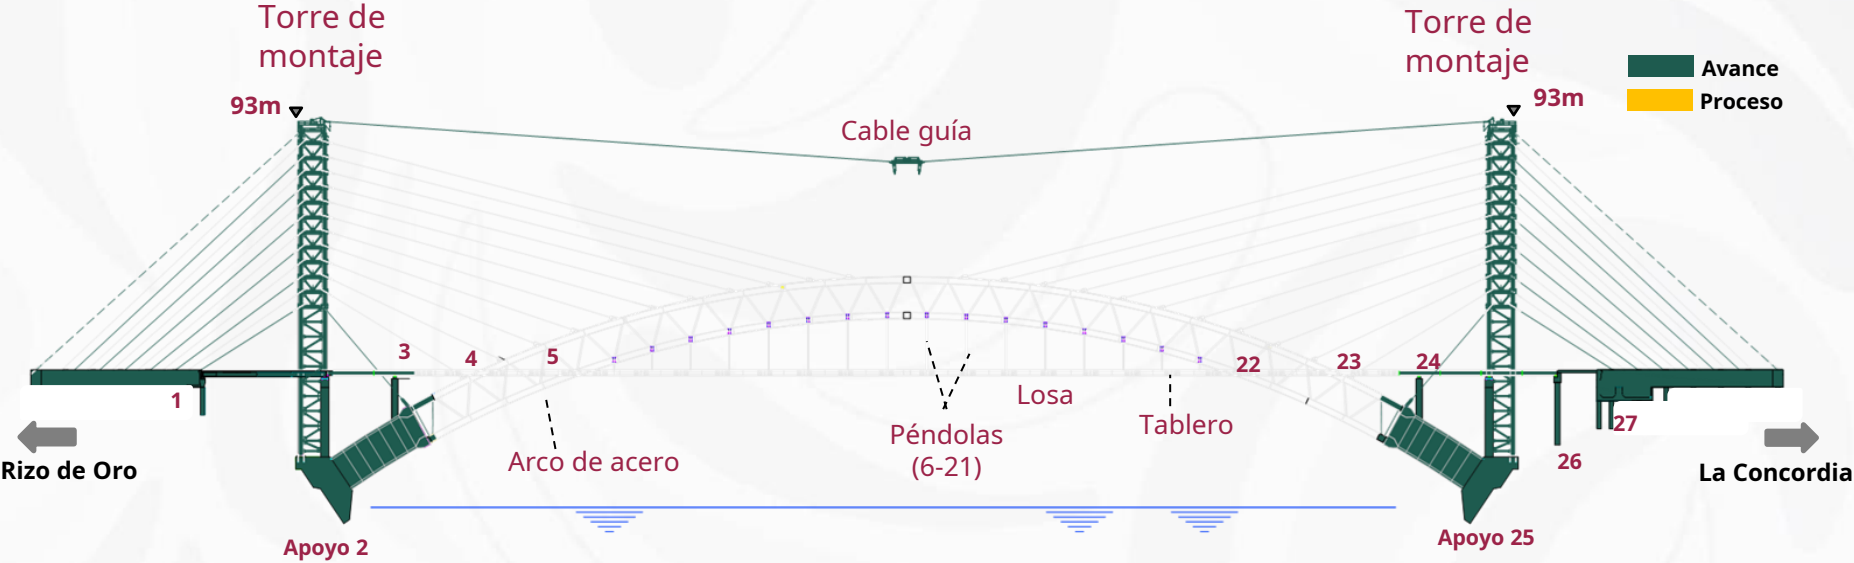

- Avance físico**
- Programado: 92.30%
 - Real: 81.41%
 - Incremento Semanal: 0.07%
 - Financiero: 76%
- Adecuación del carro de izaje: Esta tarea incluye el reforzamiento del sistema de tracción y la revisión de las tensiones de los cables longitudinales y transversales

No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/08/25 al 21/08/2025	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	0	4	Sin iniciar	
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	Prueba de carga en vacío
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t)	2,731	224	2,531	23.54	23.54

Inversión total: 1,482.2 mdp
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp

Inicio: septiembre de 2023
Término: 31 de octubre de 2025

Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso

5,715 empleos generados

300 mil habitantes beneficiados

60 min de ahorro en tiempo


Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	15/08/25 al 21/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 72%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	224	2,507	23.54	23.54	Montaje con grúa sobre neumatico
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m³)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

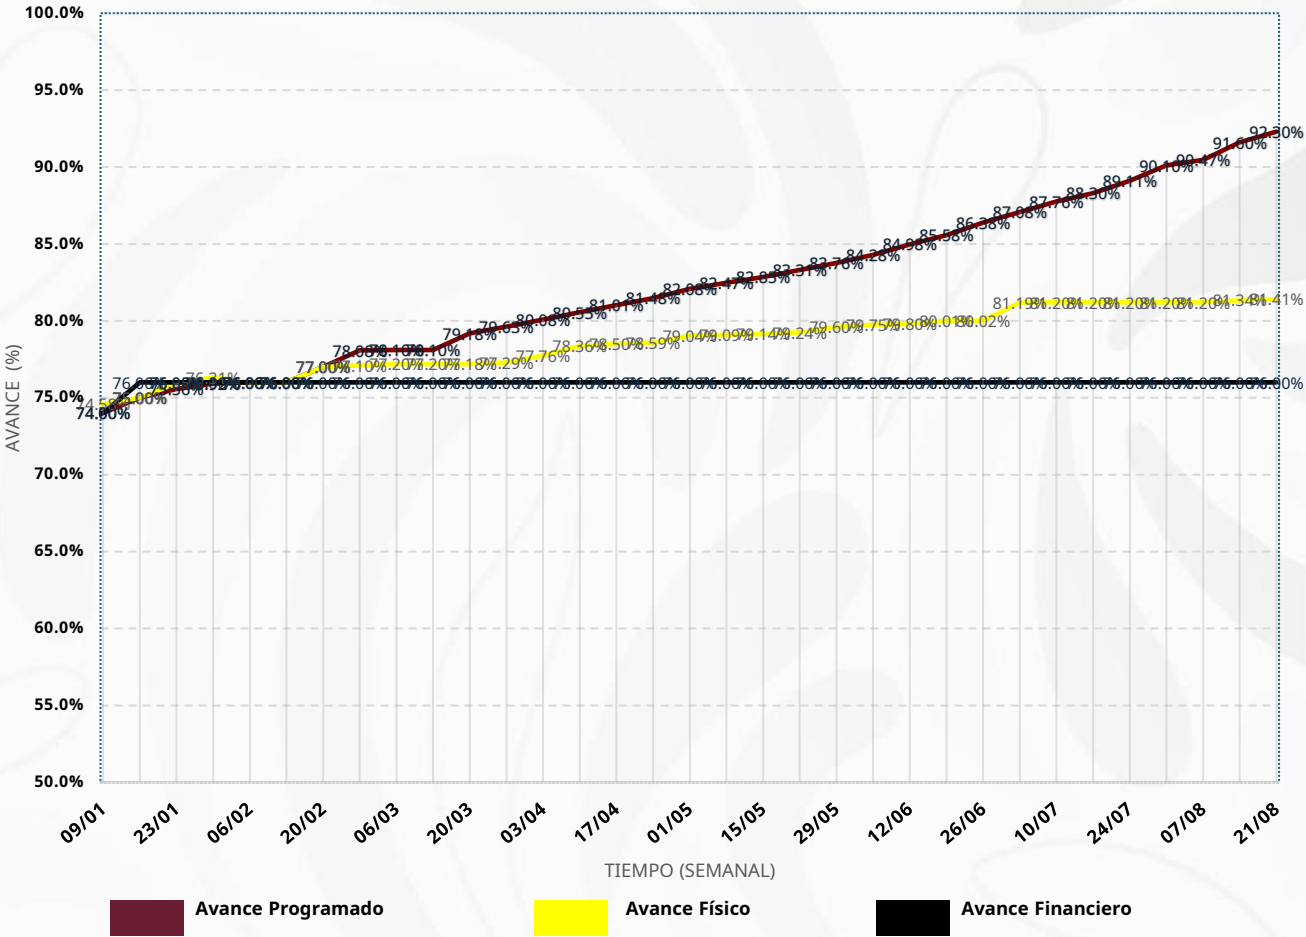

	08 al 14 de agostos de 2025	15 al 21 de agostos de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	232	232
Maquinaria	78	78
