

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance físico

- Programado: 84.8%
- Real: 79.2%
- Semanal: 0.10%
- Financiero: 87.24%

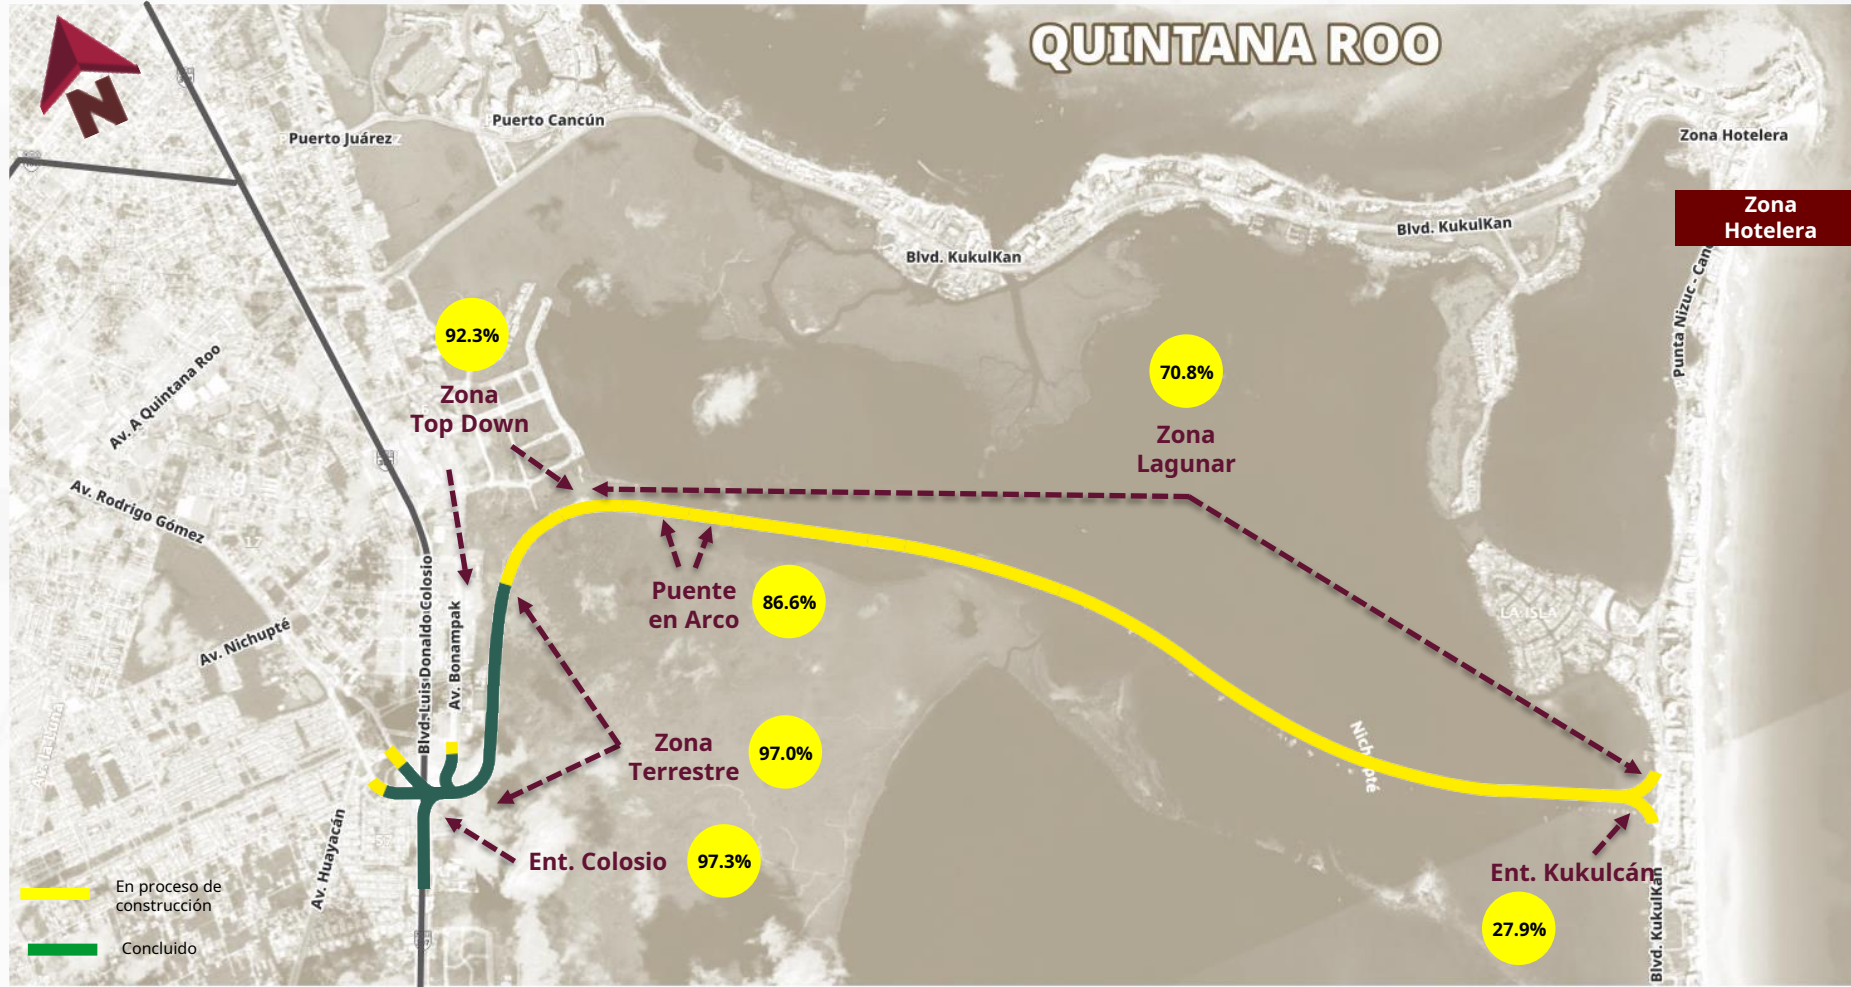

**2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 2,100 MDP



**Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 20 de diciembre 2025



**Meta:** 11.2 km  
• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)  
• 2.4 km entronques (2)  
• Puente en Arco Metálico (1) 103 m



**Más de 51 mil** empleos generados  
**20 millones** de turistas



**1.32 millones** de habitantes beneficiados




**45 minutos** de ahorro en tiempo

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 23 al 29 mayo 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,293	18	2	Junio 2025
Trabe de liga (pza)	53	40	13	1	Agosto 2025
Columnas (pza)	926	777	149	6	Octubre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	256	213	43	1	Junio 2025
Montaje de cabezal (pza)	256	185	71	1	Agosto 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,306	352	8	Julio 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	916	742	15	Septiembre 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	15	135	0	Julio 2025
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	11	139	0	Septiembre 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	30,558	14,251	0	Septiembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	20,303	24,506	0	Octubre 2025
Losa (claro)	281	143	138	0	Octubre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	6,227.2	14,542.3	85	Noviembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	3,840.4	16,929.1	120	Noviembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Noviembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Noviembre 2025
Alumbrados (km)	10.52	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.52	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

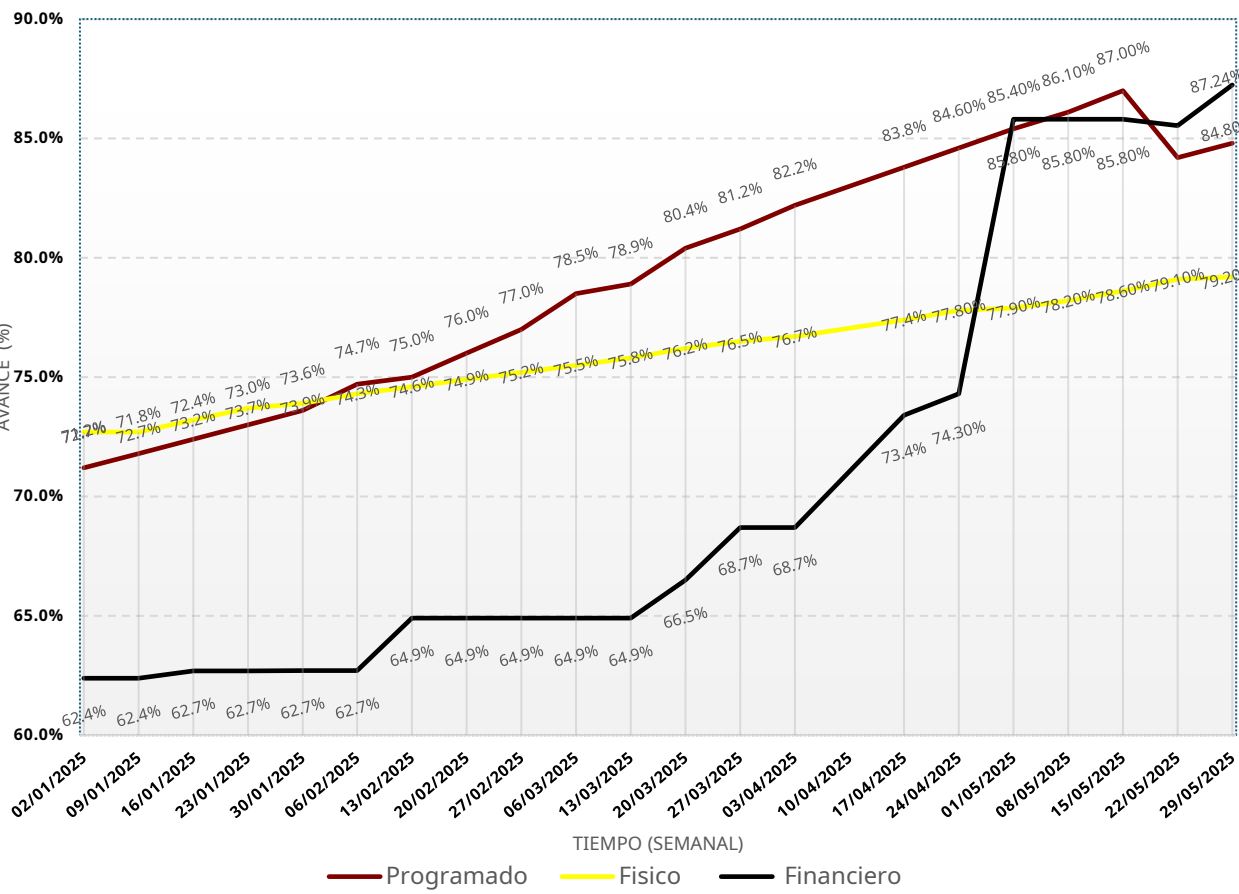

	16 al 22 de mayo	23 al 29 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	773	790
Maquinaria	105	104
