


# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

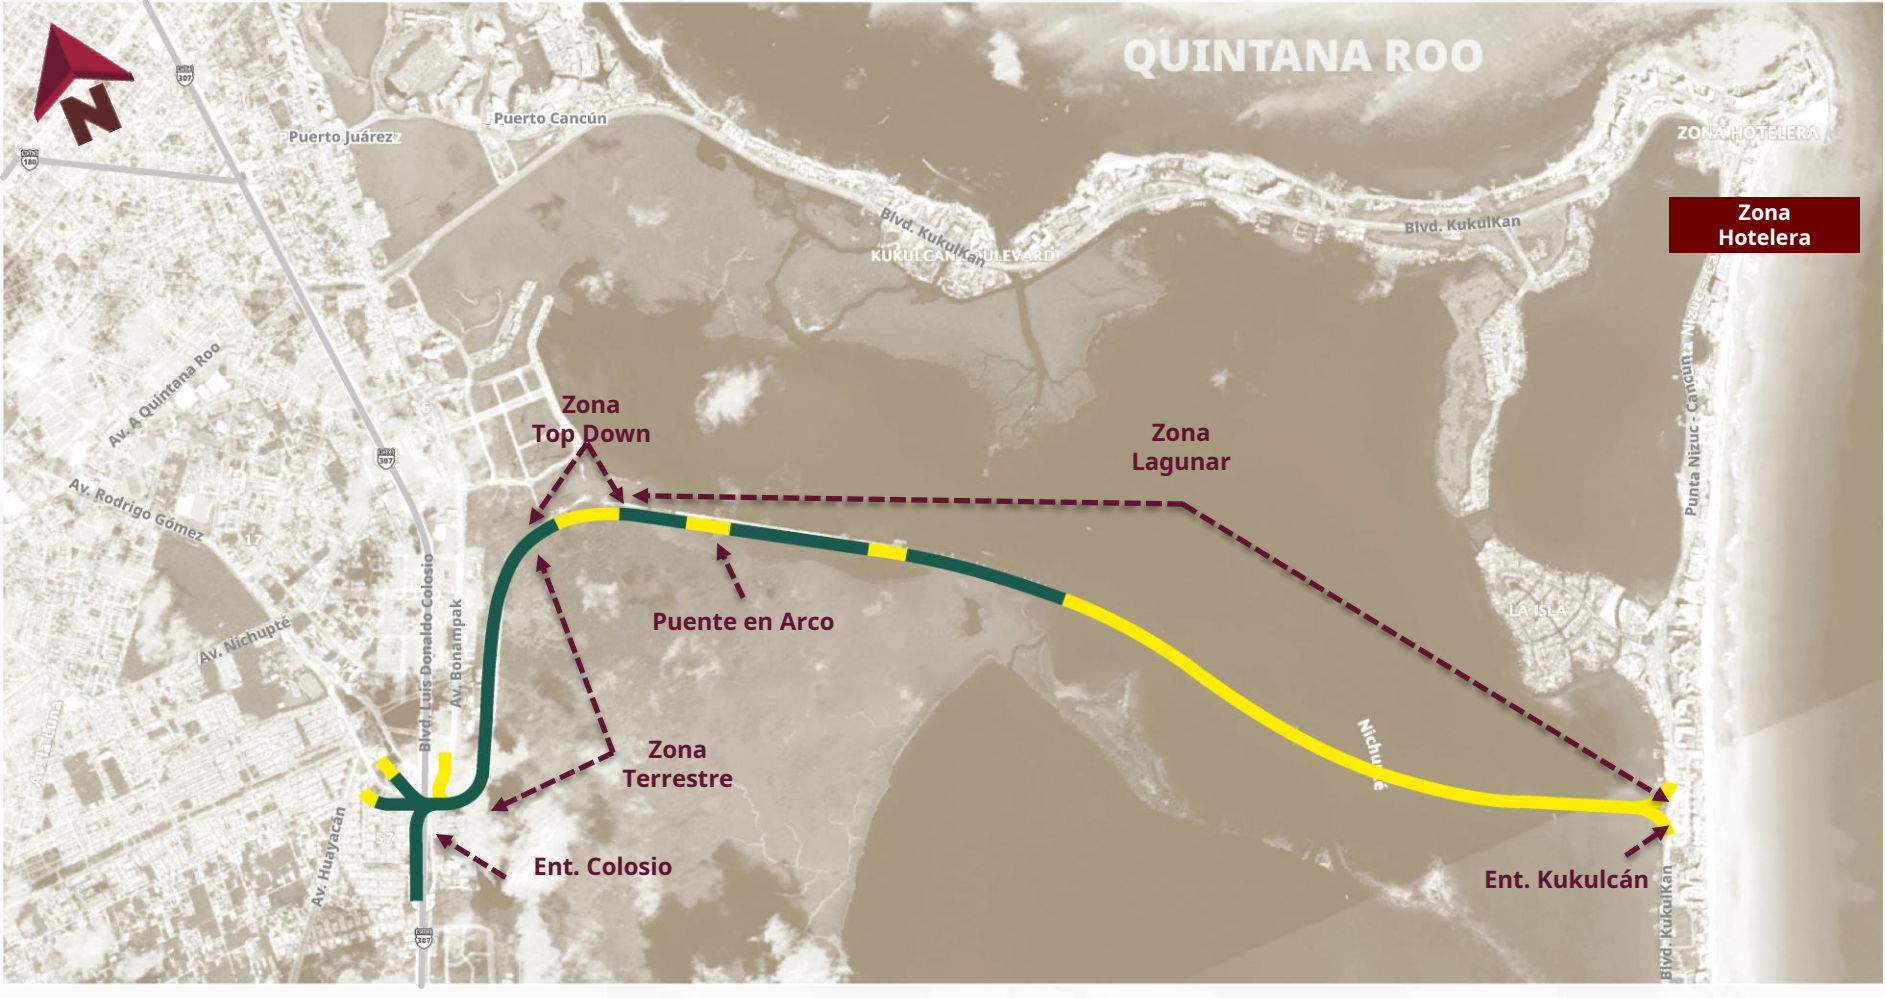

Simbología	
	En proceso de construcción
	Concluido

# Quintana Roo

## Puente Vehicular

### Nichupté



**Inversión total:** 9,986.4  
**2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 3,500 MDP



**Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 31 de agosto de 2025



**Meta:** 11.2 km  
• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)  
• 2.4 km entronques (2)  
• Puente en Arco Metálico (1) 103 m



**Avance físico:**  
• Programado: 82.9%  
• Real: 77%  
• Financiero: 73.4%



**Más de 51 mil** empleos generados  
**20 millones** de turistas



**1.32 millones** de habitantes  
beneficiados



**45 minutos** de ahorro en tiempo

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	04/04/25 al 09/04/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Pilas de cimentación (pza)	1,300	1,276	24	24	5	
Columnas (pza)	934	699	235	58.5	4	Se cuenta con 2 frentes en cimentación, 3 en subestructura y 3 en superestructura.
Fabricación de cabezal (pza)	252	194	58	7	2	
Montaje de cabezal (pza)	252	150	102	11	0	
Fabricación de trabes (pza)	1,807	1,260	547	32	9	Se le solicitó a la constructora aumentar sus rendimientos para perforación y colado de pilas, colado de columnas, fabricación y montaje de trabes.
Montaje de trabes (pza)	1,807	880	927	56	5	Programa correspondiente a la semana del 04 al 09 de abril 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	19,330	25,479	1,554	0	
Losa (claro)	280	138	142	5	2	
Guarnición (m)	20,735.93	5,501.90	15,234.03	121	38.6	
Parapeto (m)	20,735.90	3,920.50	16,815.40	525	0	
Pavimento (m3)	6,556.90	0.00	6,556.90	540	0	

	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	207	829
Maquinaria	81	124

# Quintana Roo: Puente Vehicular Nichupté

