

Quintana Roo


Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance físico**
- Programado: 95.8%
 - Real: 84.1%
 - Semanal: 0.50%
 - Financiero: 92.9%

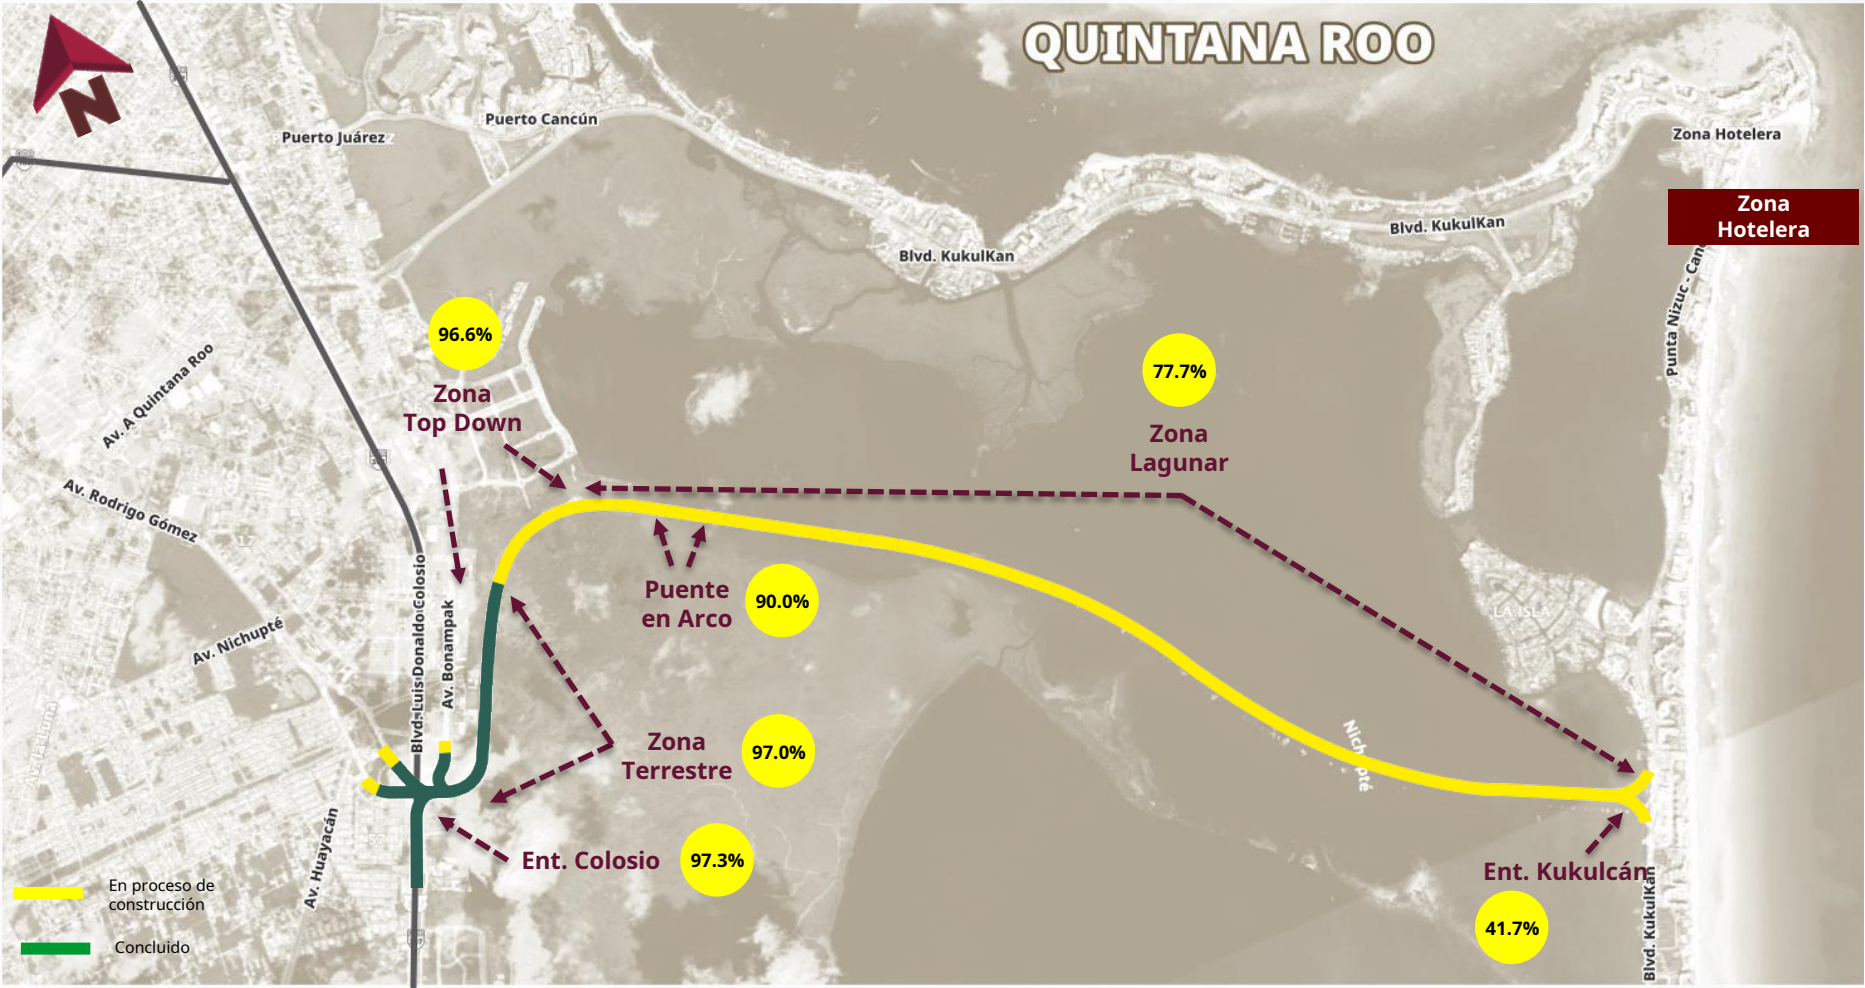

- 2022-2024:** 6,486.4 MDP
2025: 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022
Término: 20 de diciembre 2025
- Meta:** 11.2 km
 - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
 - 2.4 km entronques (2)
 - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos** generados
20 millones de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 01 al 07 de agosto 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,307	4	2	Agosto 2025
Pilas apoyo 177	10	6	4	1	Agosto 2025
Trabe de liga (pza)	53	47	6	0	Octubre 2025
Columnas (pza)	926	840	81	2	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	222	18	1	Agosto 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	200	40	2	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulkán)	16	11	5	1	Agosto 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,452	206	16	Octubre 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	1,151	507	31	Noviembre 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	107	43	10	Agosto 2025
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	66	84	0	Septiembre 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	31,882	12,927	105	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	23,510	21,299	400	Noviembre 2025
Losa (claro)	281	166.2	115	2.7	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	7,474.5	13,295	97	Noviembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	4,705	16,064.7	85	Noviembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

