

# San Ignacio-Tayoltita

## Tramo Sinaloa-Durango




**Gobierno de  
México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: 100 % • Financiero: 98.6 %  
• Real: 100 %

# CONCLUIDA

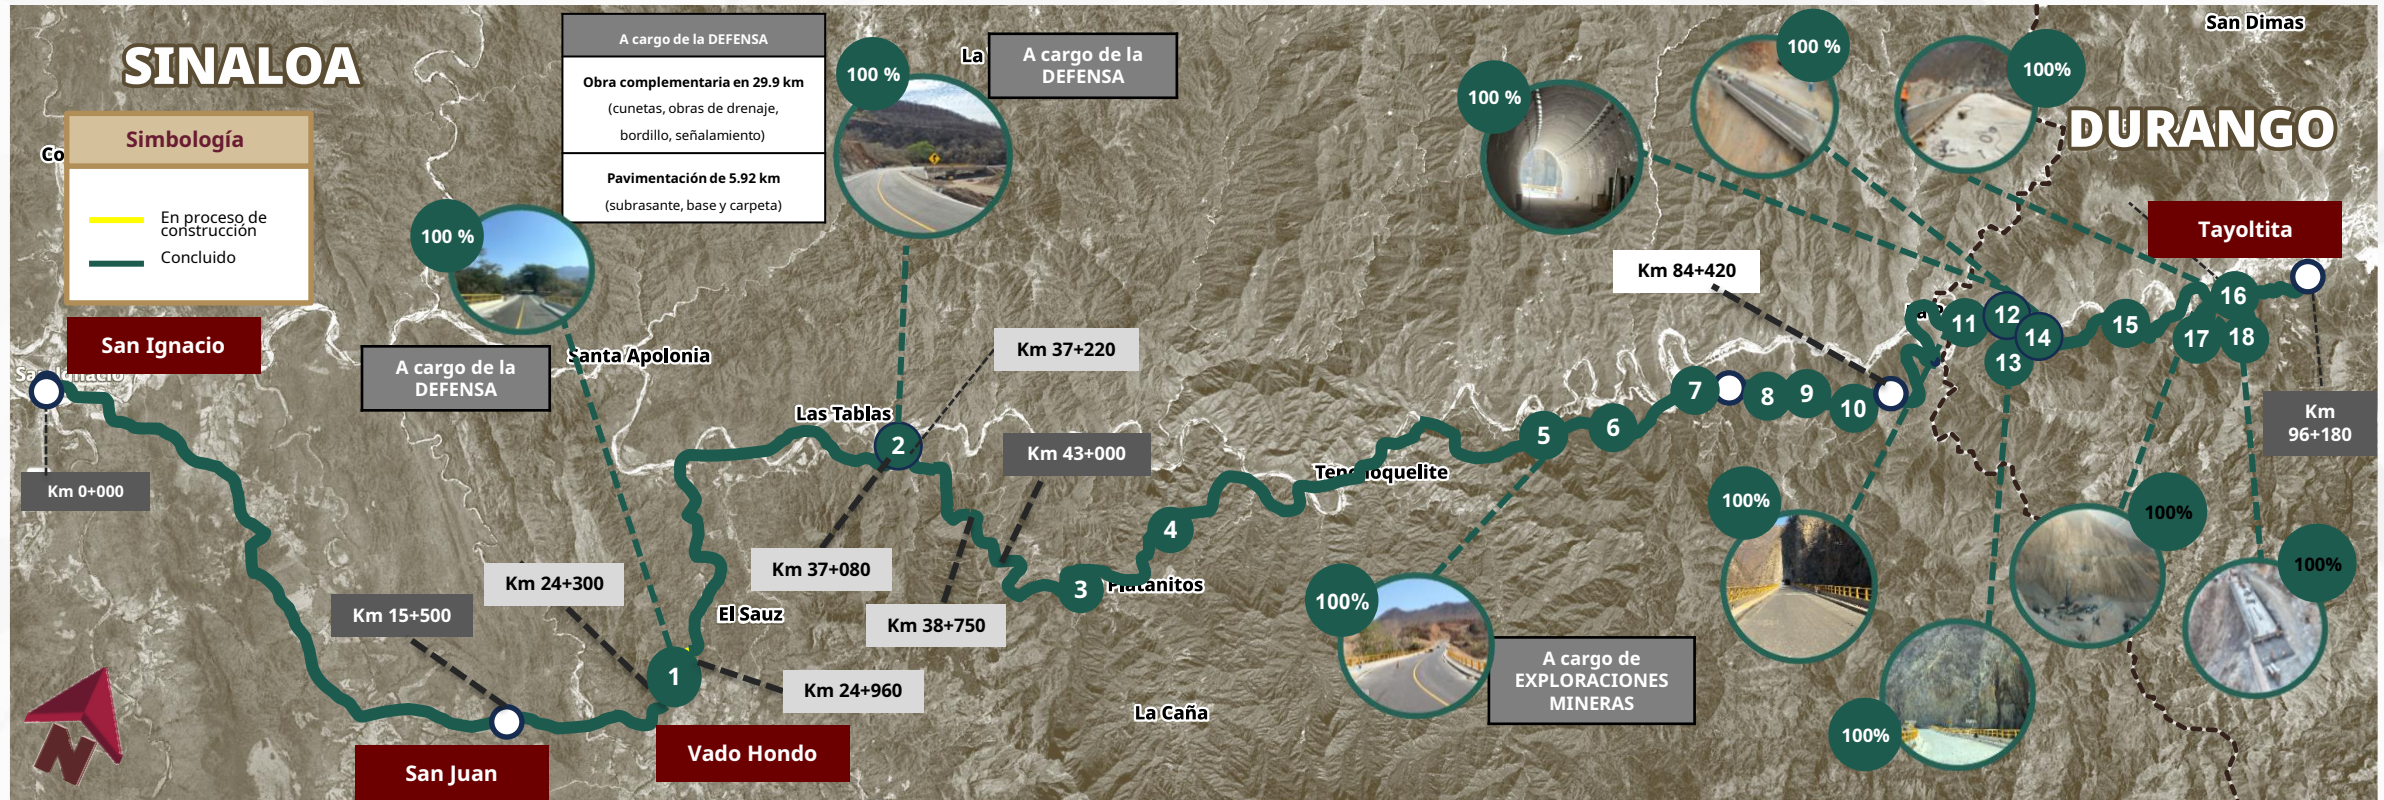




Descripción		Empresas
16	<b>Puente Auxiliar I km 93+240</b> L=240 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>COCONAL S.A.P.I. de C.V.</li> </ul>
17	<b>Viaducto El Sauz km MDP 93+420</b> L= 171 m	
18	<b>Puente Auxiliar II km 93+700</b> L= 30 m	

**Inversión:** 3,170.5 mdp  
**2019-2024:** 3,058.5 mdp  
**2025:** 112.0 mdp

**Inicio:** abril de 2019  
**Término:** 25 de agosto de 2025


- **Meta:** 96.2 km
- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 515 m Túnel “Duranguense”
- 509 m, viaductos (3)
- 880 m, puentes

-  **9,511** empleos generados
-  **11,131** habitantes beneficiados
-  **10 horas** /ahorro en tiempo

# Sinaloa/Durango

## San Ignacio-Tayoltita

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	22 de agosto al 28 de agosto		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Modernización (km)	96.2	96.2	-	-	-	
14 puentes	14	12	2 puentes	100 %	100%	
3 viaductos	3	2 viaductos 1 viaducto (100%)	1 viaducto	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zona de transición Auxiliar I - El Sauz: Trabajos complementarios en cunetas y barrera metálica.</li><li>• Viaducto El Sauz: Pintura en parapetos</li><li>• Zona de transición Auxiliar II - El Sauz: Trabajos complementarios en cunetas y barrera metálica.</li></ul>
Ampliación de un túnel	1	100 %	0 %	0%	0%	

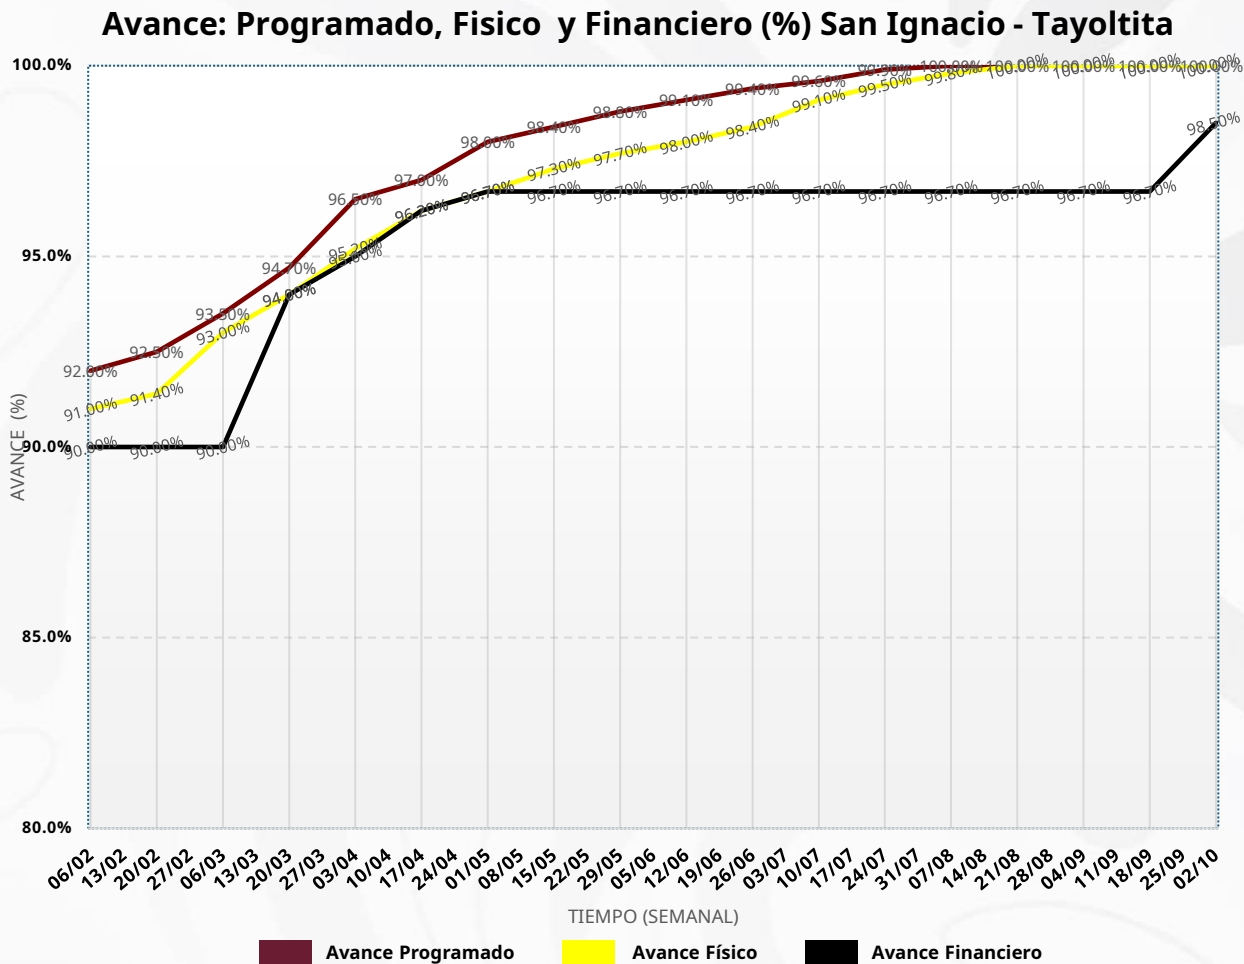

	15 de agosto al 21 de agosto	22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	262	262
Maquinaria	51	51
