

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 87.0%
- Real: 78.6%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 85.8%

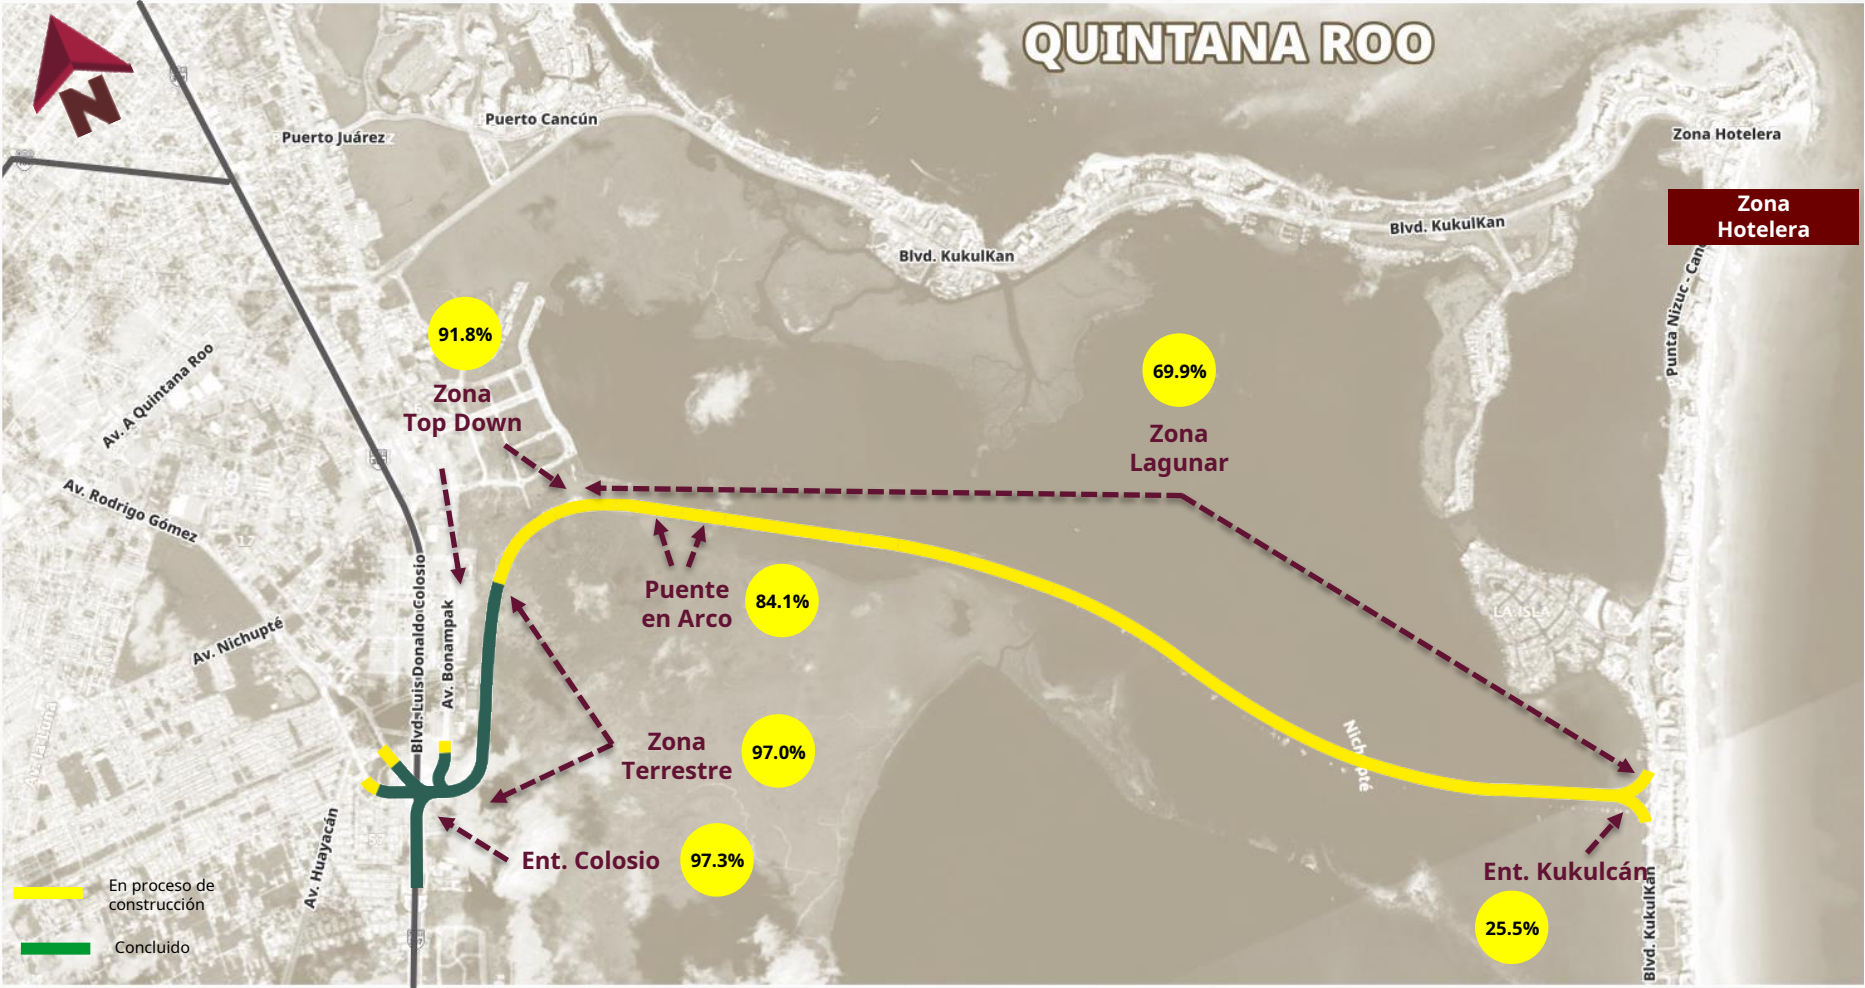


- 2022-2024:** 6,486.4 MDP
2025: 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022
Término: 20 de diciembre 2025
- Meta:** 11.2 km
 - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
 - 2.4 km entronques (2)
 - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos generados**
20 millones de turistas
- 1.32 millones de habitantes beneficiados**
- 45 minutos de ahorro en tiempo**

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado 09 al 15 may 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,287	24	4	Diciembre 2024
Trabe de liga (pza)	53	38	15	0	Agosto 2025
Columnas (pza)	926	763	163	9	Junio 2025
Fabricación de cabezal (pza)	252	206	46	2	Junio 2025
Montaje de cabezal (pza)	252	171	81	4	Junio 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,291	367	11	Junio 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	894	764	0	Julio 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	11	139	0	Julio 2025
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	0	150	0	Julio 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	30,558	14,251	0	Agosto 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	20,305	24,504	0	Agosto 2025
Losa (claro)	281	143	138	1	Agosto 2025
Guarnición (m)	20,769.5	5,947.2	14,822.3	68	Agosto 2025
Parapeto (m)	20,769.5	3,720.5	17,049	0	Agosto 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0.0	6,557	0	Agosto 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0.0	82.0	0	Agosto 2025
Alumbrados (km)	10.52	0.0	10.52	0	Agosto 2025
ITS (km)	10.52	0.0	10.52	0	Agosto 2025
Drenaje (pza)	117	0.0	117	0	Agosto 2025

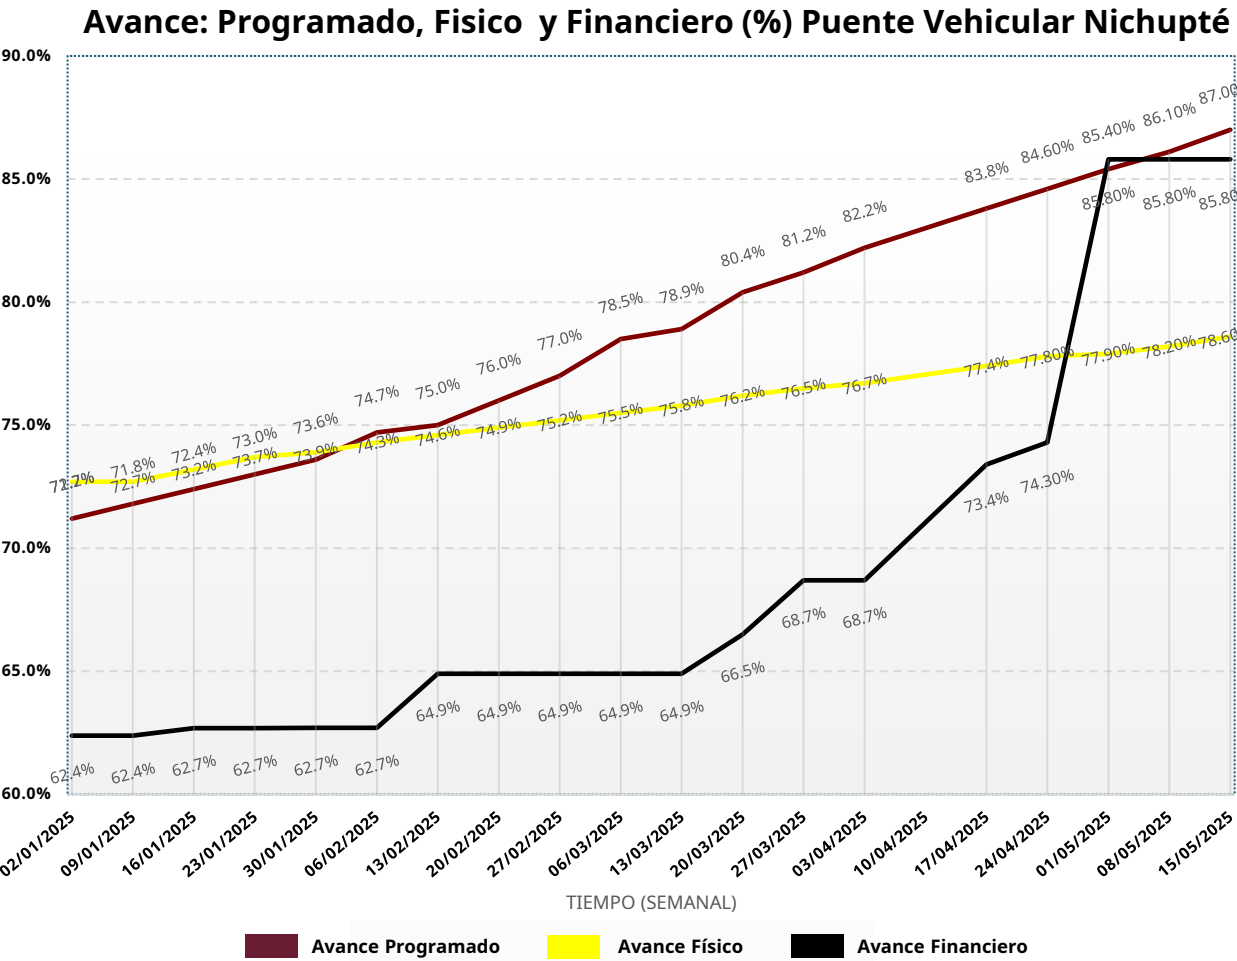

	02 al 08 de mayo	09 al 15 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	743	750
Maquinaria	123	123
