


# Puente Vehicular Nichupté



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


- Programado: 97.7%
- Real: 85.3%
- Semanal: 0.60%
- Financiero: 92.9%

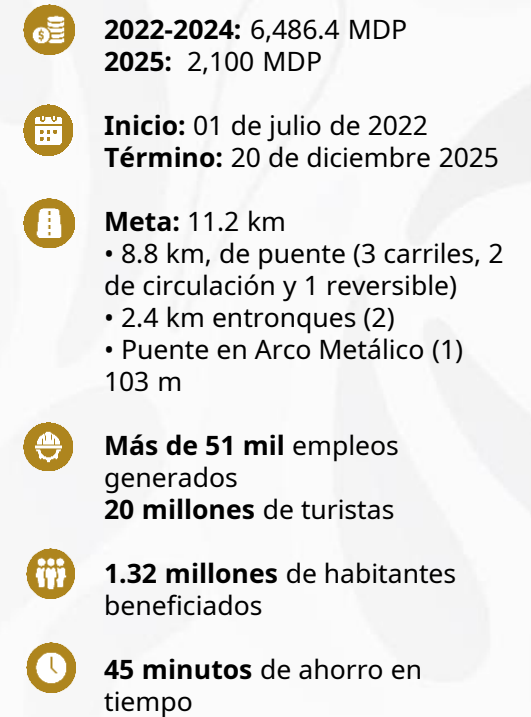

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 15 al 21 de agosto 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	0	Concluido
Pilas apoyo 177	10	8	2	1	Agosto 2025
Trabe de liga (pza)	53	50	3	1	Octubre 2025
Columnas (pza)	926	852	69	4	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	225	15	1	Agosto 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	204	36	1	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	11	5	0	Agosto 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,478	180	11	Octubre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,202	456	28	Noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	119	31	6	Agosto 2025
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	93	57	19	Agosto 2025
Colado de prelosas (pza)	44,809	32,361	12,448	205	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	23,710	21,099	200	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	173	108	5	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	7,826	12,944	252	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	4,705	16,064.5	0	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

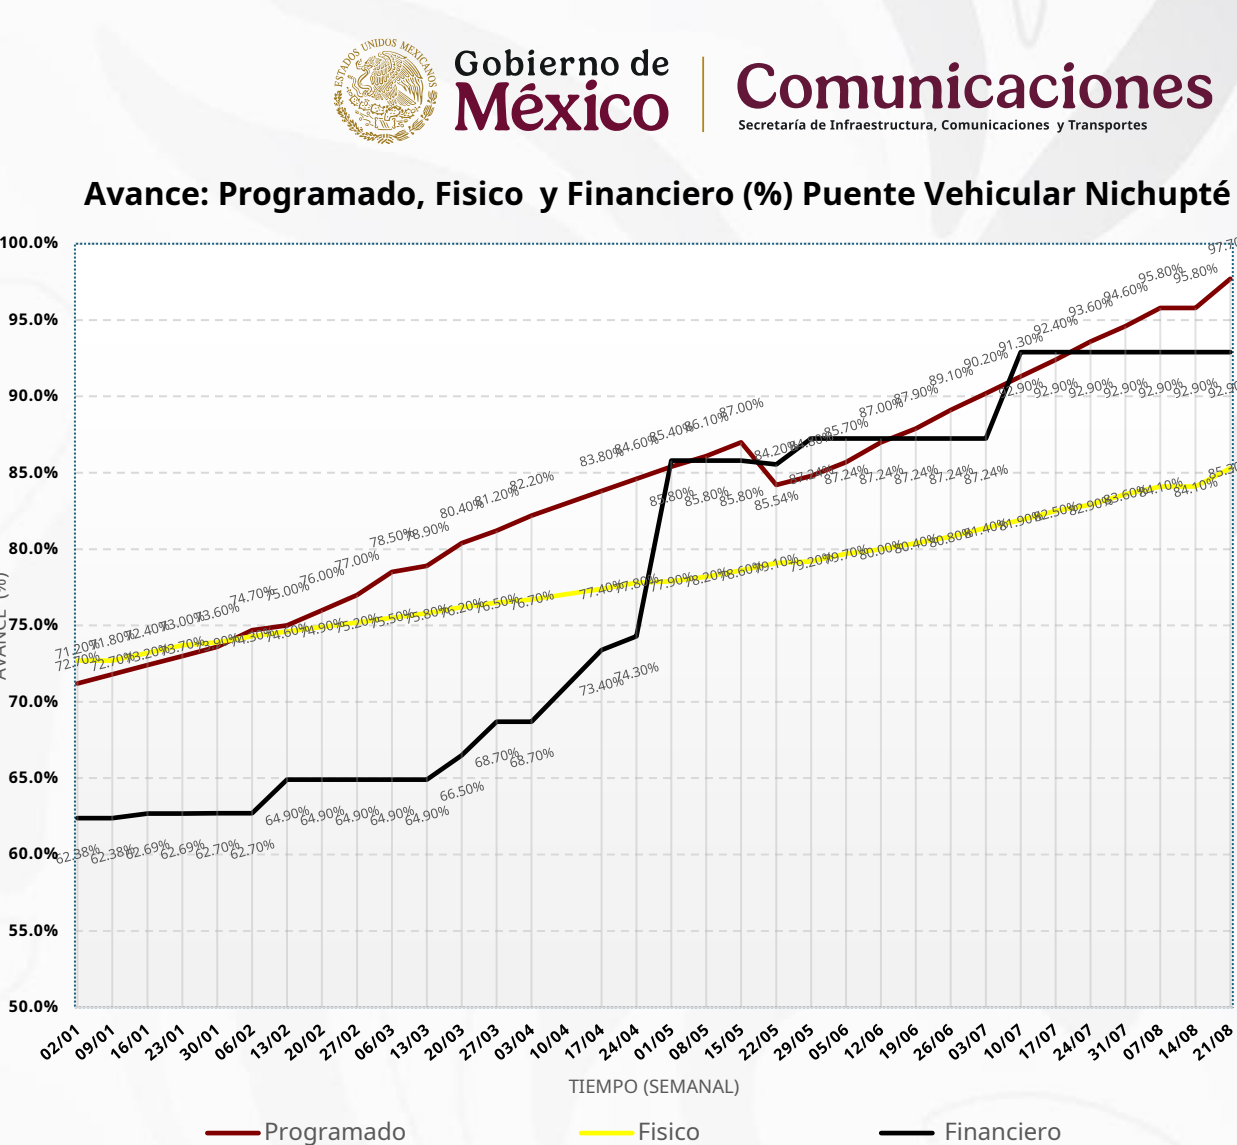

	08 al 14 de agosto	15 al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	909	933
Maquinaria	107	109
