


Chiapas

Puente Rizo de Oro

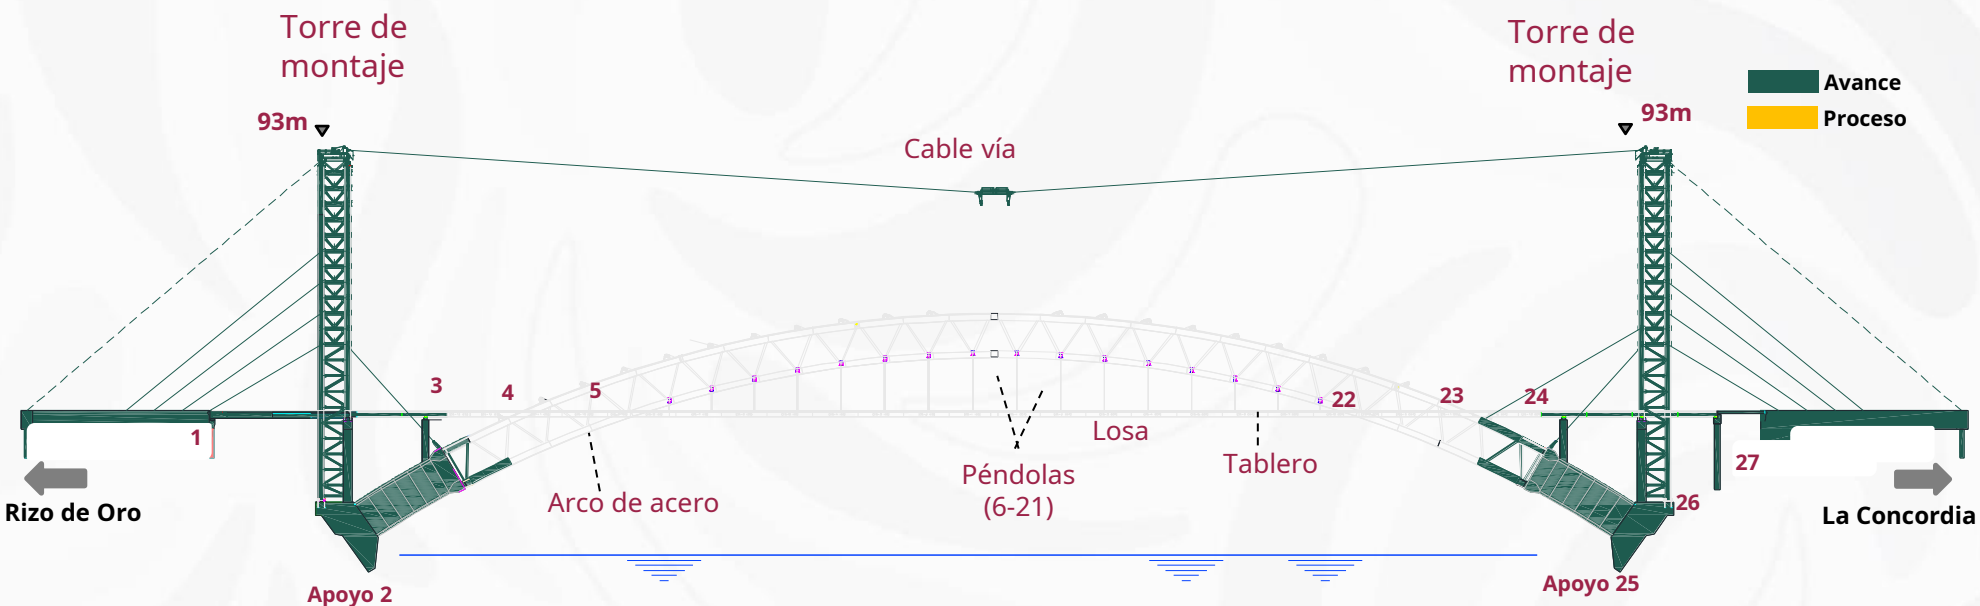


Avance físico


- Programado: 94.6%
- Real: 81.8%
- Incremento Semanal: 0.2%
- Financiero: 76.68%


RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:


- Condiciones climatológicas.
- Adecuación del carro de izaje: Esta tarea incluye el reforzamiento del sistema de tracción y la revisión de las tensiones de los cables longitudinales y transversales.
- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra


No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/09/25 al 11/09/25	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	0	4	Sin iniciar	
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	Prueba de carga en vacío
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t)	2,731	330.49	2400.5	53.18	82.55


 **Inversión total:** 1,482.2 mdp
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp

 **Inicio:** septiembre de 2023
Término: 31 de octubre de 2025

 **Meta:** 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso

 **5,715** empleos generados

 **300 mil** habitantes beneficiados

 **60 min** de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05/09/25 al 11/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 72%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	330.4	2400.5	53.18	53.18	Montaje con grúa sobre neumático
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m³)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

	29/08/25 al 04/09/25	05/09/25 al 11/09/25
Fuerza de Trabajo (personas)	187	187
Maquinaria	79	78
