

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100.0%
- Real: 87.7%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 97.4%

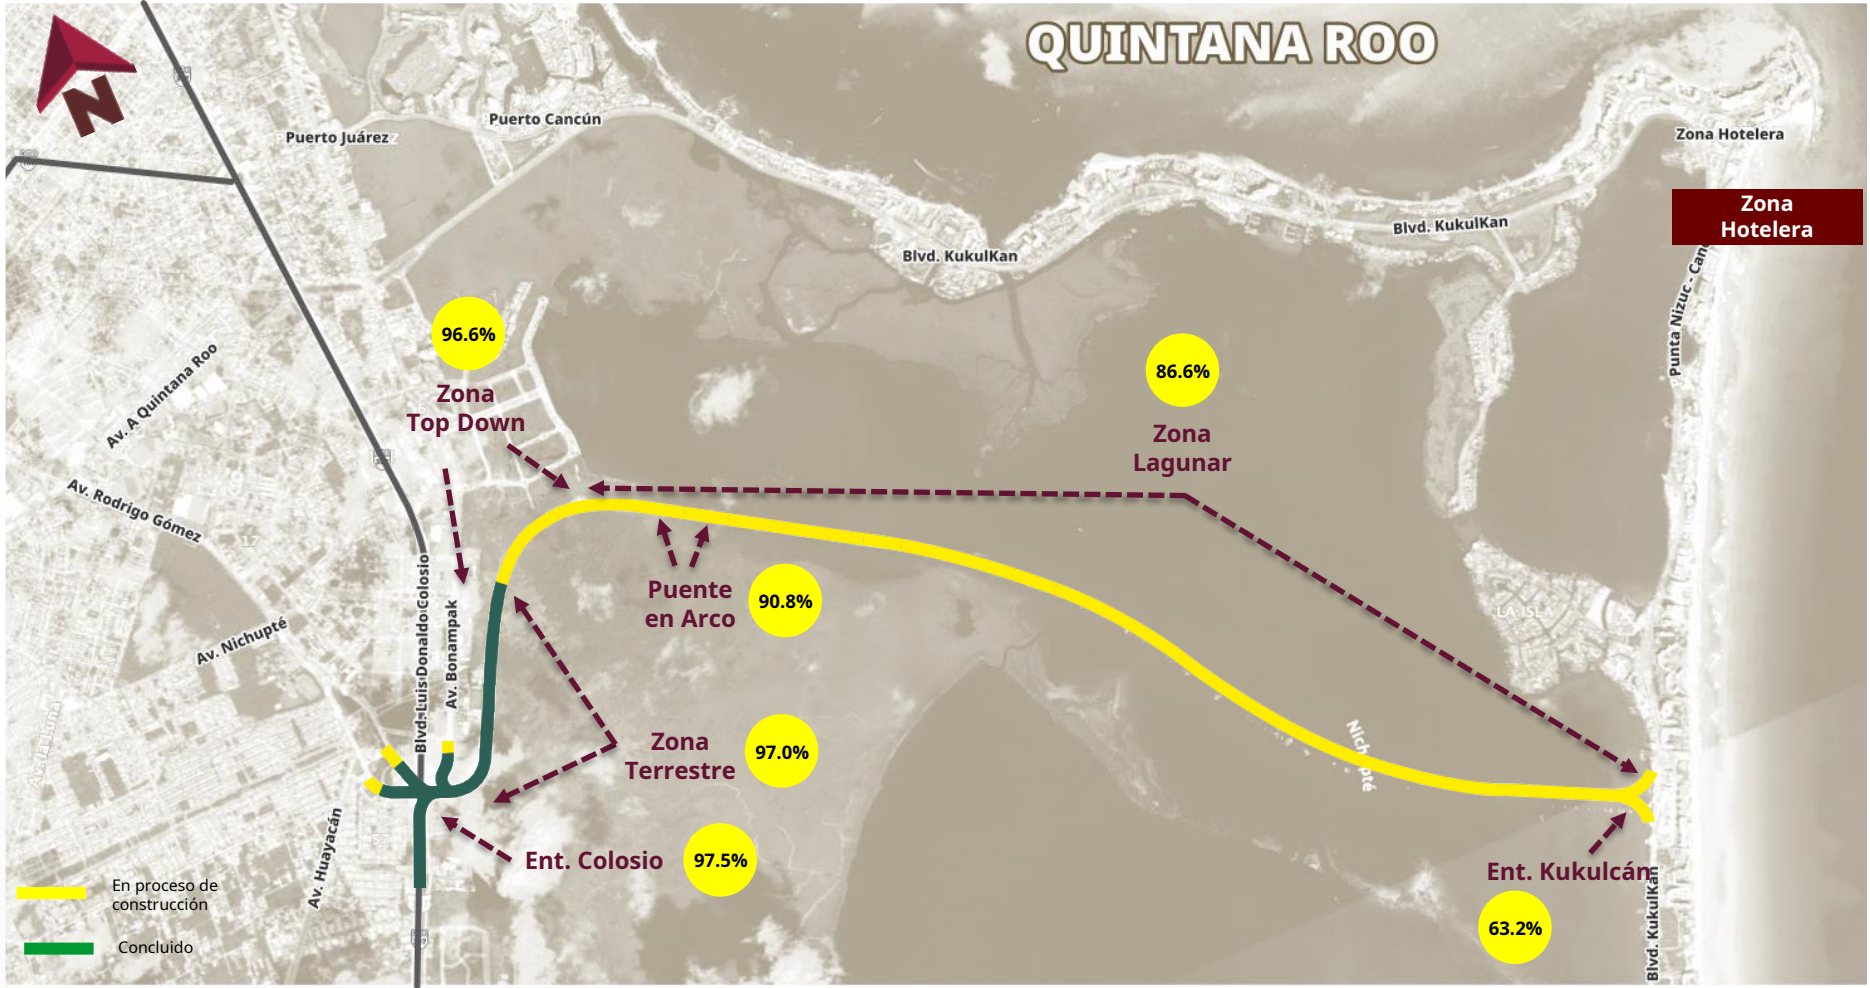

- 2022-2024:** 6,486.4 MDP
2025: 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022
Término: 20 de diciembre 2025
- Meta:** 11.2 km
 - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
 - 2.4 km entronques (2)
 - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos** generados
20 millones de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulado | Faltante | Ejecutado del 26 de septiembre al 02 de octubre 2025 | Fecha contractual de terminación |
|--|----------|---------------------|----------|--|----------------------------------|
| Pilas de cimentación (pza) | 1,311 | 1,311 | 0 | - | Concluido |
| Pilas apoyo 177 | 10 | 10 | 0 | - | Concluido |
| Trabe de liga (pza) | 53 | 52 | 1 | 0 | Octubre 2025 |
| Columnas (pza) | 926 | 878 | 43 | 0 | Septiembre 2025 |
| Fabricación de cabezal (pza) | 240 | 232 | 8 | 2 | Octubre 2025 |
| Montaje de cabezal (pza) | 240 | 216 | 24 | 2 | Octubre 2025 |
| Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán) | 16 | 13 | 3 | 0 | Octubre 2025 |
| Fabricación de traves tipo Aastho (pza) | 1,658 | 1,551 | 107 | 10 | Octubre 2025 |
| Montaje de traves Aastho (pza) | 1,658 | 1,357 | 301 | 28 | Noviembre 2025 |
| Fabricación de traves tipo tableta (pza) | 150 | 150 | 0 | 6 | Concluido |
| Montaje de traves tipo tableta (pza) | 150 | 117 | 33 | 7 | Noviembre 2025 |
| Fabricación de prelosas (pza) | 44,809 | 34,386 | 10,423 | 386 | Noviembre 2025 |
| Montaje de prelosas (pza) | 44,809 | 25,110 | 19,699 | 0 | Diciembre 2025 |
| Losa (claro) | 281 | 194.4 | 96.6 | 5.6 | Diciembre 2025 |
| Guarnición (m) | 20,769.5 | 9,483.2 | 11,286.3 | 338.5 | Diciembre 2025 |
| Parapeto (m) | 20,769.5 | 6,895.0 | 13,874.5 | 332.5 | Diciembre 2025 |
| Pavimento (m3) | 6,556.9 | 0 | 6,556.9 | 0 | Diciembre 2025 |
| Juntas de dilatación (pza) | 82.0 | 0 | 82.0 | 0 | Diciembre 2025 |
| Alumbrados (km) | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | Diciembre 2025 |
| ITS (km) | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | Diciembre 2025 |
| Drenaje (pza) | 117 | 0 | 117 | 0 | Diciembre 2025 |

