

Chiapas


Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

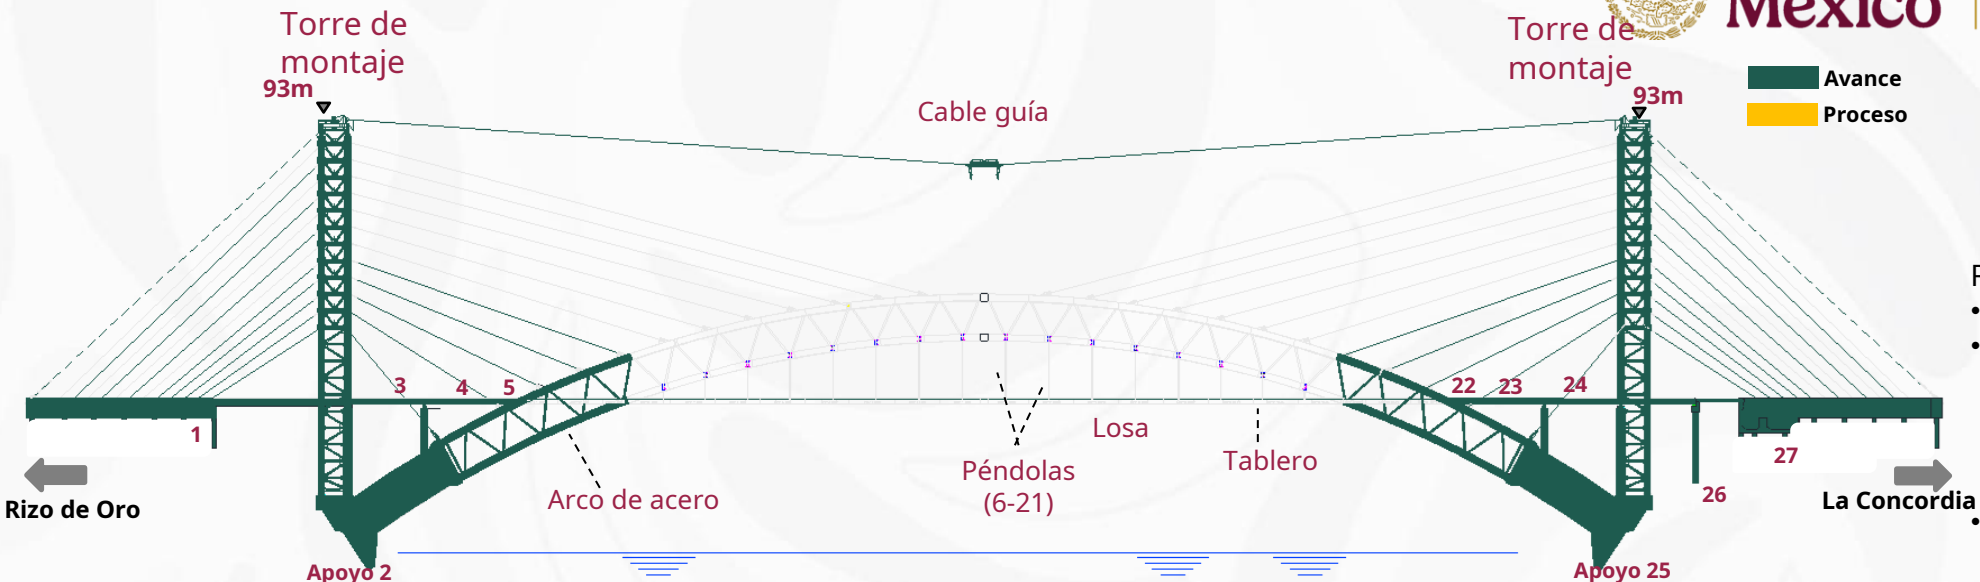

Avance
Proceso

Avance físico

- Programado: 83.71%
- Real: 84.30%
- Incremento Semanal: 0.49%
- Financiero: 83.17%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- Condiciones climatológicas.
- Adecuación del carro de izaje: Esta tarea incluye el reforzamiento del sistema de tracción y la revisión de las tensiones de los cables longitudinales y transversales.
- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra

No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	25/11/25 al 01/12/25	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	2	2	1	Ejecutado el cabezal 4
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	En operación
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t)	2,731	980.27	1,751	134.38	134.38
	Montaje de Dovela de Superestructura (946 t)	946.70	367.74	578	0	0



Inversión total: 1,482.2 mdp
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp



Inicio: septiembre de 2023
Término: 30 de junio de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	25/11/25 al 01/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%, mientras que el avance en obra es del 85%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	980.27	1,751	134.38	134.38	Montaje con grúa sobre neumático.
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	


Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

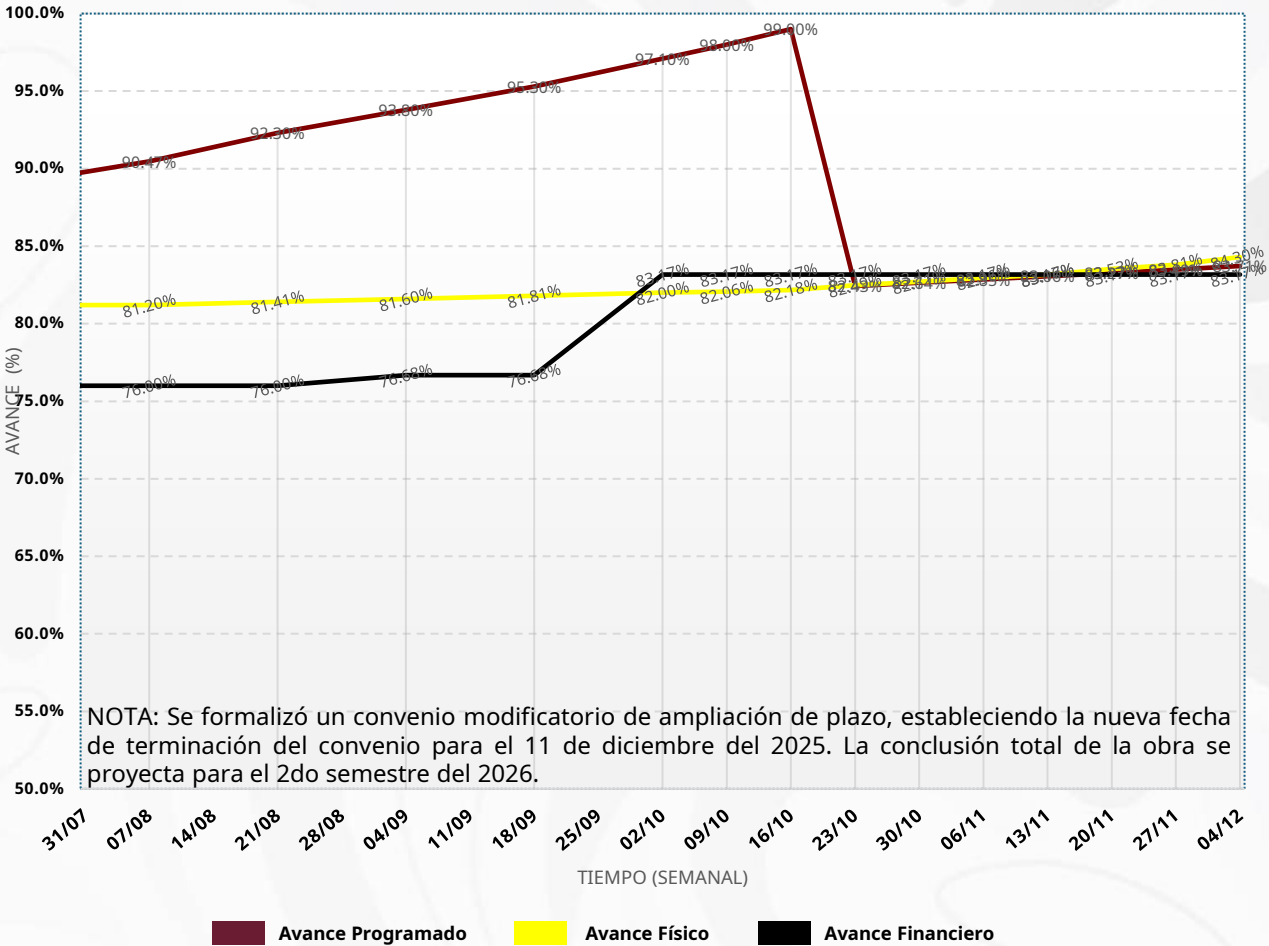

	20 al 27 de noviembre	28 de noviembre al 04 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	200	198
Maquinaria	81	80
Frentes	3	3
