


Chiapas

Puente Rizo de Oro

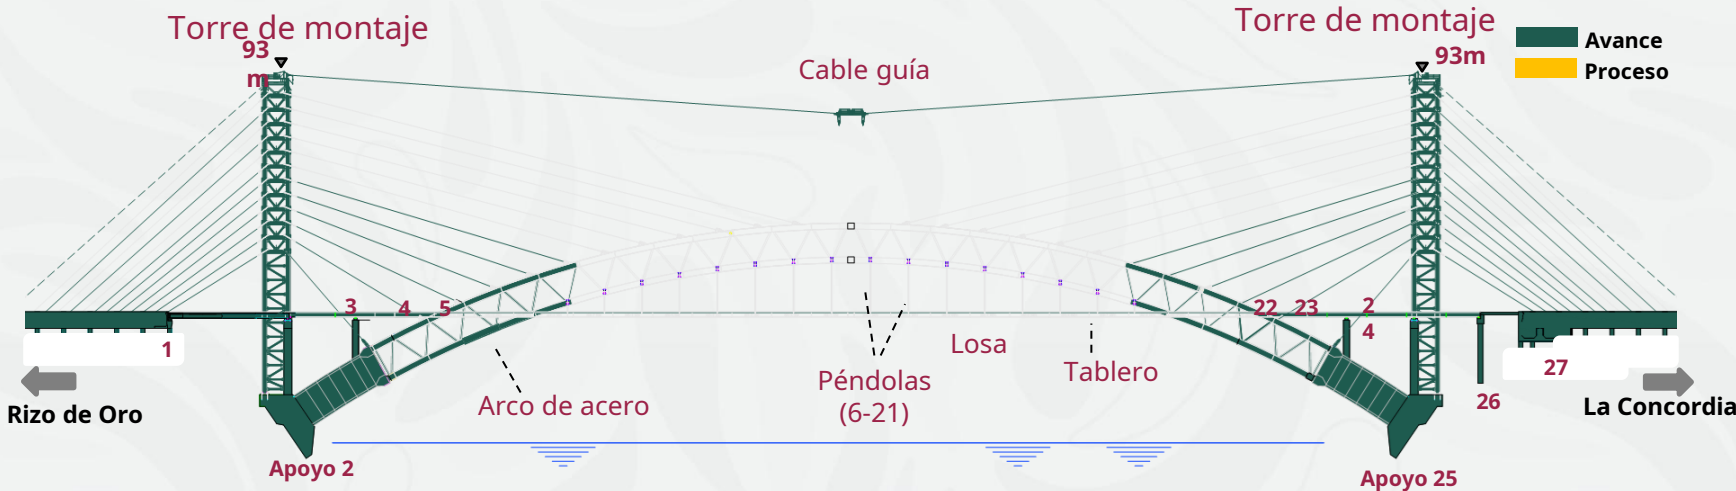

Avance físico

- Programado: 85.33%
- Real: 85.33%
- Incremento Semanal: 0.00%
- Financiero: 73.64%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

No.	Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/26 al 05/01/26	
					Programado	Ejecutado
1.	Caballote 01, Pilotes de 8 m	1	1	0	0	Concluido
2.	Apoyo 2: Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
3.	Columna sobre dovela de concreto DC-06I, 11 m	1	1	0	0	Concluido
4, 5, 22,23	Cabezal de acero	4	4	0	0	Concluido
6-21.	Péndolas (pza.)	16	0	16	Sin iniciar	
24.	Columna sobre dovela de concreto DC-06D, 11 m	1	1	0	0	Concluido
25.	Zapata de cimentación, Columna 22 m	1	1	0	0	Concluido
26.	Apoyo 26: Pilotes de 10 m y columnas de 8 m	1	1	0	0	Concluido
27.	Caballote 27: Pilotes de 6 m	1	1	0	0	Concluido
28.	Cable Vía (331 ton)	331	331	0	0	Prueba de carga progresiva
	Montaje de Dovela de arco (2,731 t)	2,731	1,267	1,464	0	0
	Montaje de Dovela de Superestructura (946 t)	946.70	367.74	578	0	0



Inversión total: 1,482.2 mdp
2023-2024: 1,222.2 mdp
2025: 260.0 mdp



Inicio: septiembre de 2023
Término: 30 de junio de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados




60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	02/01/26 al 05/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Torres de montaje (ton)	1,347	1,347	--	--	--	• Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,969	762	--	--	• La fabricación de dovelas de arco de acero está al 100%.
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	1,267	1,464	0	0	Soldadura en arriostramiento DA-06
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	946.7	--	--	--	• Concluido
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Supervisión: JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

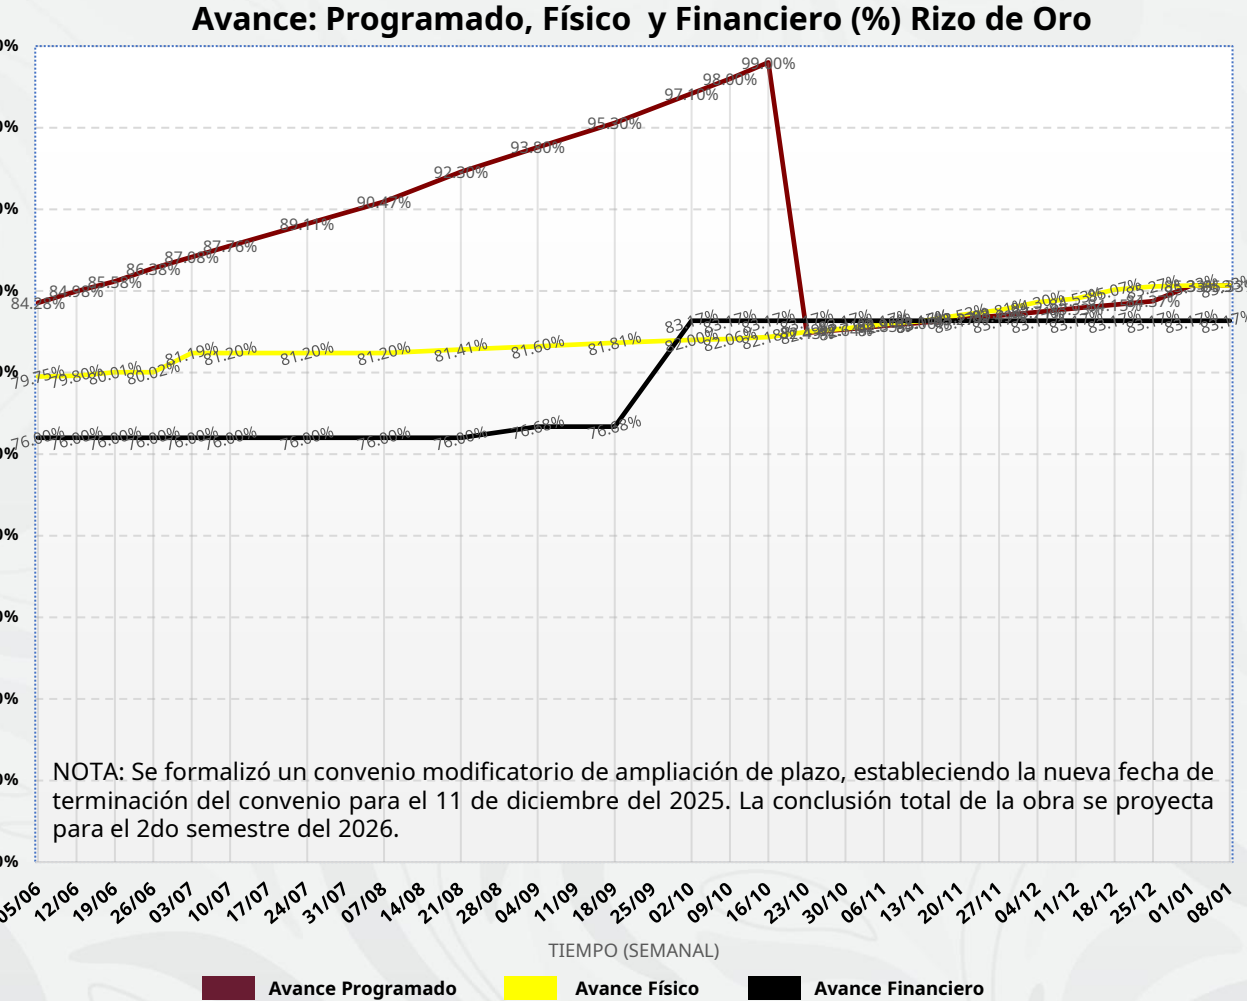

	26/12/25 al 01/01/26	02/01/26 al 08/01/26
Fuerza de Trabajo (personas)	123	73
Maquinaria	78	58
Frentes		
