


San Ignacio-Tayoltita

Tramo Sinaloa-Durango



Avance físico • Programado: 100 % • Financiero: 99.9%
• Real: 100 %

CONCLUIDA

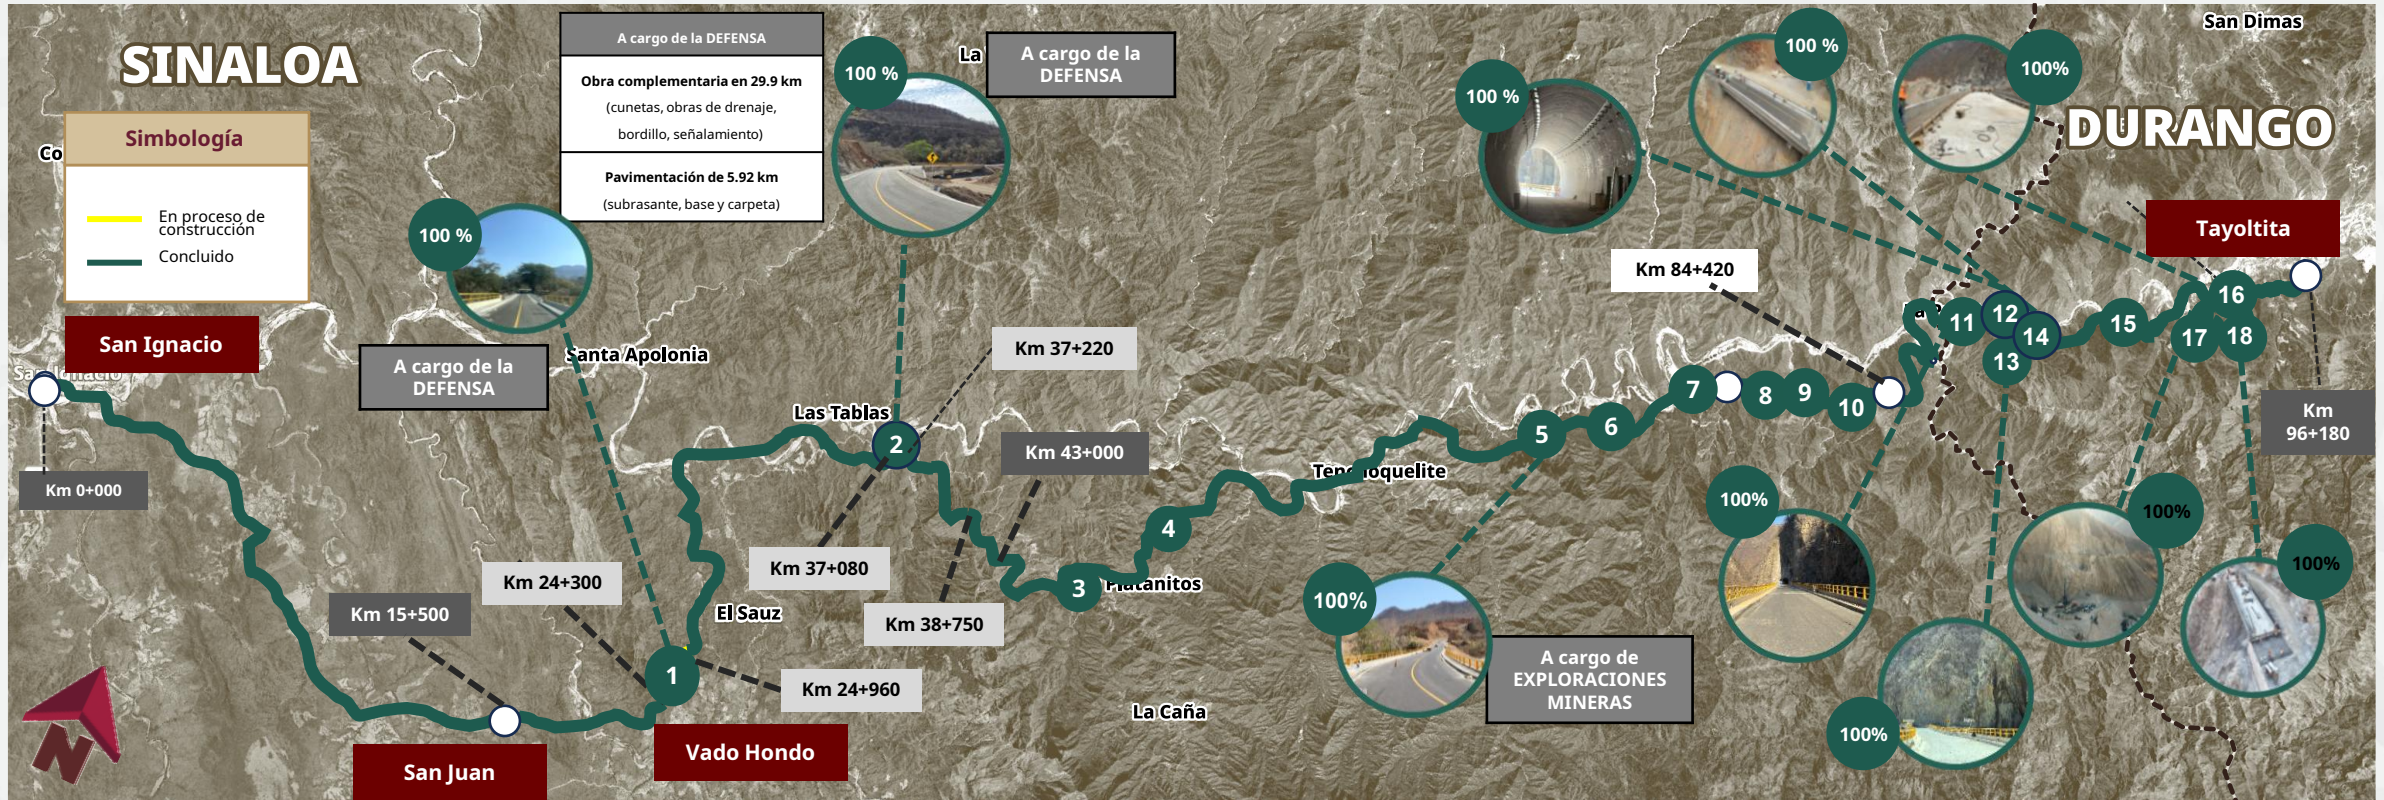




Descripción		Empresas
16	Puente Auxiliar I km 93+240 L=240 m	• COCONAL S.A.P.I. de C.V.
17	Viaducto El Sauz km MDP 93+420 L= 171 m	
18	Puente Auxiliar II km 93+700 L= 30 m	

Inversión: 3,170.5 mdp
2019-2024: 3,058.5 mdp
2025: 112.0 mdp

Inicio: abril de 2019
Término: 25 de agosto de 2025

- **Meta:** 96.2 km
- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 515 m Túnel "Duranguense"
- 509 m, viaductos (3)
- 880 m, puentes

-  **9,511** empleos generados
-  **11,131** habitantes beneficiados
-  **10 horas** /ahorro en tiempo
