

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 92.2%
- Semanal: 0.1%
- Financiero: 90.9%
- (REPROGRAMACION)

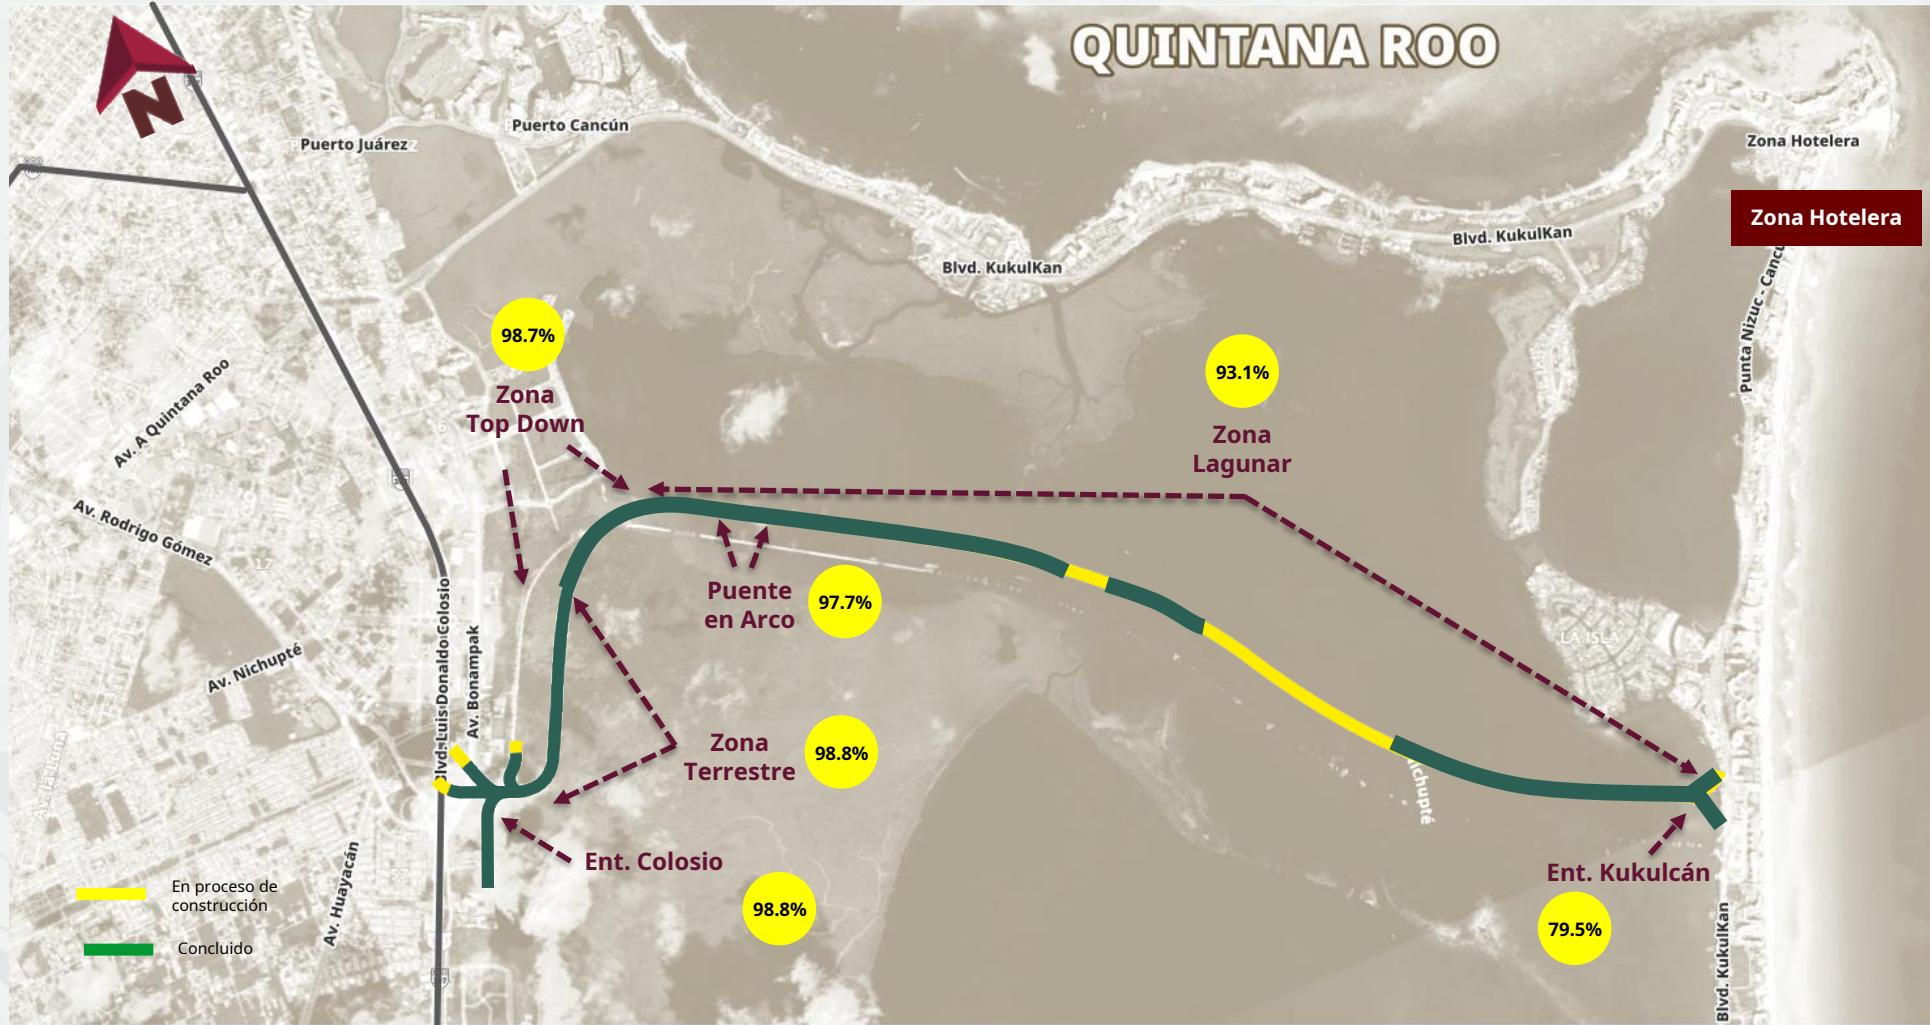

**Inversión Total: 10,319.5**

**2022-2025: 9,419.5 MDP**

**Programado 2026: 900 MDP**



**Inicio: 01 de julio de 2022**

**Término: 31 marzo 2026**



**Meta: 11.2 km**

- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m



**Más de 51 mil empleos generados**  
**20 millones** de turistas



**1.32 millones** de habitantes beneficiados



**45 minutos** de ahorro en tiempo

# Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)


Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 08 al 14 de enero de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	12	0	12	0	Enero 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	6	0	6	0	Enero 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	6	0	6	0	Enero 2026
Apoyo columnas canal de navegación (pza)	5	4.86	0.14	0.14	Diciembre 2025
Columnas alzada (pza)	15	15	0	0.55	Concluido
Mensulas (pza)	5	4.1	0.9	0.35	Enero 2026
Montaje de cabezal (pza)	240	238	2	0	Enero 2026
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,609	49	17	Enero 2026
Montaje de prelosas (pza)	45,024	40,004	5,020	840	Enero 2026
Losa (claro)	281	249	32	4.5	Enero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	15,292.3	5,749.3	693	Enero 2026
Parapeto (m)	21,029.37	11,766.2	9,263.2	378	Enero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	1,511	172	94	Diciembre 2025
Pavimento viaducto (m3)	5,272	1,540	3,732	738	Enero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	1.5	80.5	0	Enero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	427	162	265	0	Enero 2026
Luminarias (pza)	427	162	265	0	Enero 2026
ITS (pza)	36	8.8	27.2	1	Enero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	54	77	10	Enero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	2	129	0	Enero 2026



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

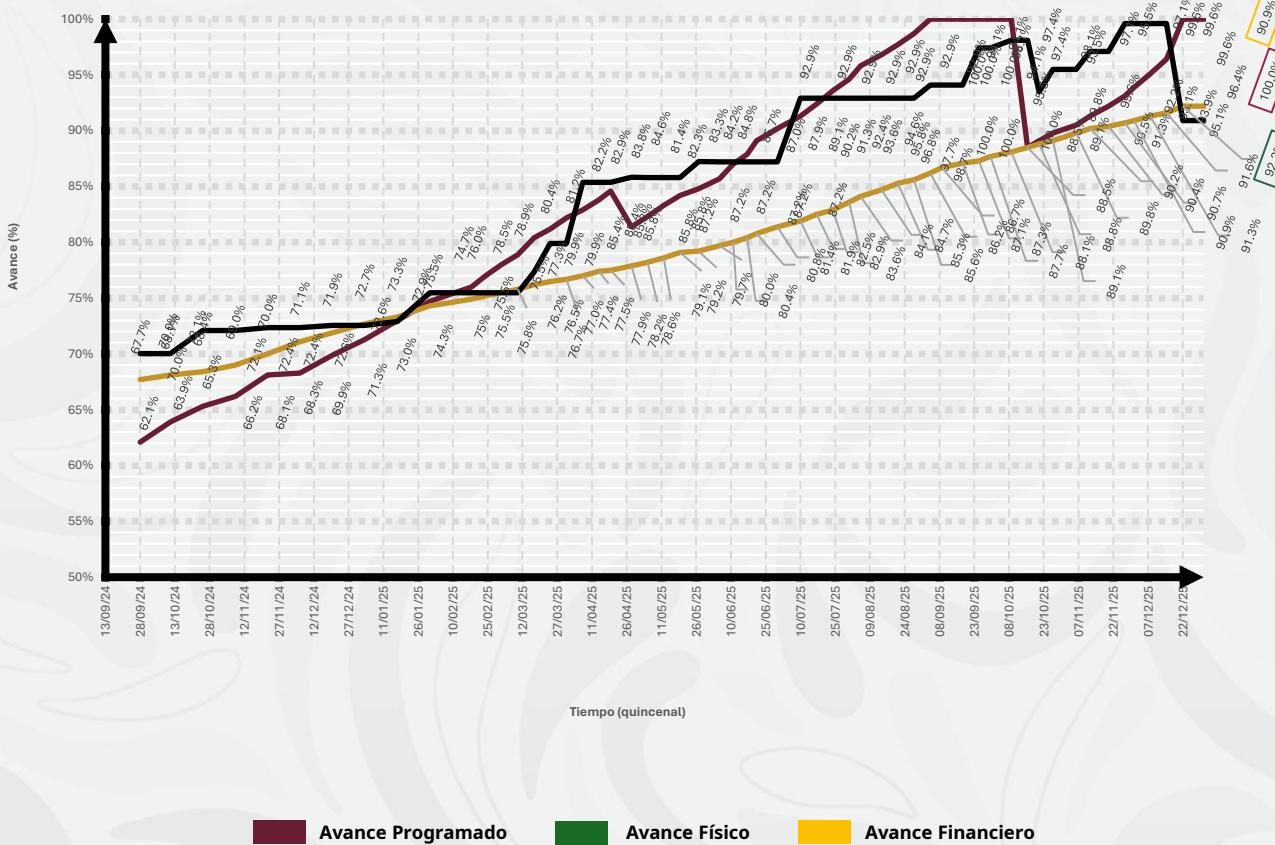

Avance Programado      Avance Físico      Avance Financiero

	27 al 29 de diciembre	30 de diciembre al 08 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	358	587
Maquinaria	63	88
