

# Quintana Roo


## Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance físico**
- Programado: 98.7%
  - Real: 85.6%
  - Semanal: 0.30%
  - Financiero: 92.9%

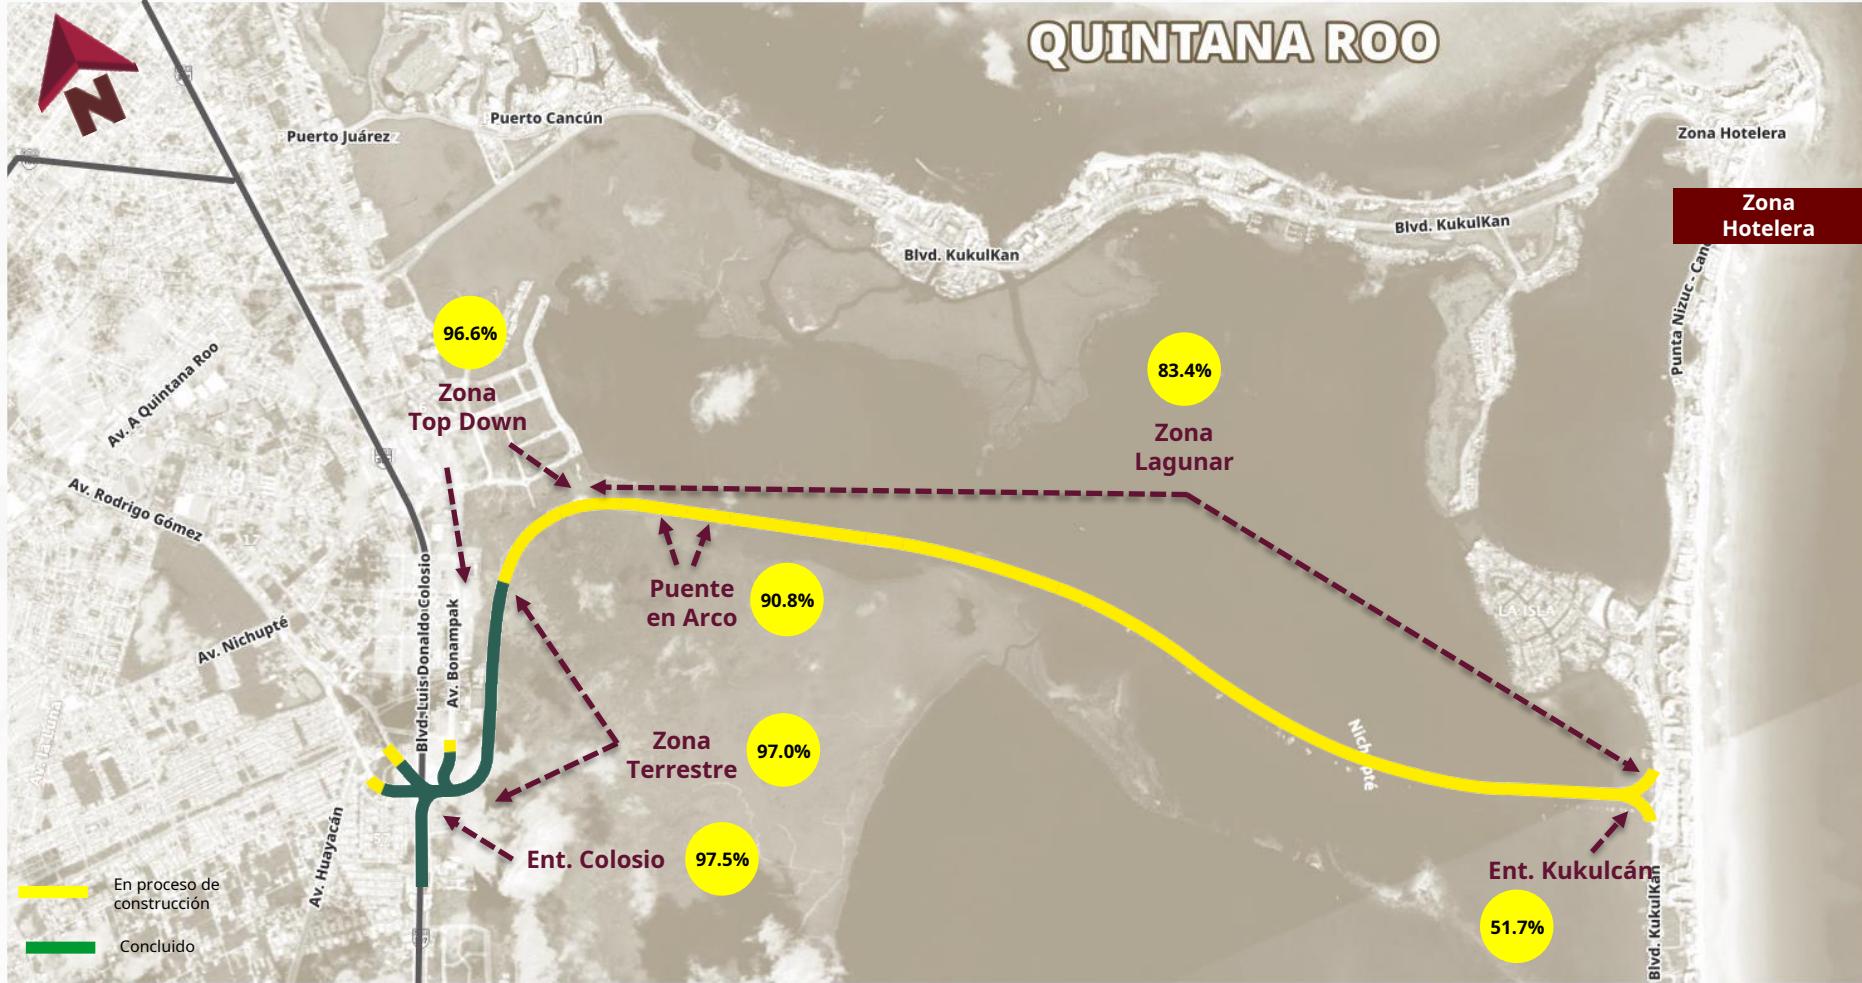

- 2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 2,100 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 20 de diciembre 2025
- Meta:** 11.2 km
  - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
  - 2.4 km entronques (2)
  - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil empleos** generados  
**20 millones** de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 22 al 28 de agosto 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	0	Concluido
Pilas apoyo 177	10	8	2	1	Agosto 2025
Trabe de liga (pza)	53	51	2	1	Octubre 2025
Columnas (pza)	926	855	66	3	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	227	13	2	Agosto 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	206	34	2	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	11	5	0	Agosto 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,495	163	17	Octubre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,230	428	28	Noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo tabletta (pza)	150	127	23	8	Agosto 2025
Montaje de trabes tipo tabletta (pza)	150	93	57	0	Agosto 2025
Fabricación de prelosas (pza)	44,809	32,778	12,031	417	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	24,110	20,699	400	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	178.8	102.2	5.5	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	8,060	12,709.5	234	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	4,810	15,959.5	105	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

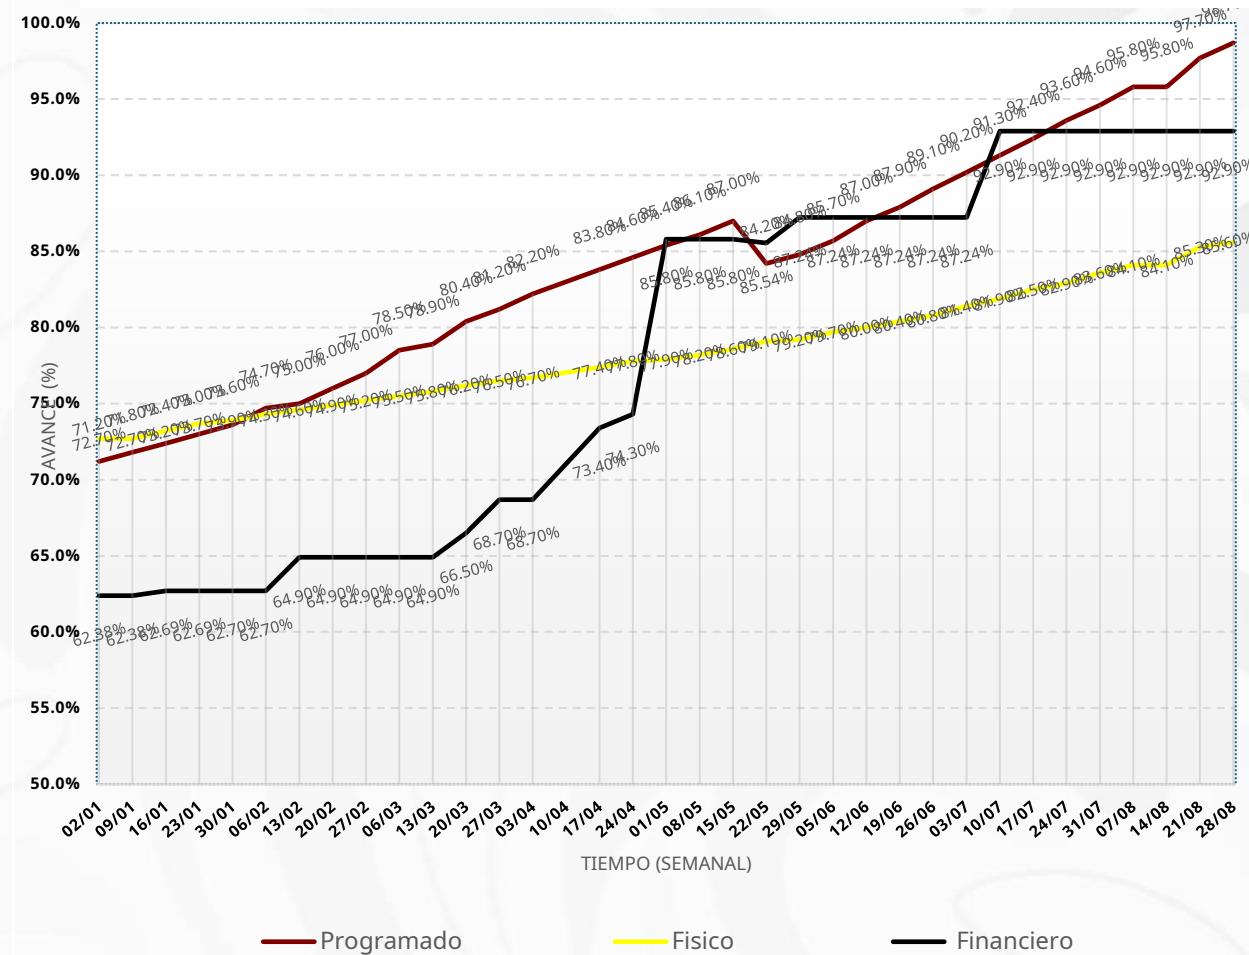

	15 al 21 de agosto	22 al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	933	933
Maquinaria	109	109
