


Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Avance físico	<ul style="list-style-type: none"> • Programado: 100% • Real: 92.7% <p>(REPROGRAMACION)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semanal: 0.5% • Financiero: 90.9%
		* Ajuste por modificación de presupuestado

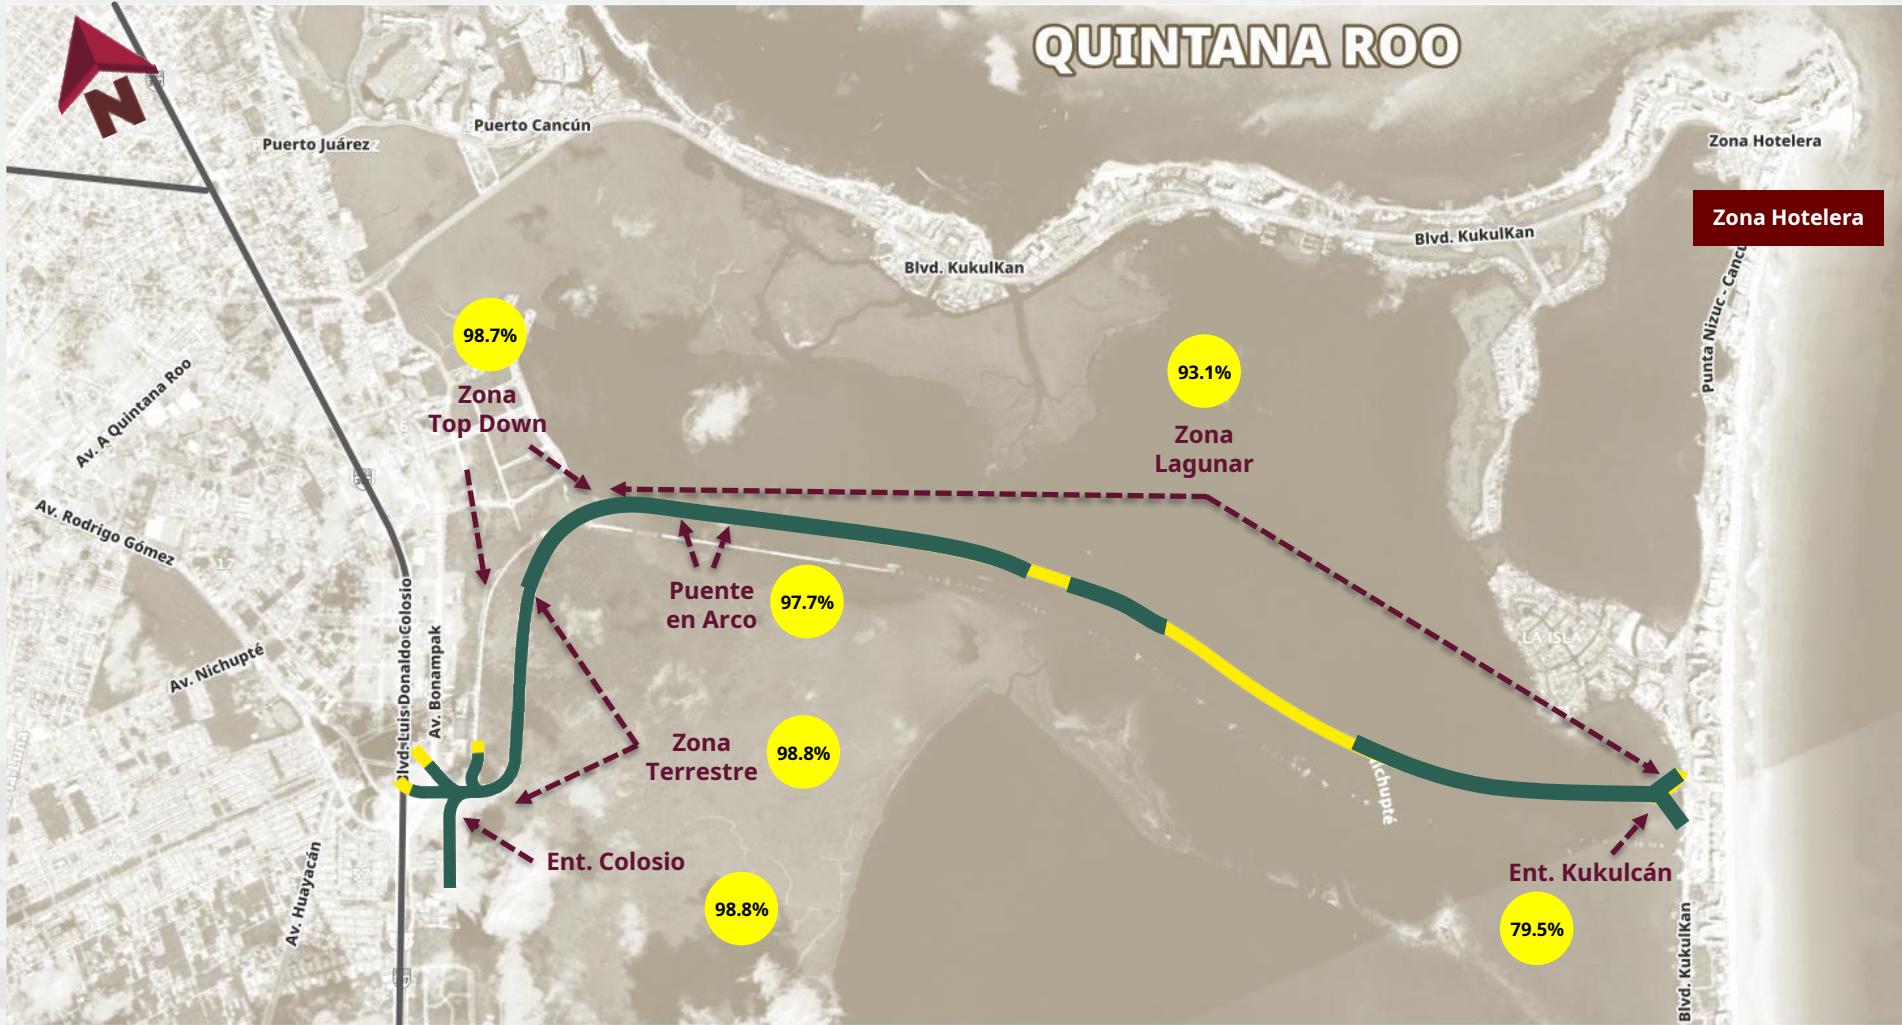


Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté



Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 08 al 14 de enero de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	12	0	12	0	Febrero 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	3	0	3	0	Febrero 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	3	0	3	0	Febrero 2026
Apoyo columnas canal de navegación (pza)	5	4.88	0.12	0.03	Enero 2026
Columnas alzada (pza)	15	15	0	-	Concluido
Mensulas (pza)	5	4.24	0.76	0.18	Enero 2026
Montaje de cabezal (pza)	240	239	1	1	Enero 2026
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,626	32	17	Febrero 2026
Montaje de prelosas (pza)	45,024	40,424	4,600	420	Febrero 2026
Losa (claro)	281	254	27	5	Febrero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	15,968.8	5,072.8	677.3	Febrero 2026
Parapeto (m)	21,029.37	12,438.2	8,591.2	672.0	Febrero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	1,511	172	0	Enero 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	1,957	3,315	417	Febrero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	3.0	79	1.5	Febrero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	427	162	265	0	Febrero 2026
Luminarias (pza)	427	162	265	0	Febrero 2026
ITS (pza)	36	9.8	26.2	1	Febrero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	68	62	14	Febrero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	5	126	3	Febrero 2026

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

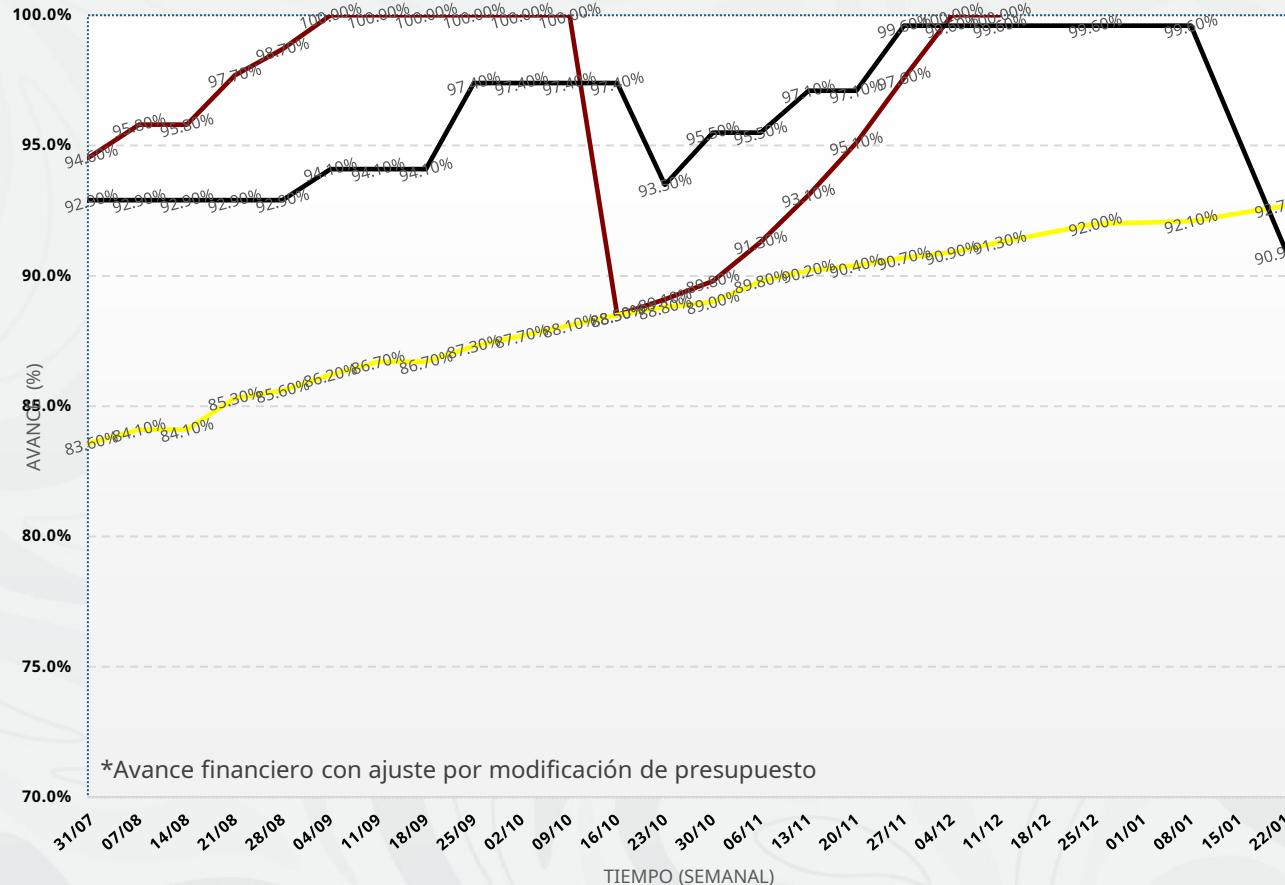

30 de diciembre al 08 de enero 2026	Del 09 al 14 de enero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	587
Maquinaria	92
