# Chiapas


### Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	18-04-24 al 24-04-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Torres de montaje (ton)	1,367	1,367				Concluido
Dovelas de Arco en sitio (ton)	2,731	1,804	927	46	46	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,731	49	2,682			El montaje de la dovela de arco 0 1 se desfaso, priorización de montaje de las torres de monta
Fab. Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	887.7	59	59	59	La fabricación de dovelas de superestructura alcanzó el 100% mientras que el avance en obra e del 93% por restricción logística de almacén, buscando evital la saturación
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m³)	72,614	59,448	13,166	973	3,347	





### Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Rizo de Oro

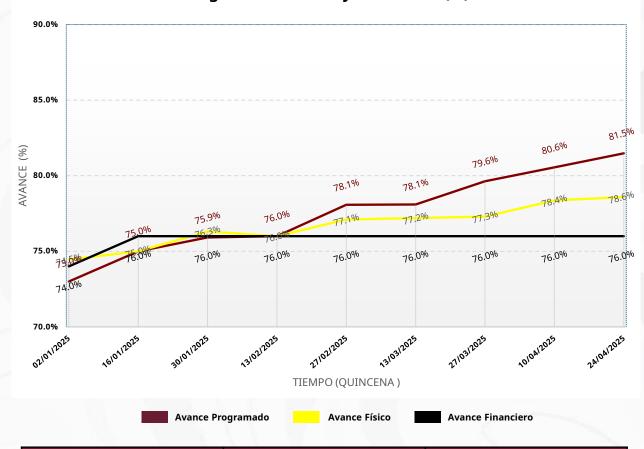

	11de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	207	268
Maquinaria	80	81

## Sonora/Chihuahua

## Camino Límite Estados Chihuahua/Sonora Pancho Villa-E.C. (Janos-Monte Verde)





#### 1.- Constructora URBATRAC, S.A. de C.V.

Meta: Km 0+000-km 11+000, incluye entrongue km 0+000 Inversión: 324.6 MDP C/IVA

#### 2.- ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.

Meta: Km 11+000-km 18+093 km Inversión: 306.2 MDP C/IVA

#### 3.- En proceso de licitación

F. Km 6+900 Puente I, 122.0 m G. Km 14+700 Puente II, 61.5 m

#### 4.- En proceso de licitación

Por modernizar a nivel de pavimento a 7.0 m Meta: Km 18+093 - km 29+093

#### 5.- La CIMA Terraceros, S.A. de C.V. y Estructuras y Excavaciones JM, S.A. de C.V.

Meta: Km 29+093-KM 47+233 Inversión: 193.9 MDP C/IVA

#### 6.- MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V.

Meta: Km 47+233-Km 59+823 y Km 66+422-Km 66+828, incluye Boulevard y entronque a nivel.

Inversión: 179.4 MDP C/IVA

#### 7.- Asfaltos y Triturados EL PUJAL, S.A. de C.V.

#### En proceso de construcción de 5 puentes:

- A. Km 22+758 El Papalote, 30.0 m
- B. Km 25+758 Los Pilares, 40.0 m
- C. Km 33+832 Las Profesoras, 40.0 m
- D. Km 36+682 La Enramada, 30.0 m
- E. Km 38+362 La Pila, 120.0 m


Inversión: 122.5 MDP C/IVA

Avance físico

Programado: 5.5%

• Real: 3.4%

 Semanal: 0.2% Financiero: 3.0%

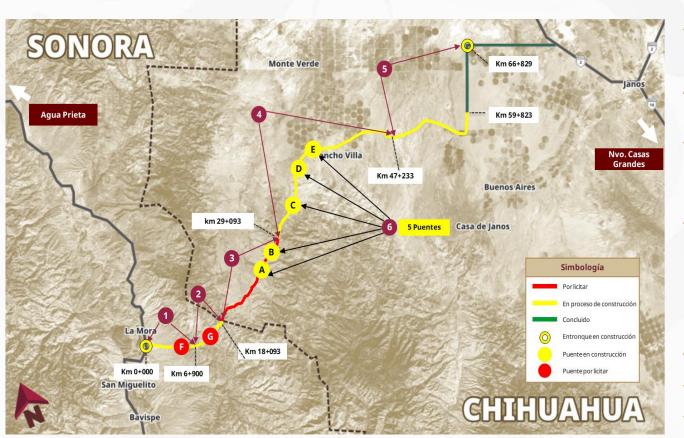

### INICIO DE TRABAJOS

Inversión total: 1,859.0 mdp

**Sonora:** 774.5 mdp

Chihuahua: 1.084.5 mdp

Inicio: marzo, 2025

**Término:** diciembre de 2025

Meta total: 66.8 km y 7 puentes

• 6.6 km modernizados C. Chihuahua (se requiere trabajos complementarios)

Meta pendiente: 60.2 km y 7 puentes Sonora

- 18.1 km, ampliación C

2 puentes (184 m)

#### Chihuahua

- 42.1 km, ampliación C

5 puentes (320 m)

**5,557** empleos generados

115 mil habitantes beneficiados

**90 minutos** de ahorro en tiempo
