

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté



Comunicaciones


Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
 - Real: 92.1%

(REPROGRAMACION)

 - Semanal: 0.1%
 - Financiero: 99.6%

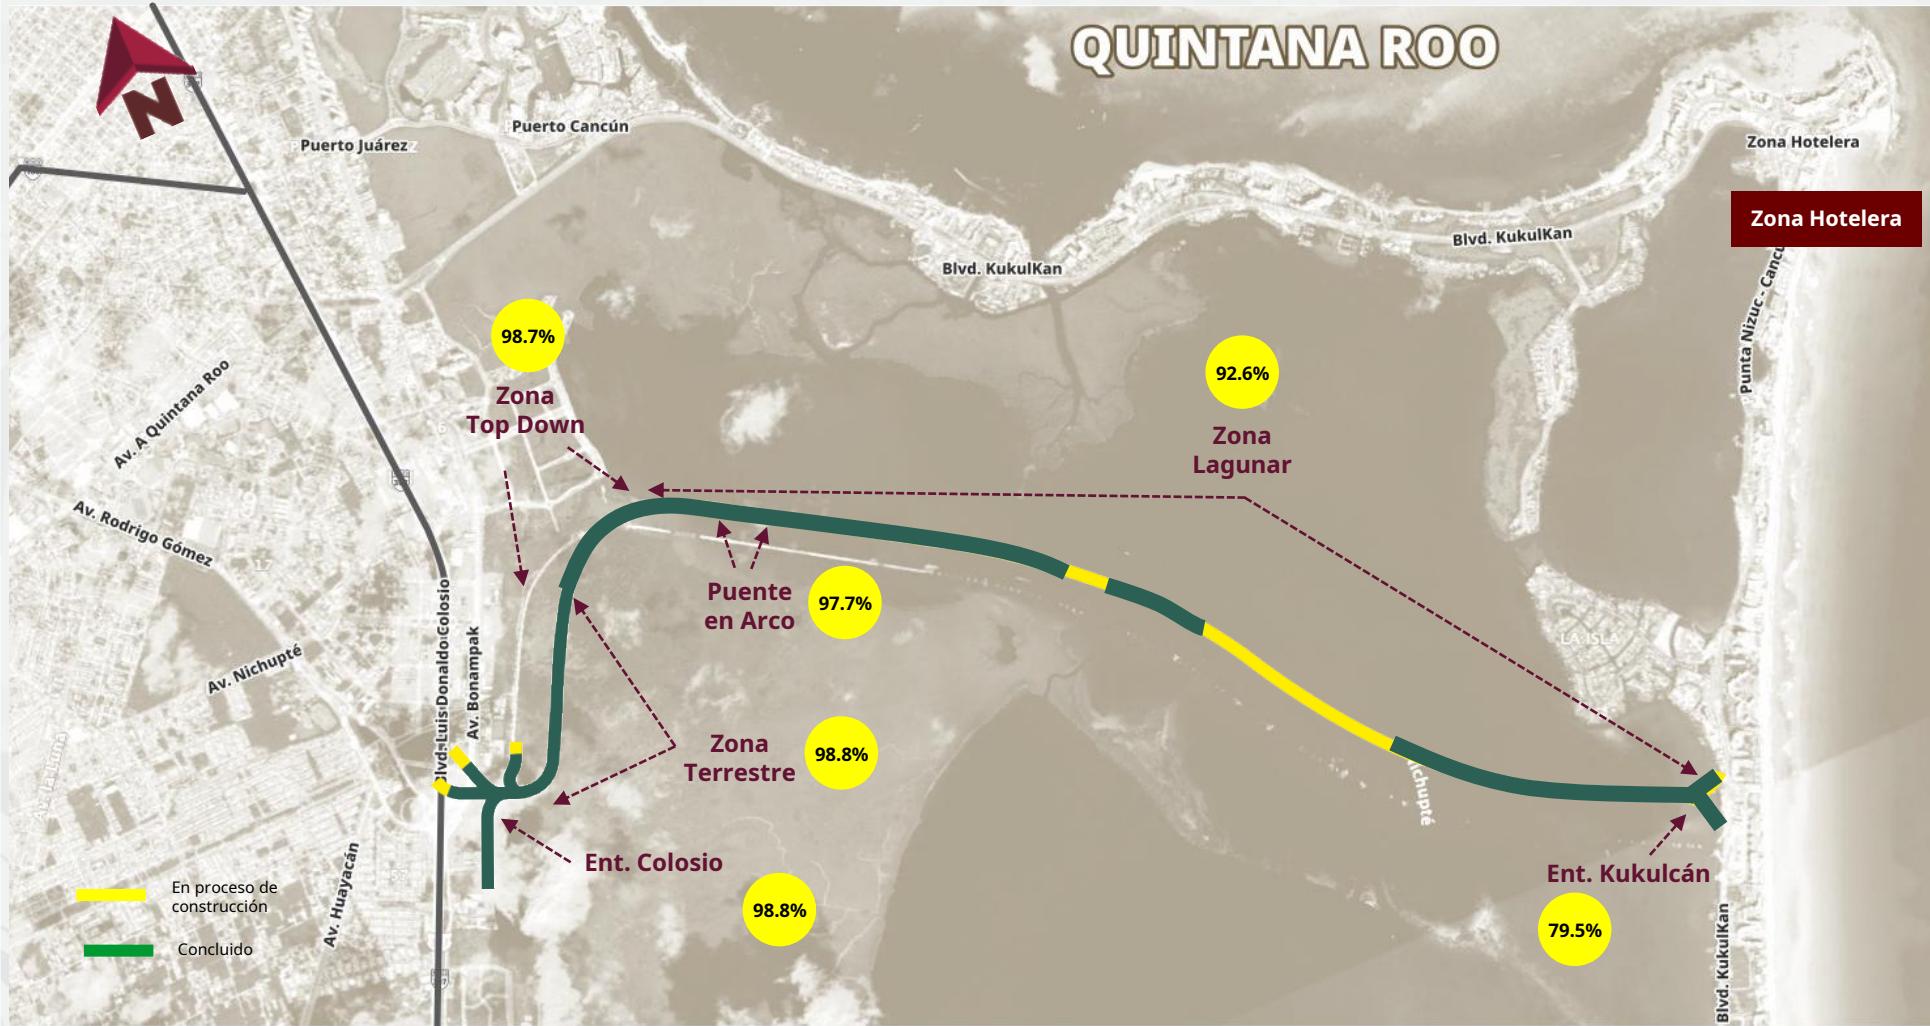


Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté



Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 01 al 07 de enero de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	0	-	Concluido
Columnas (pza)	921	921	0	-	Concluido
Fabricación de cabezal (pza)	240	240	0	-	Concluido
Montaje de cabezal (pza)	240	238	2	0	Enero 2026
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	16	0	-	Concluido
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,658	0	-	Concluido
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,592	66	6	Enero 2026
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Fabricación de prelosas (pza)	45,024	45,024	0	-	Concluido
Montaje de prelosas (pza)	45,024	39,164	5,860	0	Enero 2026
Losa (claro)	281	244.5	36.5	3.5	Enero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	14,599.3	6,442.3	375	Enero 2026
Parapeto (m)	21,041.57	11,388.2	9,653.4	504	Enero 2026
Pavimento entronques (m ³)	1,683	1,417	266	669	Diciembre 2025
Pavimento viaducto (m ³)	5,272	802	4,470	0	Enero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	1.5	80.5	0	Enero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	427	162	265	43	Enero 2026
Luminarias (pza)	427	162	265	43	Enero 2026
ITS (pza)	36	7.8	28.2	0	Enero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	44	87	8	Enero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	2	129	0	Enero 2026

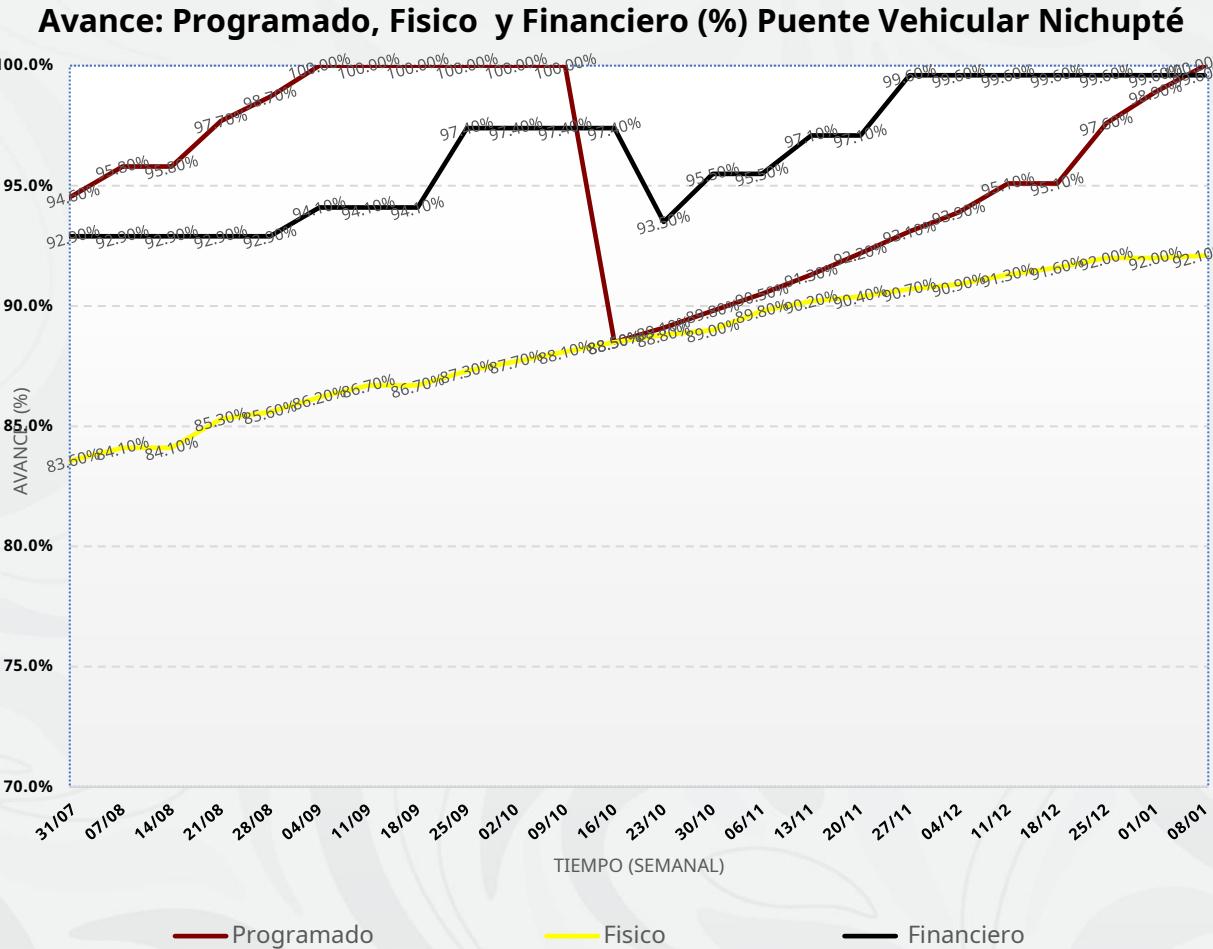

	20 al 26 de diciembre	27 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	556	358
Maquinaria	72	63
