

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 98.9%
- Real: 92.0%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 99.6%
- (REPROGRAMACION)

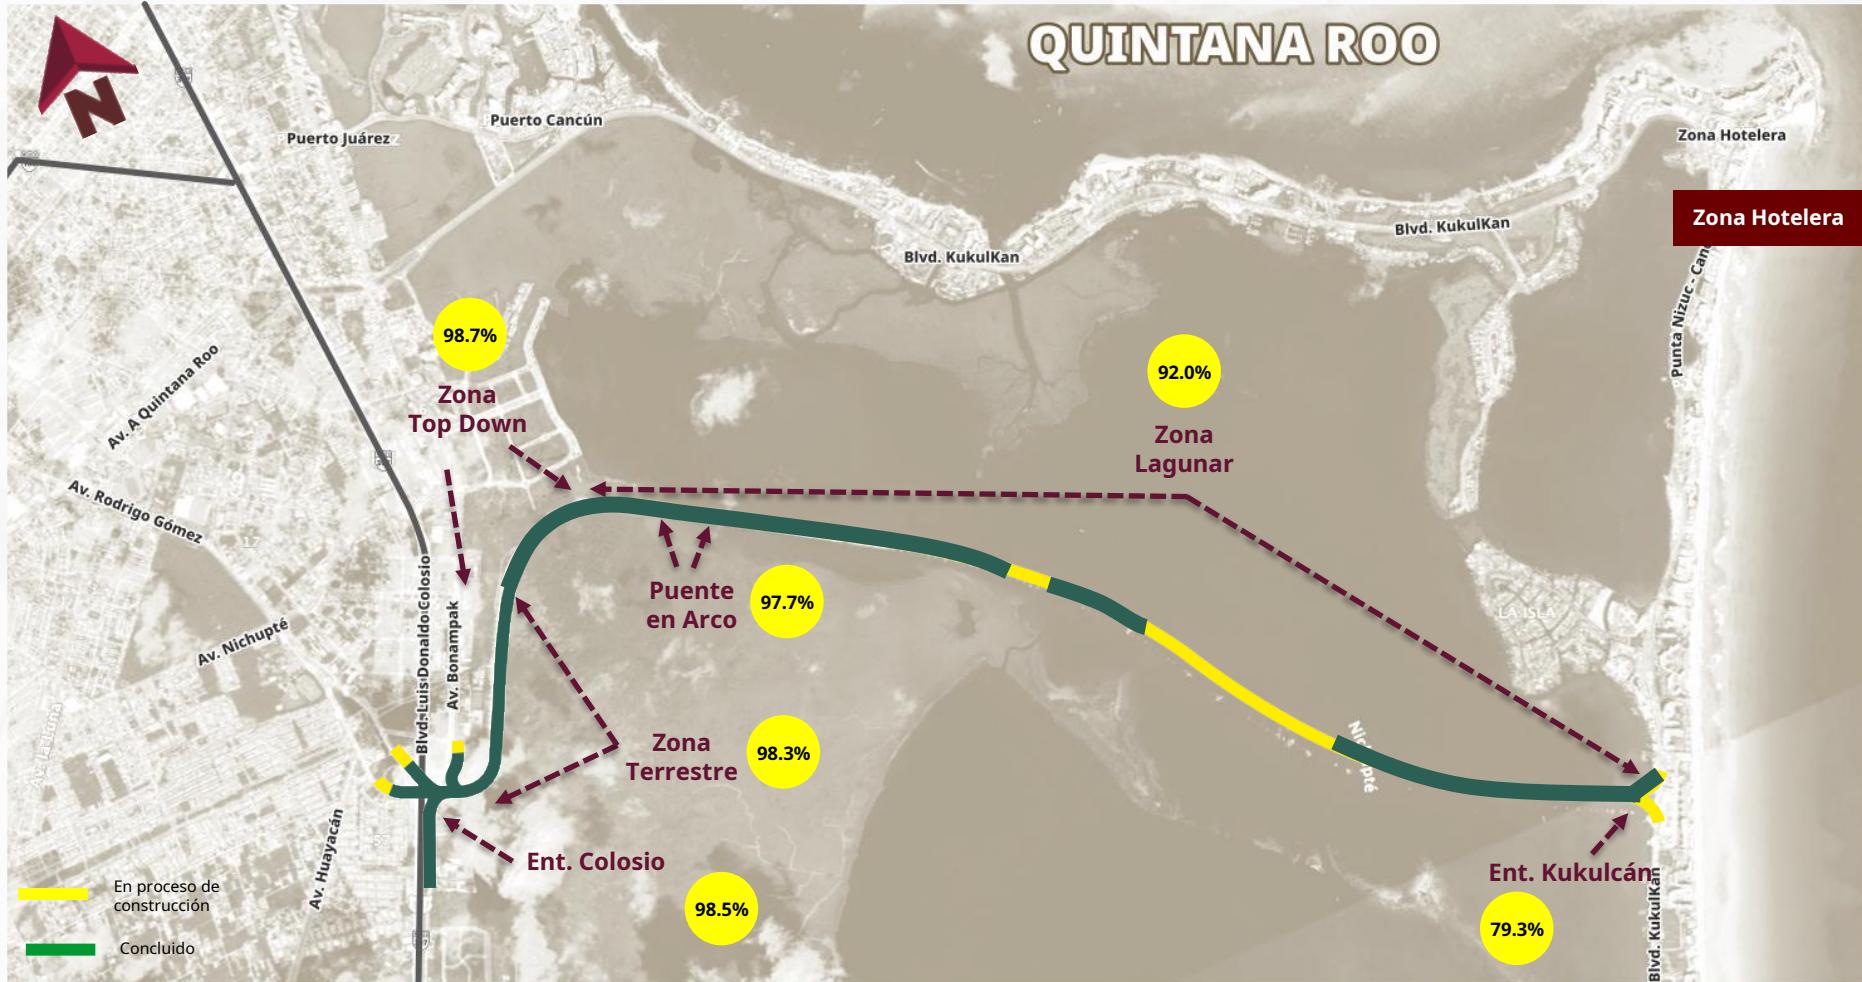

2022-2024: 6,482.6 MDP

2025: 2,939 MDP

2026: 600 MDP

Inversión total: 10, 021.6

Inicio: 01 de julio de 2022

Término: 31 enero de 2026

Meta: 11.2 km

- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)


Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 25 al 31 de diciembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	0	-	Concluido
Columnas (pza)	921	921	0	-	Concluido
Fabricación de cabezal (pza)	240	240	0	-	Concluido
Montaje de cabezal (pza)	240	238	2	0	Enero 2026
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	16	0	-	Concluido
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,658	0	-	Concluido
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,586	72	0	Enero 2026
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Fabricación de prelosas (pza)	45,024	45,024	0	-	Concluido
Montaje de prelosas (pza)	45,024	39,164	5,860	210	Enero 2026
Losa (claro)	281	241	40	1.5	Enero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	14,224.4	6,817.2	515	Enero 2026
Parapeto (m)	21,041.57	10,884.2	10,157.4	84	Enero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	748	935	175	Diciembre 2025
Pavimento viaducto (m3)	5,272	802	4,470	270	Enero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	1.5	80.5	1.5	Enero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	427	119	308	43	Enero 2026
Luminarias (pza)	427	119	308	43	Enero 2026
ITS (pza)	36	7.8	28.2	0.5	Enero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	36	95	10	Enero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	2	129	0	Enero 2026



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

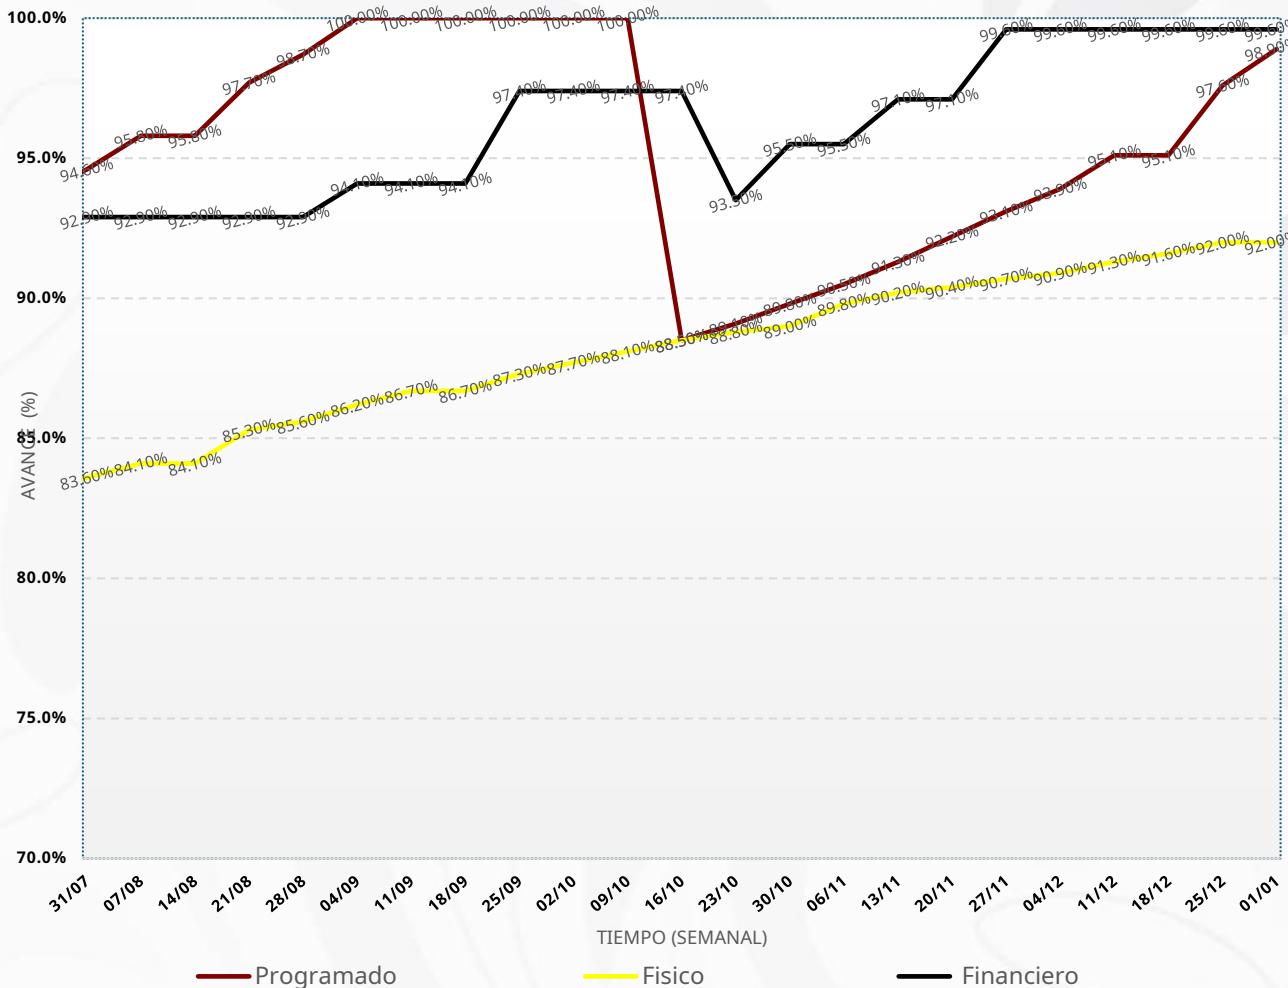

	13 al 19 de diciembre	20 al 26 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	815	556
Maquinaria	93	72
Frentes	13	13
