

# Quintana Roo


## Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance físico**
- Programado: 100.0%
  - Real: 86.2%
  - Semanal: 0.60%
  - Financiero: 94.1%

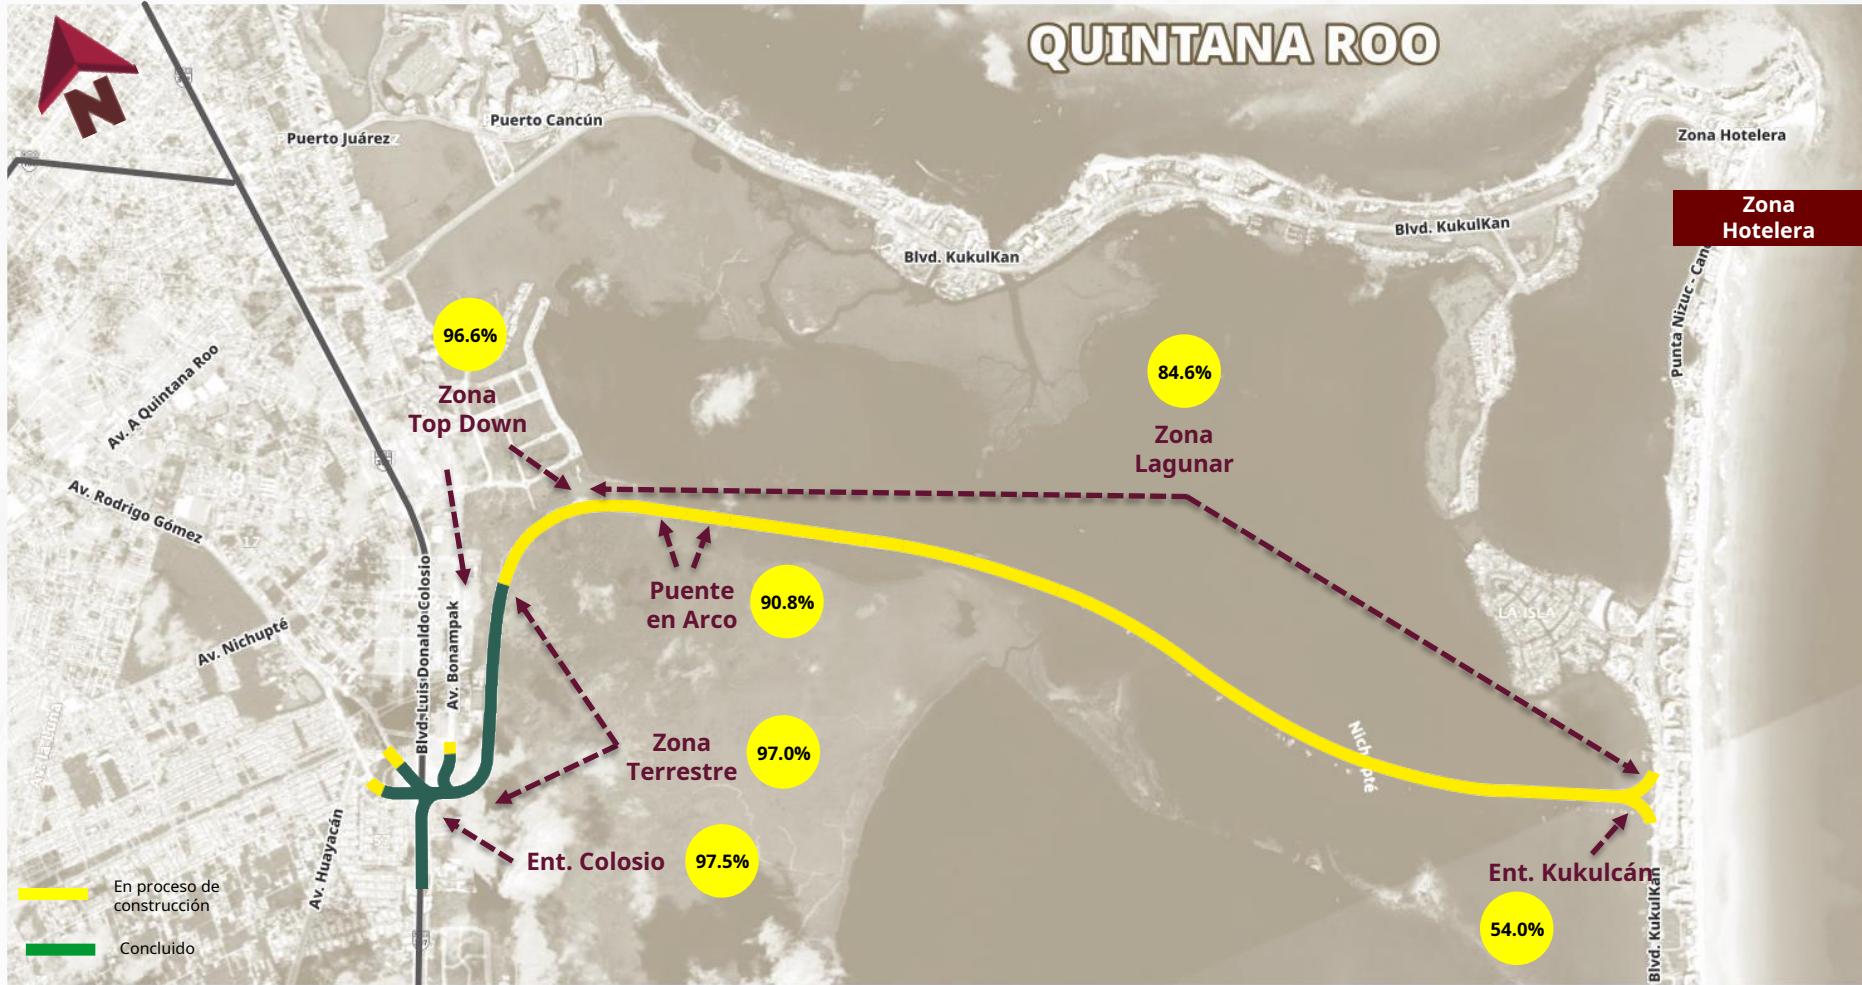

**2022-2024:** 6,486.4 MDP  
**2025:** 2,100 MDP

**Inicio:** 01 de julio de 2022  
**Término:** 20 de diciembre 2025

**Meta:** 11.2 km

- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

**Más de 51 mil empleos**  
generados  
**20 millones** de turistas

**1.32 millones** de habitantes  
beneficiados

**45 minutos** de ahorro en  
tiempo

# Quintana Roo

## Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 29 de agosto al 04 de septiembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	0	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	1	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	52	1	1	Octubre 2025
Columnas (pza)	926	861	60	6	Septiembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	228	12	1	Agosto 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	208	32	2	Octubre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	12	4	1	Agosto 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,502	156	7	Octubre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,251	407	21	Noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo tabletta (pza)	150	133	17	6	Agosto 2025
Montaje de trabes tipo tabletta (pza)	150	93	57	0	Agosto 2025
Fabricación de prelosas (pza)	44,809	33,162	11,647	384	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	24,510	20,299	400	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	182.8	98.2	4.0	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	8,200.5	12,569	140.5	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	5,542.5	15,227	733	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Diciembre 2025
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Diciembre 2025
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Diciembre 2025

### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

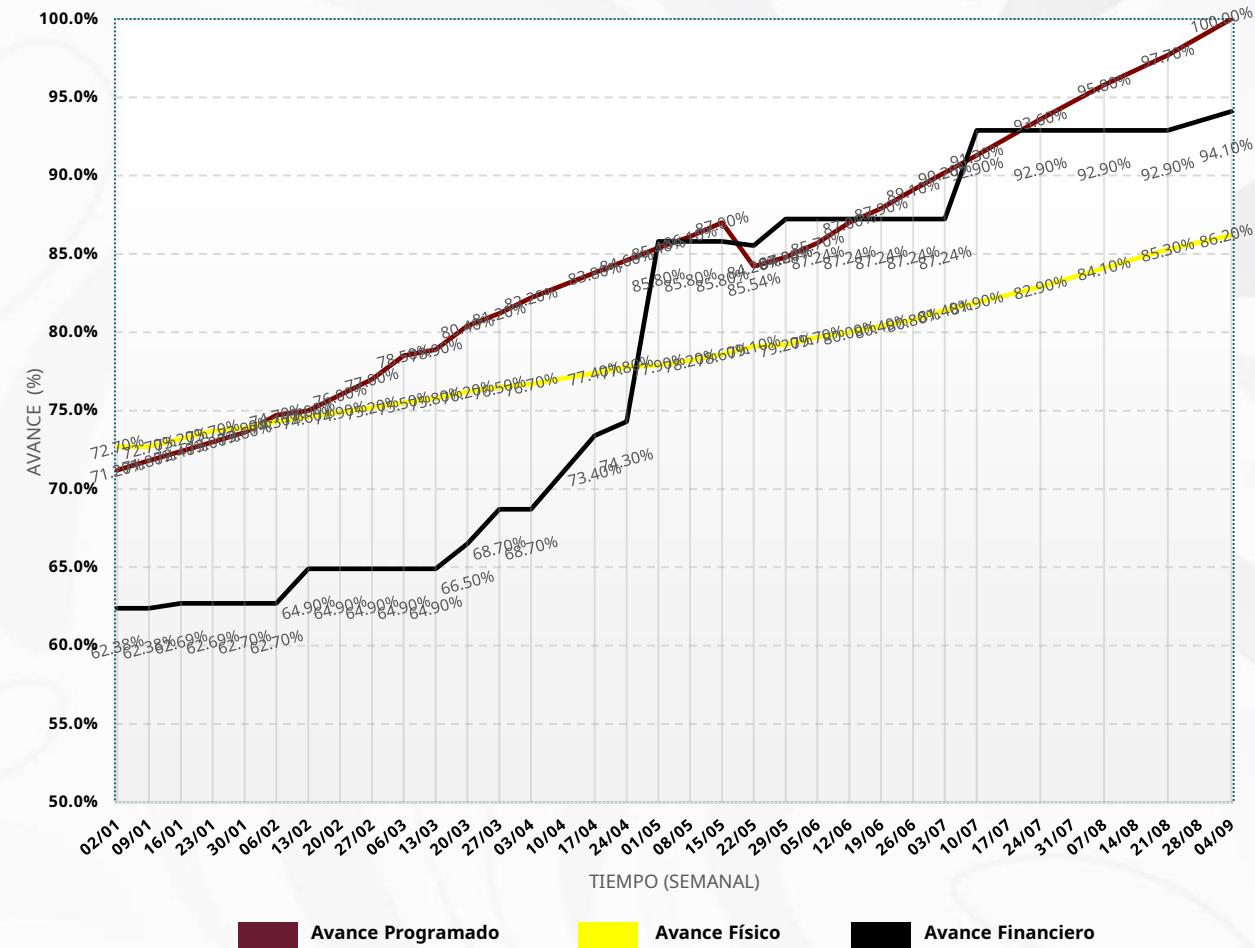

	22 al 28 de agosto	29 de agosto al 04 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	933	940
Maquinaria	109	108
