


Chiapas

Puente Rizo de Oro

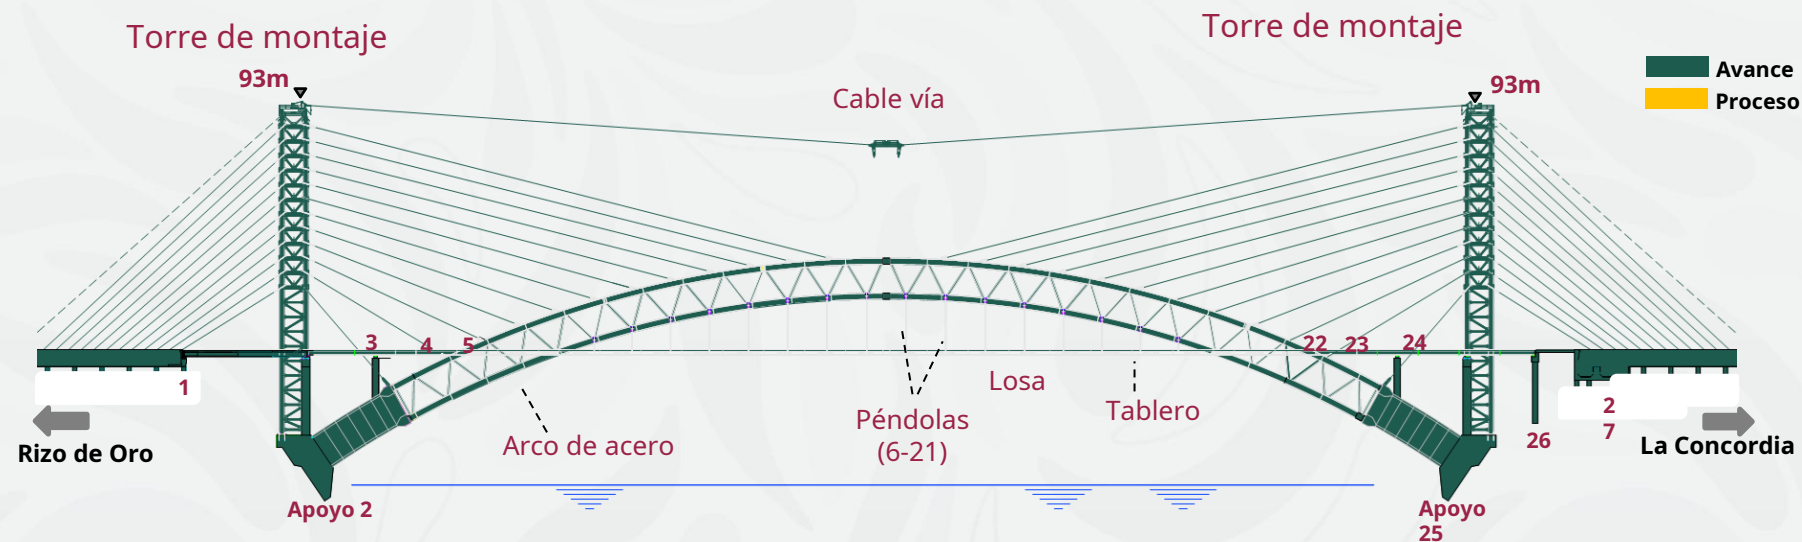

Avance físico

- Programado: 91.20%
- Real: 91.16%
- Incremento Semanal: 0.13%
- Financiero: 86.27%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	02/06/26 al 08/06/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,730.41	2,718.60	11.81	35.03	35.03
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	26.89	0.11	0.33	0.33
6-21	Péndolas	Pza.	32	0	32	Sin iniciar	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	14	23	0	0
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74	0	0
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfáltico)	m³	1,681	0	1,681	Sin iniciar	0



Inversión total: 1,810.8 mdp
2023-2025: 1,384.6 mdp
2026: 426.2 mdp



Inicio: septiembre de 2023
Término: 30 de septiembre de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
 1.7 km camino de acceso



5,715 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro



Comunicaciones


Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

ACTUALIZADA 16/06/2026

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	02/06/26 al 08/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	2,683.57	46.84	71.62	71.62	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	405	152.26	252.74	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• No se tiene Supervisión a la Fecha.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

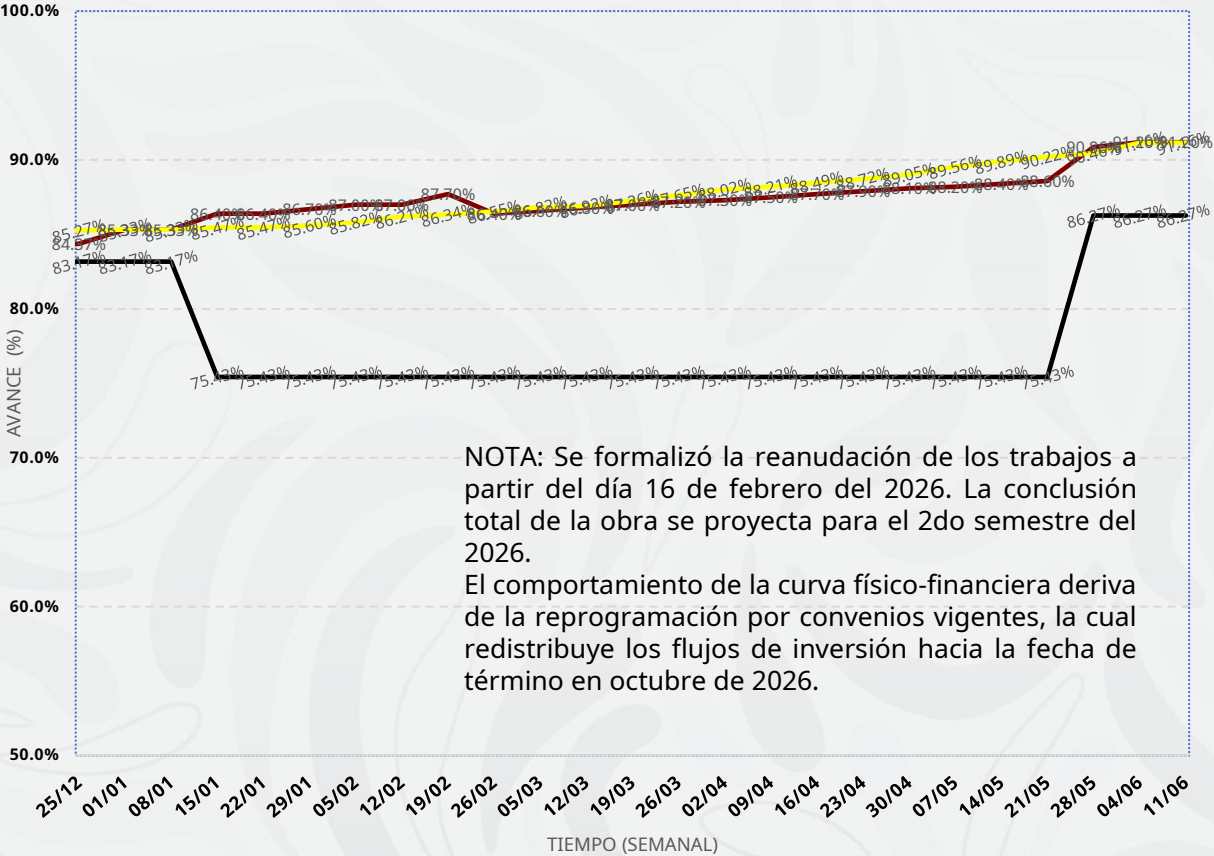

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	26/05/26 al 01/06/26	02/06/26 al 08/06/26
Fuerza de Trabajo (personas)	196	198
Maquinaria	75	75
