


Chiapas

Puente Rizo de Oro

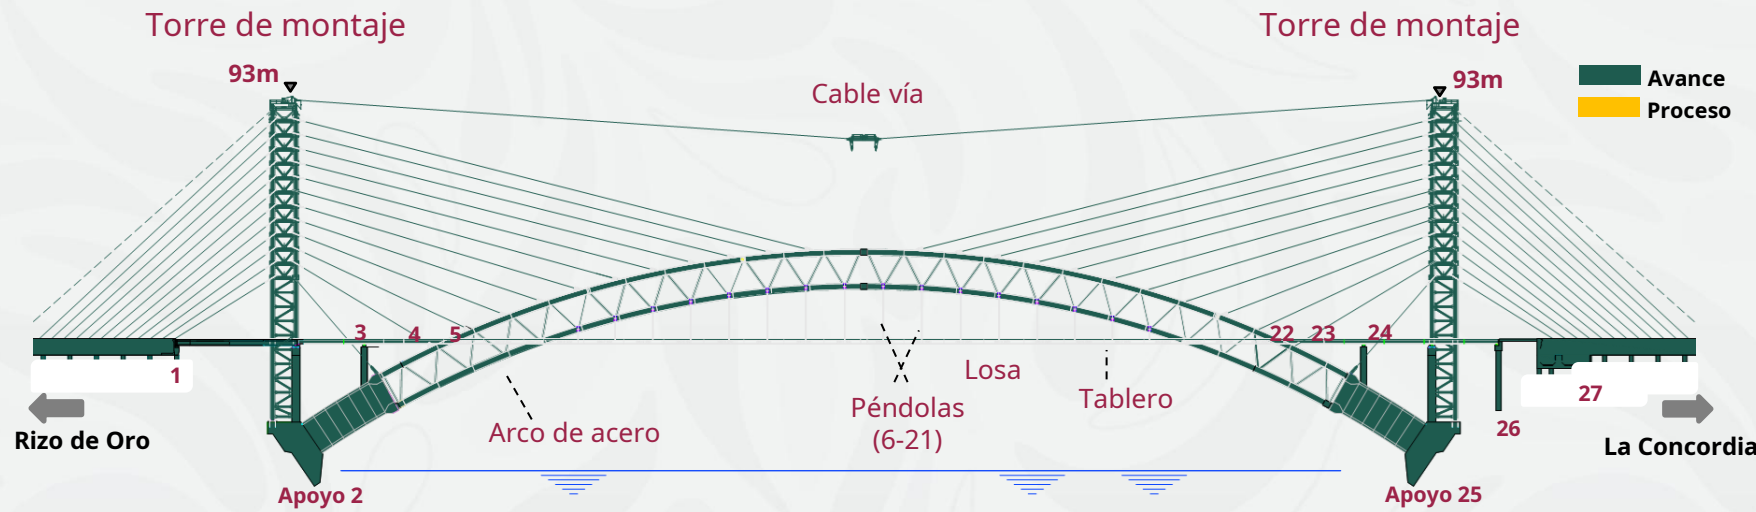

Avance físico

- Programado: 91.71%
- Real: 91.58%
- Incremento Semanal: 0.37%
- Financiero: 86.67%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	23/06/26 al 29/06/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,666.08	2,666.08	0	Concluido	-
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	27	0	Concluido	-
6-21	Péndolas	Pza.	32	0	32	Sin iniciar	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	956.63	472.83	483.80	103.08	103.08
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	18	19	4	4
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74	0	0
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfaltico)	m³	1,681	0	1,681	Sin iniciar	0



Inversión obra: 1,810.8 mdp

2023-2025: 1,384.6 mdp

2026: 426.2 mdp

Inversión obra + supervisión + ambiental + gastos de operación: 1,932 mdp

2023-2025: 1,482 mdp

2026: 450 mdp



Inicio: septiembre de 2023

Término: 30 de septiembre de 2026



Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso



5,796 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



60 min de ahorro en tiempo


Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	23/06/26 al 29/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,666.08	2,666.08	0	0	0	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	956.63	472.83	483.80	103.08	103.08	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	405	152.26	252.74	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Jesa Ingeniería S.A de C.V.

Avance: Programado Físico Financiero (%) Rizo de Oro

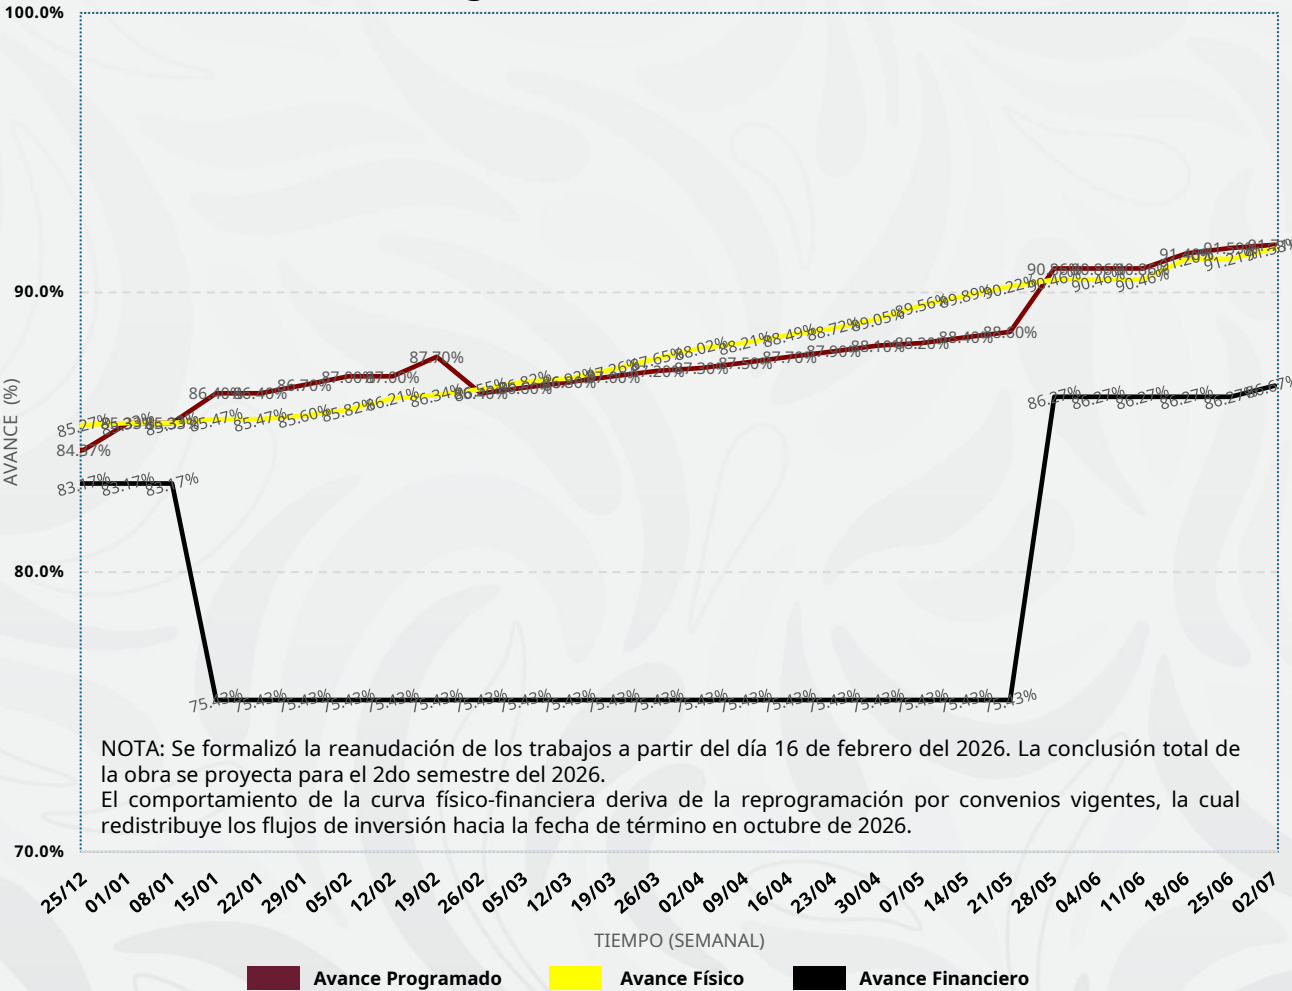

	16/06/26 al 22/06/26	23/06/26 al 29/06/26
Fuerza de Trabajo (personas)	195	199
Maquinaria	75	81
