


Chiapas

Puente Rizo de Oro

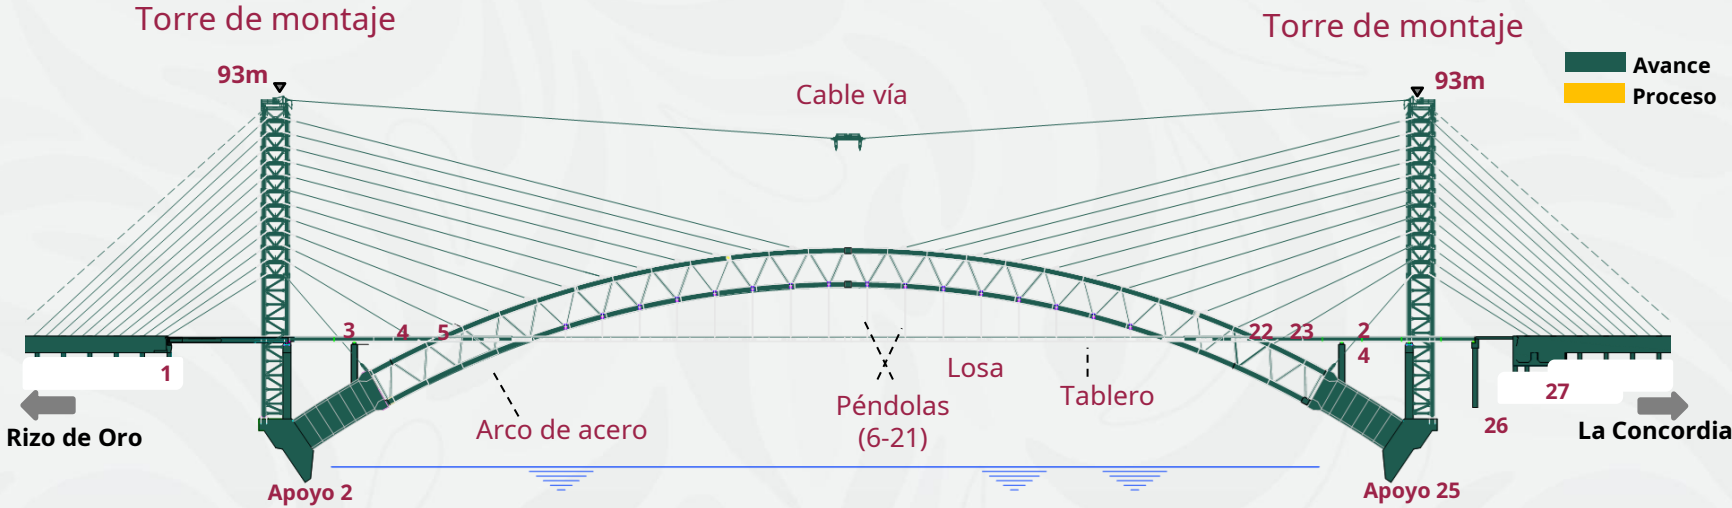

Avance físico

- Programado: 91.84%
- Real: 92.04%
- Incremento Semanal: 0.46%
- Financiero: 86.67%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	30/06/26 al 06/07/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,666.08	2,666.08	0	Concluido	-
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	27	0	Concluido	-
6-21	Péndolas	Pza.	32	4	28	4	4
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	956.63	472.83	483.80	103.08	103.08
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	18	19	4	4
1-27	Losa	ml	405	176.26	228.74	24	24
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfaltico)	m³	1,681	0	1,681	Sin iniciar	0

 **Inversión obra:** 1,810.8 mdp
2023-2025: 1,384.6 mdp
2026: 426.2 mdp
Inversión obra + supervisión + ambiental + gastos de operación: 1,932 mdp
2023-2025: 1,482 mdp
2026: 450 mdp

 **Inicio:** septiembre de 2023
Término: 30 de septiembre de 2026

 **Meta:** 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso

 **5,796** empleos generados

 **300 mil** habitantes beneficiados

 **60 min** de ahorro en tiempo

Chiapas


Puente Rizo de Oro



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30/06/26 al 06/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,666.08	2,666.08	0	0	0	Concluido
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	956.63	472.83	483.80	103.08	103.08	
Péndolas (pza.)	32	4	28	4	4	
Losa de calzada (m)	405	176.26	228.74	24	24	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Jesa Ingeniería S.A de C.V.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

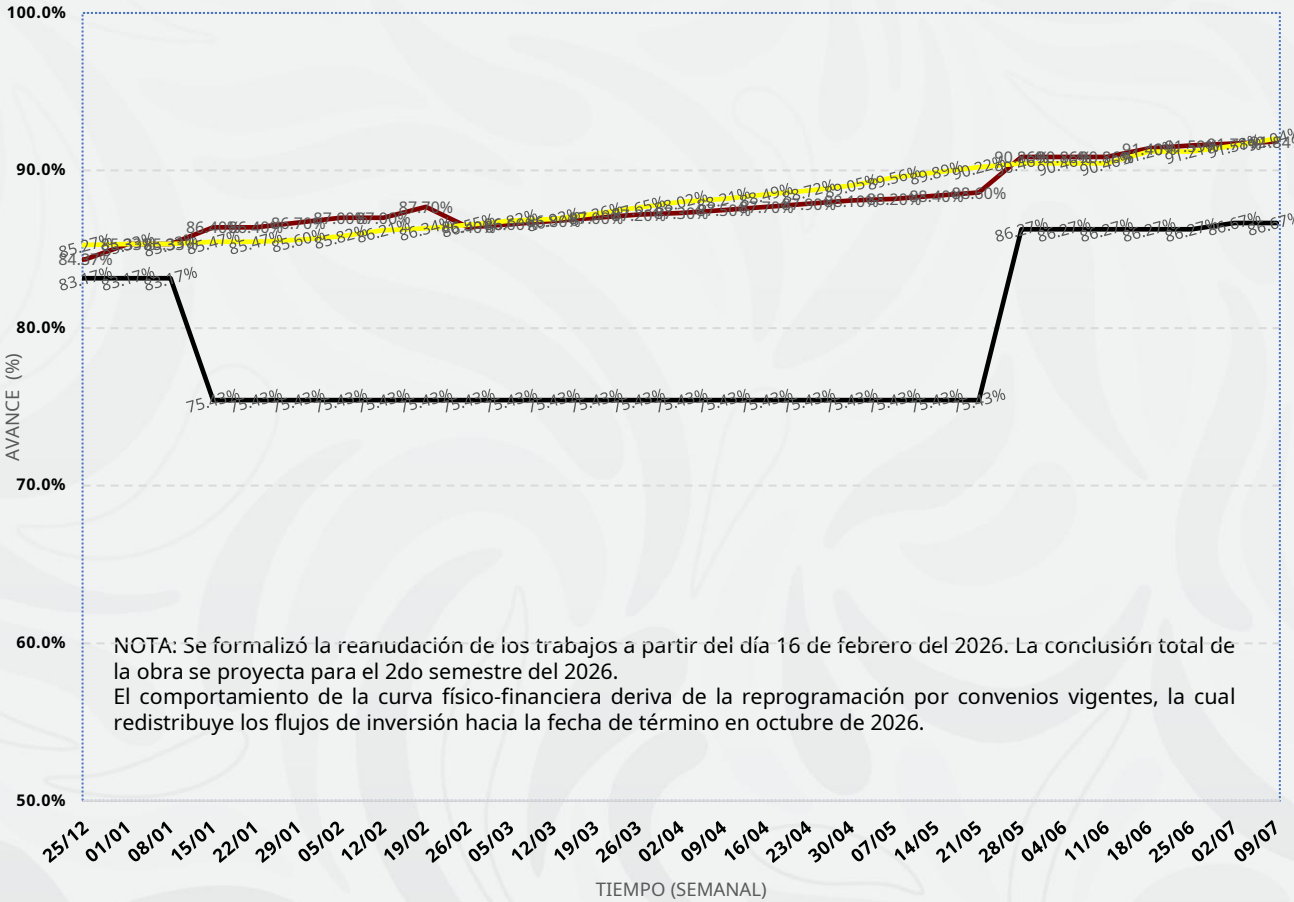

	23/06/26 al 29/06/26	30/06/26 al 06/07/26
Fuerza de Trabajo (personas)	199	199
Maquinaria	81	95
