


Chiapas

Puente Rizo de Oro

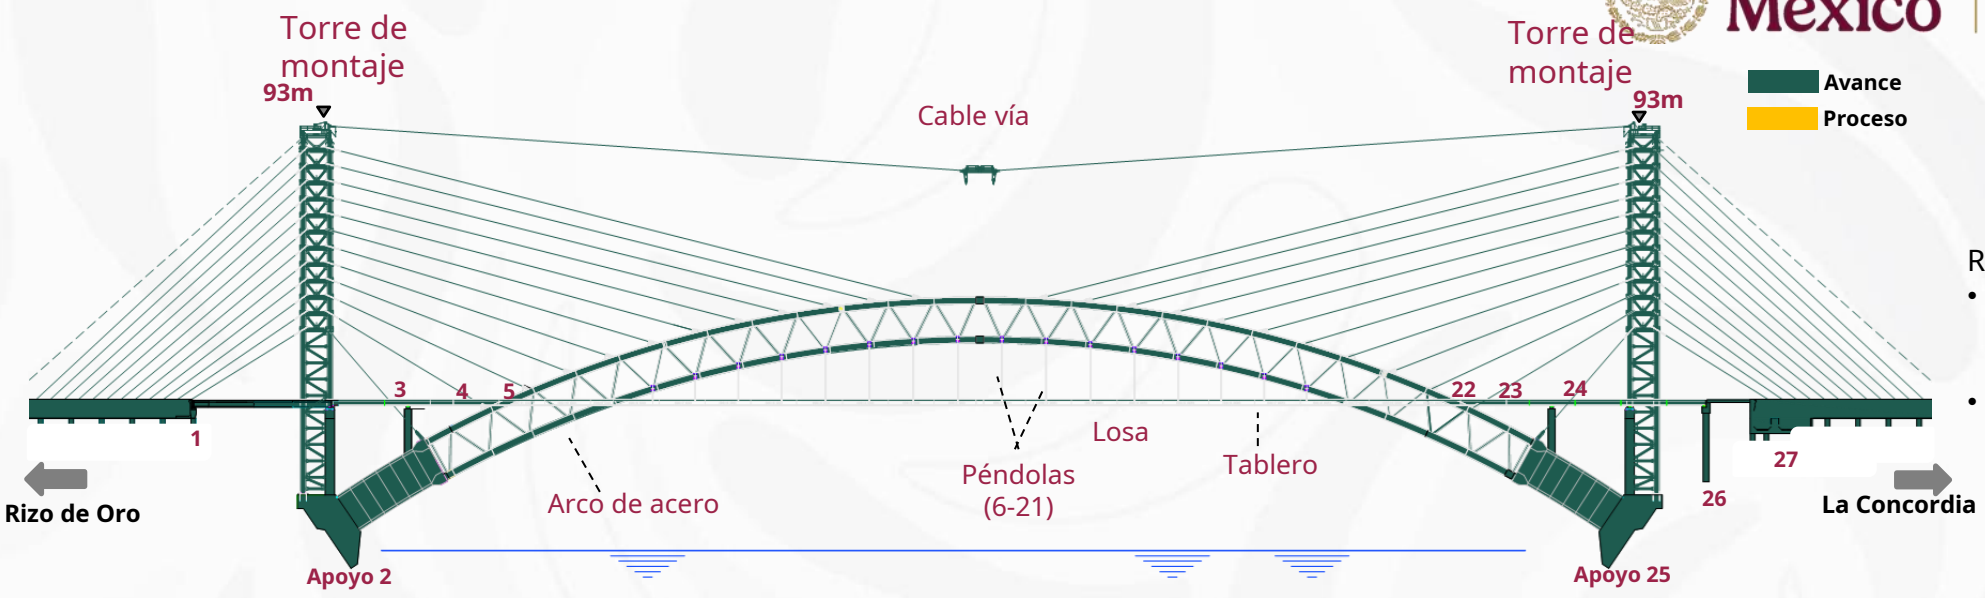

- #### Avance físico
- Programado: 91.40%
 - Real: 91.20%
 - Incremento Semanal: 0.04%
 - Financiero: 86.27%
- RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:
- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
 - Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	09/06/26 al 15/06/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,730.41	2,730.41	0	11.82	11.82
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	27	0	0.11	0.11
6-21	Péndolas	Pza.	32	0	32	Sin iniciar	
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	14	23	0	0
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74	0	0
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfáltico)	m³	1,681	0	1,681	Sin iniciar	

- Inversión total:** 1,810.8 mdp
2023-2025: 1,384.6 mdp
2026: 426.2 mdp
- Inicio:** septiembre de 2023
Término: 30 de septiembre de 2026
- Meta:** 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso
- 5,715** empleos generados
- 300 mil** habitantes beneficiados
- 60 min** de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

ACTUALIZADA 22/06/2026

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/06/26 al 15/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	2,730.41	0	11.82	11.82	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	405	152.26	252.74	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m³)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m²)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

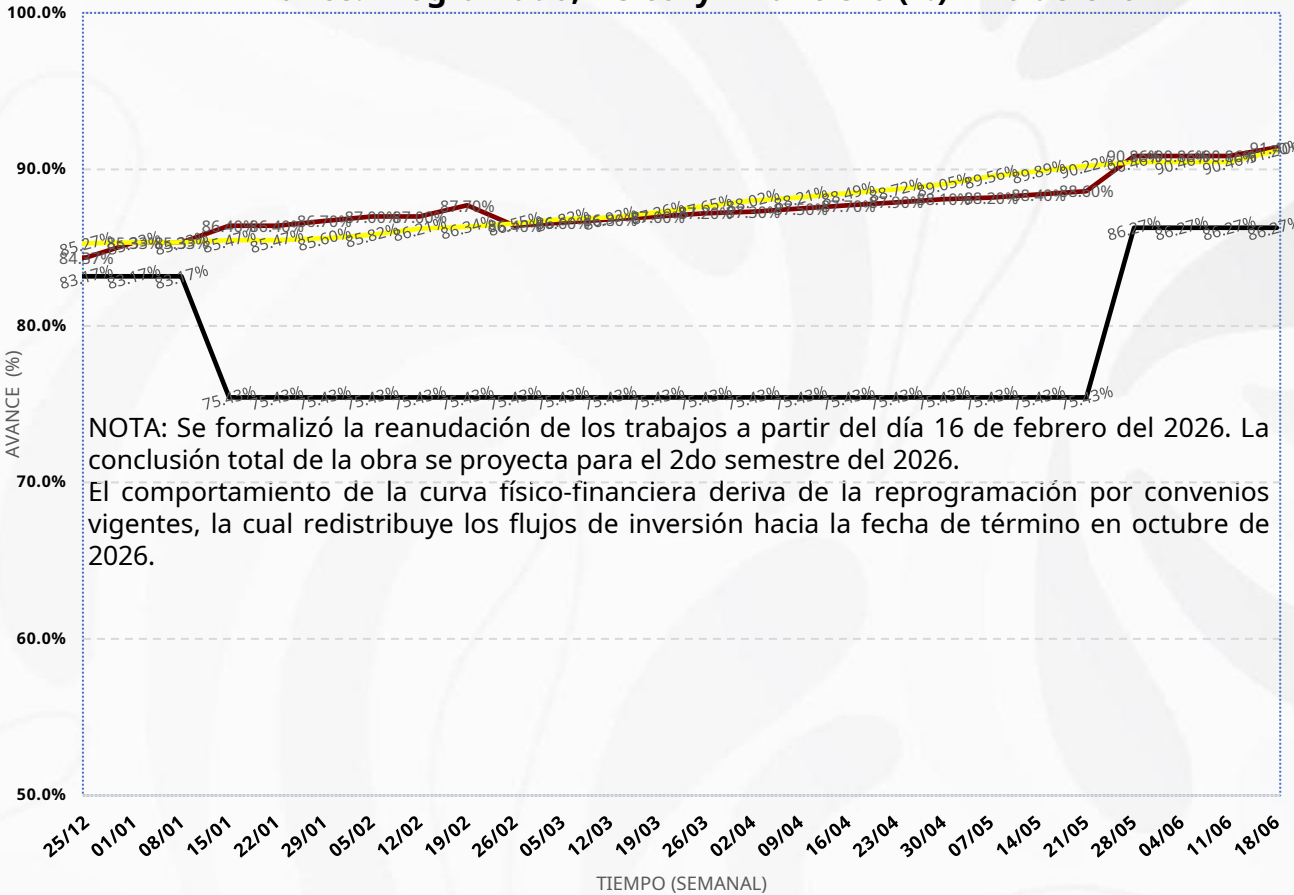

Empresas	
• Contratista: COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• Jesa Ingeniería S.A de C.V.

	02/06/26 al 08/06/26	09/06/26 al 15/06/26
Fuerza de Trabajo (personas)	198	198
Maquinaria	75	75
