


# Chiapas

## Puente Rizo de Oro

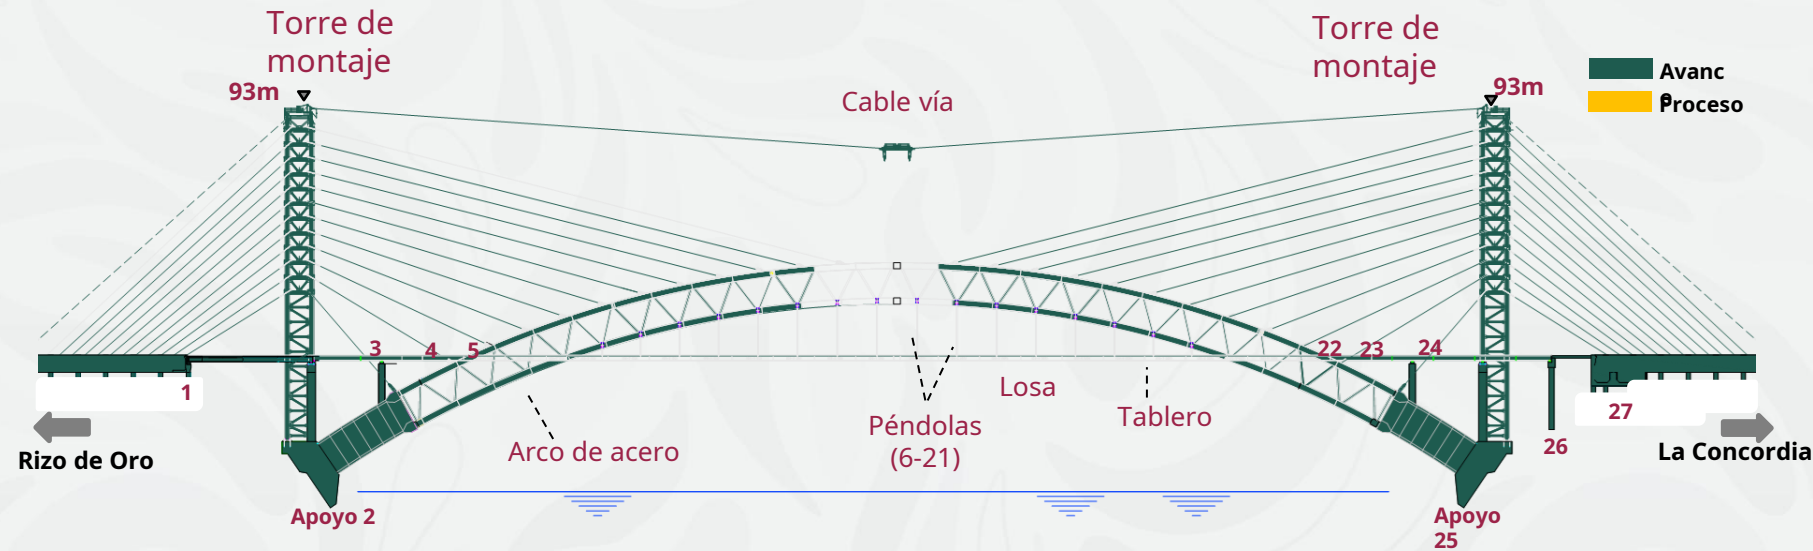

### Avance físico

- Programado: 88.20%
- Real: 89.56%
- Incremento Semanal: 0.51%
- Financiero: 75.43%

### RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

| Eje       | Elemento                             | Unidad | Meta     | Ejecutado acumulado | Faltante | 28/04/26 al 04/05/26 |           |
|-----------|--------------------------------------|--------|----------|---------------------|----------|----------------------|-----------|
|           |                                      |        |          |                     |          | Programado           | Ejecutado |
| 3-24      | Montaje de Dovela de arco            | Ton    | 2,730.41 | 2,355               | 375.41   | 141.27               | 141.27    |
| 3-24      | Montaje de Dovela de arco            | Pza.   | 27       | 22.47               | 4.3      | 1.37                 | 1.37      |
| 6-21      | Péndolas                             | Pza.   | 32       | 0                   | 32       | Sin iniciar          | 0         |
| 1-26      | Montaje de Dovela de Superestructura | Ton.   | 946.70   | 367.74              | 578.96   | 0                    | 0         |
| 1-26      | Montaje de Dovela de Superestructura | Pza.   | 37       | 14                  | 23       | 0                    | 0         |
| 1-27      | Losa                                 | ml     | 405      | 152.26              | 252.74   | 0                    | 0         |
| 1-27      | Guarnición                           | ml     | 990.96   | 390.51              | 600.45   | 0                    | 0         |
| 1-27      | Parapeto                             | ml     | 982.96   | 0                   | 982.96   | Sin iniciar          | 0         |
| 1,2,26,27 | Juntas de calzada                    | Pza.   | 4        | 0                   | 1        | Sin iniciar          | 0         |
|           | Pavimento (Concreto Asfáltico)       | m³     | 1,681    | 0                   | 1,681    | Sin iniciar          | 0         |

 **Inversión total:** 1,810.8 mdp  
**2023-2025:** 1,384.6 mdp  
**2026:** 426.2 mdp

 **Inicio:** septiembre de 2023  
**Término:** 15 de octubre de 2026

 **Meta:** 1 Puente (405 m)  
1.7 km camino de acceso

 **5,715** empleos generados

 **300 mil** habitantes beneficiados


 **60 min** de ahorro en tiempo

# Chiapas

## Puente Rizo de Oro

| Elemento                                    | Meta     | Ejecutado acumulable | Faltante | 28/04/26 al 04/05/26 |           | Observaciones |
|---------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                             |          |                      |          | Programado           | Ejecutado |               |
| Montaje de Dovelas de Arco (ton)            | 2,730.41 | 2,355                | 375.41   | 141.27               | 141.27    |               |
| Montaje de Dovelas de Superestructura (ton) | 946.70   | 367.74               | 578.96   | 0                    | 0         |               |
| Péndolas (pza.)                             | 16       | 0                    | 16       | 0                    | 0         | Sin iniciar   |
| Losa de calzada (m)                         | 404      | 152.26               | 251.44   | 0                    | 0         |               |
| Guarnición (m)                              | 990.96   | 390.51               | 600.45   | 0                    | 0         |               |
| Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)         | 72,614   | 69,753               | 2,861    | --                   | --        |               |
| Base Hidráulica (m³)                        | 4,537    | 3,592                | 945      | --                   | --        |               |
| Carpeta Asfáltica (m²)                      | 1,681    | 0                    | 1,681    | --                   | --        | Sin iniciar   |

| Empresas                                           |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| • <b>Contratista:</b><br>COCONAL, S.A.P.I. DE C.V. | • Sin Supervisión |

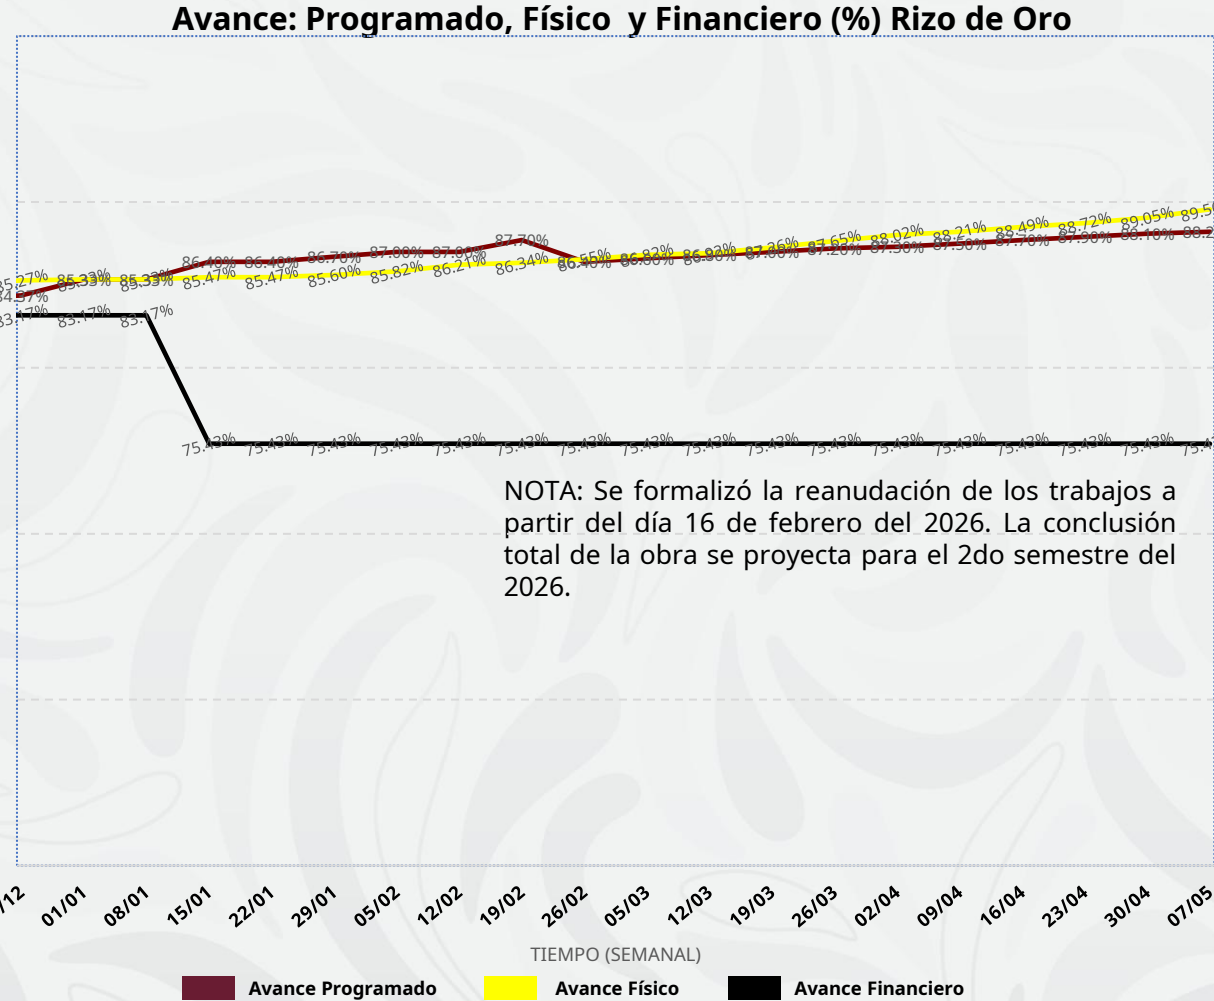

|                              | 21/04/26 al 27/04/26 | 28/04/26 al 04/05/26 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 208                  | 215                  |
| Maquinaria                   | 75                   | 75                   |
