

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 92.2%
- Real: 90.4%
- (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.20%
- Financiero: 97.1%

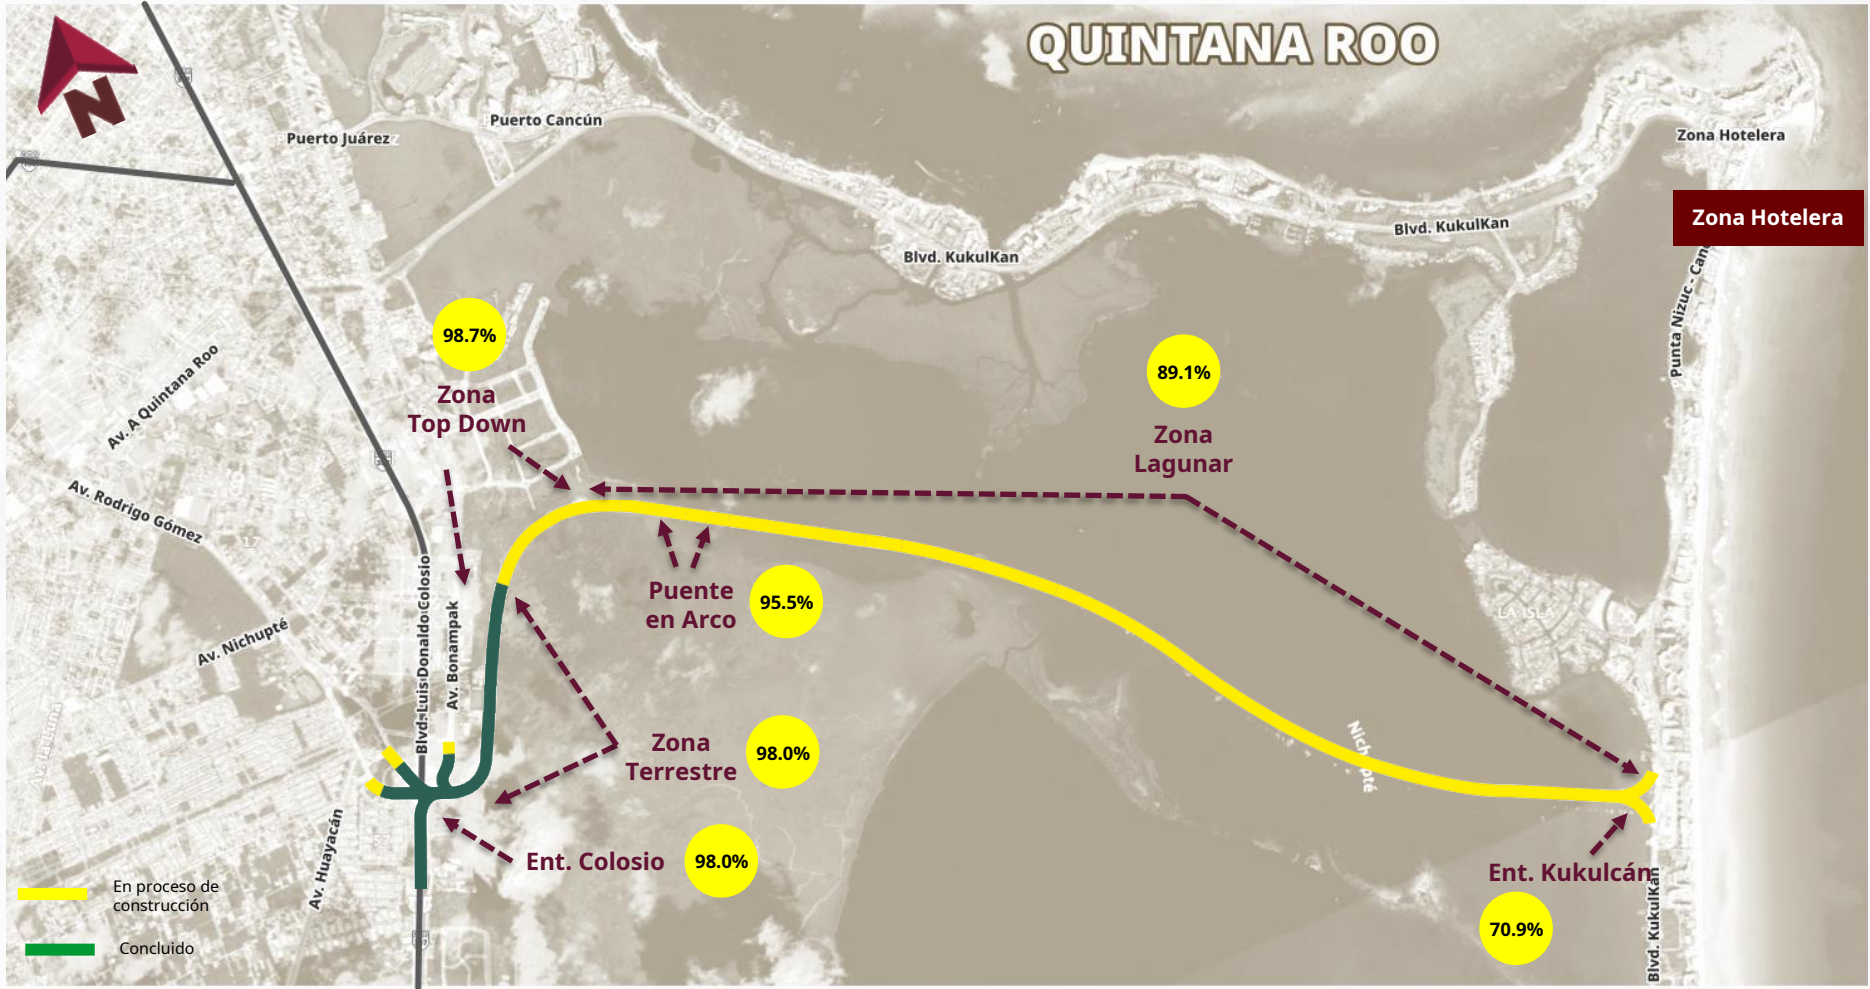

- 2022-2024:** 6,482.6 MDP
2025: 2,519.3 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022
Término: 31 de diciembre de 2025
- Meta:** 11.2 km
 - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
 - 2.4 km entronques (2)
 - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil** empleos generados
20 millones de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 13 al 19 de noviembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	0	-	Concluido
Columnas (pza)	926	915.6	7.4	1	noviembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	238	2	1	noviembre 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	229	11	1.7	noviembre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulkán)	16	15	1	0	noviembre 2025
Fabricación de traves tipo Aastho (pza)	1,658	1,636	22	16	noviembre 2025
Montaje de traves Aastho (pza)	1,658	1,539	119	14	diciembre 2025
Fabricación de traves tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de traves tipo tableta (pza)	150	134	16	0	Noviembre 2025
Fabricación de prelosas (pza)	44,809	40,562	4,247	672	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	33,947	10,862	287	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	214.5	66.5	3.0	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	11,181.4	9,588.2	176	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	9,724	11,045.5	217	Diciembre 2025
Pavimento (m3)	6,556.9	0	6,556.9	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Enero 2026
Alumbrados (km)	10.5	0	10.5	0	Enero 2026
ITS (km)	10.5	0	10.5	0	Enero 2026
Drenaje (pza)	117	0	117	0	Enero 2026

