

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 93.1%
- Real: 90.7%
- Semanal: 0.30%
- Financiero: 99.6%
- (REPROGRAMACION)

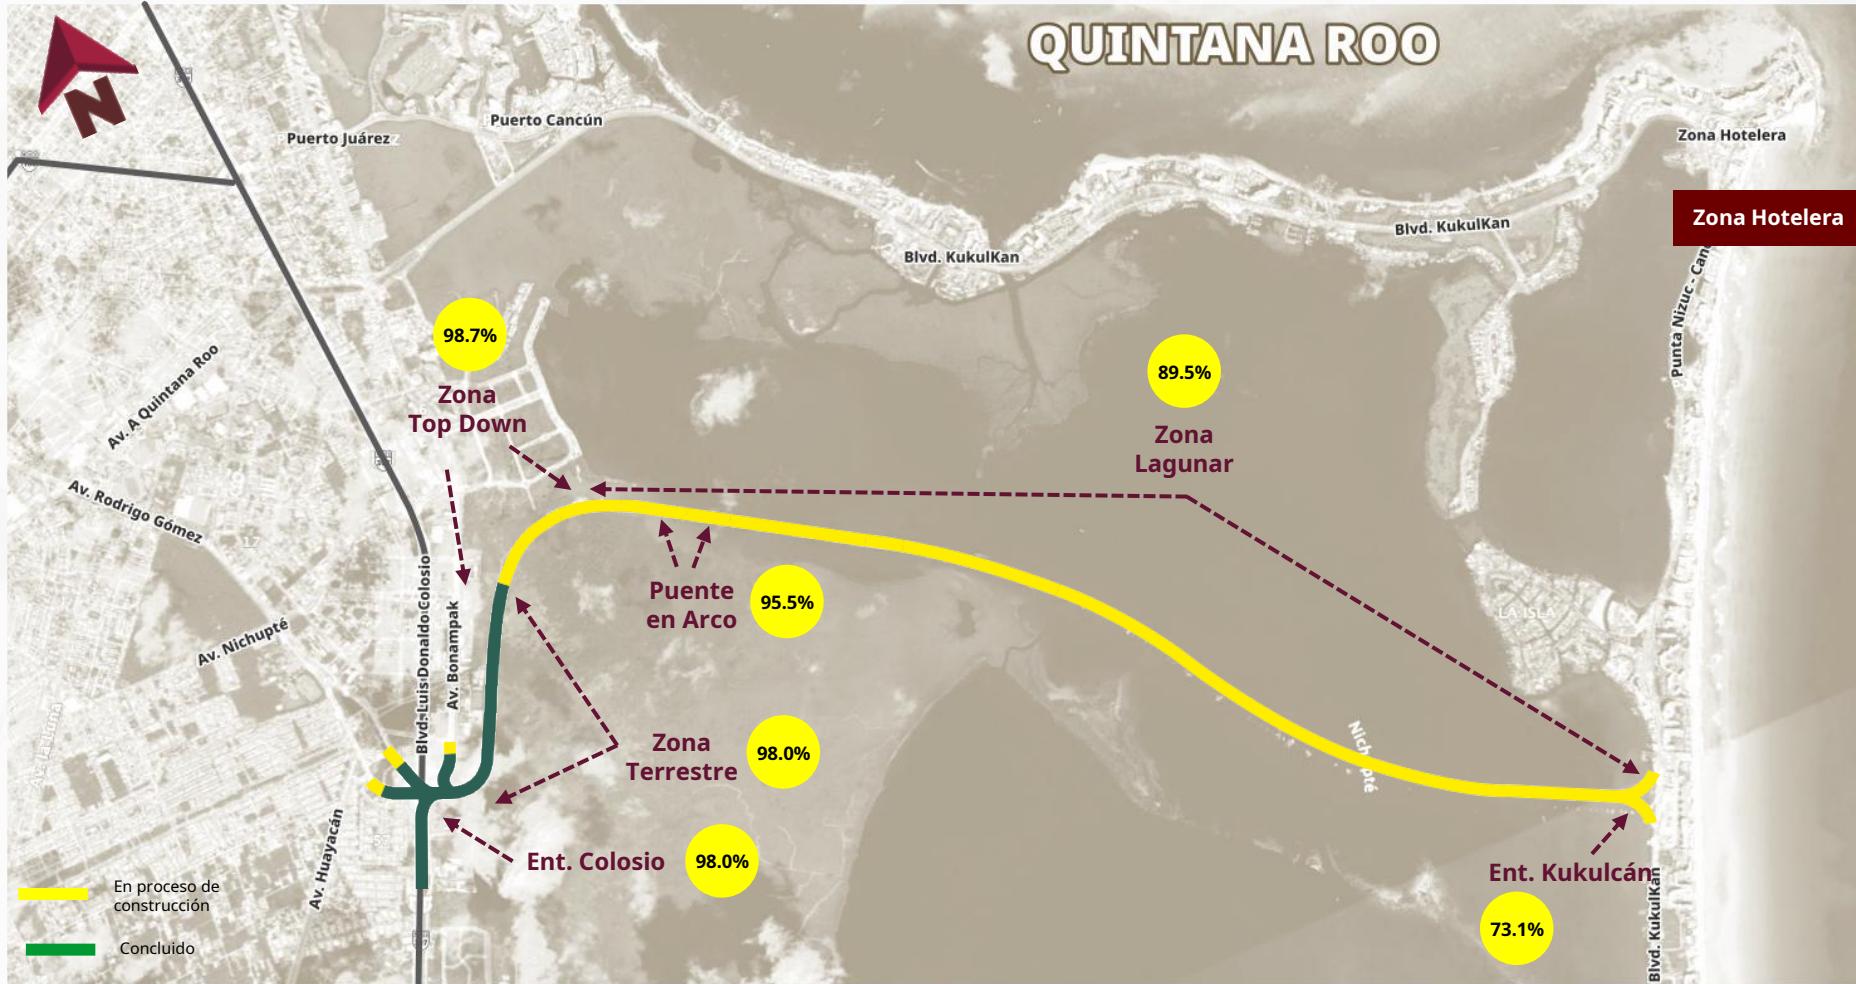

2022-2024: 6,482.6 MDP
2025: 2,519.3 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 30 de diciembre de 2025

Meta: 11.2 km

- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 20 al 26 de noviembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	0	-	Concluido
Columnas (pza)	921	918	3	2	noviembre 2025
Fabricación de cabezal (pza)	240	239	1	1	noviembre 2025
Montaje de cabezal (pza)	240	231	9	2.3	noviembre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	15	1	0	noviembre 2025
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,649	9	13	noviembre 2025
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,546	112	7	diciembre 2025
Fabricación de trabes tipo tabletta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de trabes tipo tabletta (pza)	150	142	8	8	Noviembre 2025
Fabricación de prelosas (pza)	44,809	40,906	3,903	344	Noviembre 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	34,559	10,250	612	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	219.5	61.5	5.5	Diciembre 2025
Guarnición (m)	20,769.5	11,350.4	9,419.2	169	Diciembre 2025
Parapeto (m)	20,769.5	9,866.2	10,903.3	142.2	Diciembre 2025
Pavimento entronques (m3)	1,683	63	1,620	63	Diciembre 2025
Pavimento viaducto (m3)	5,000	0	5,000	0	Diciembre 2025
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Enero 2026
Alumbrados (pza)	440	0	440	0	Enero 2026
ITS (pza)	28	4.8	23.2	4.8	Enero 2026
Drenaje (pza)	117	2	115	2	Enero 2026

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

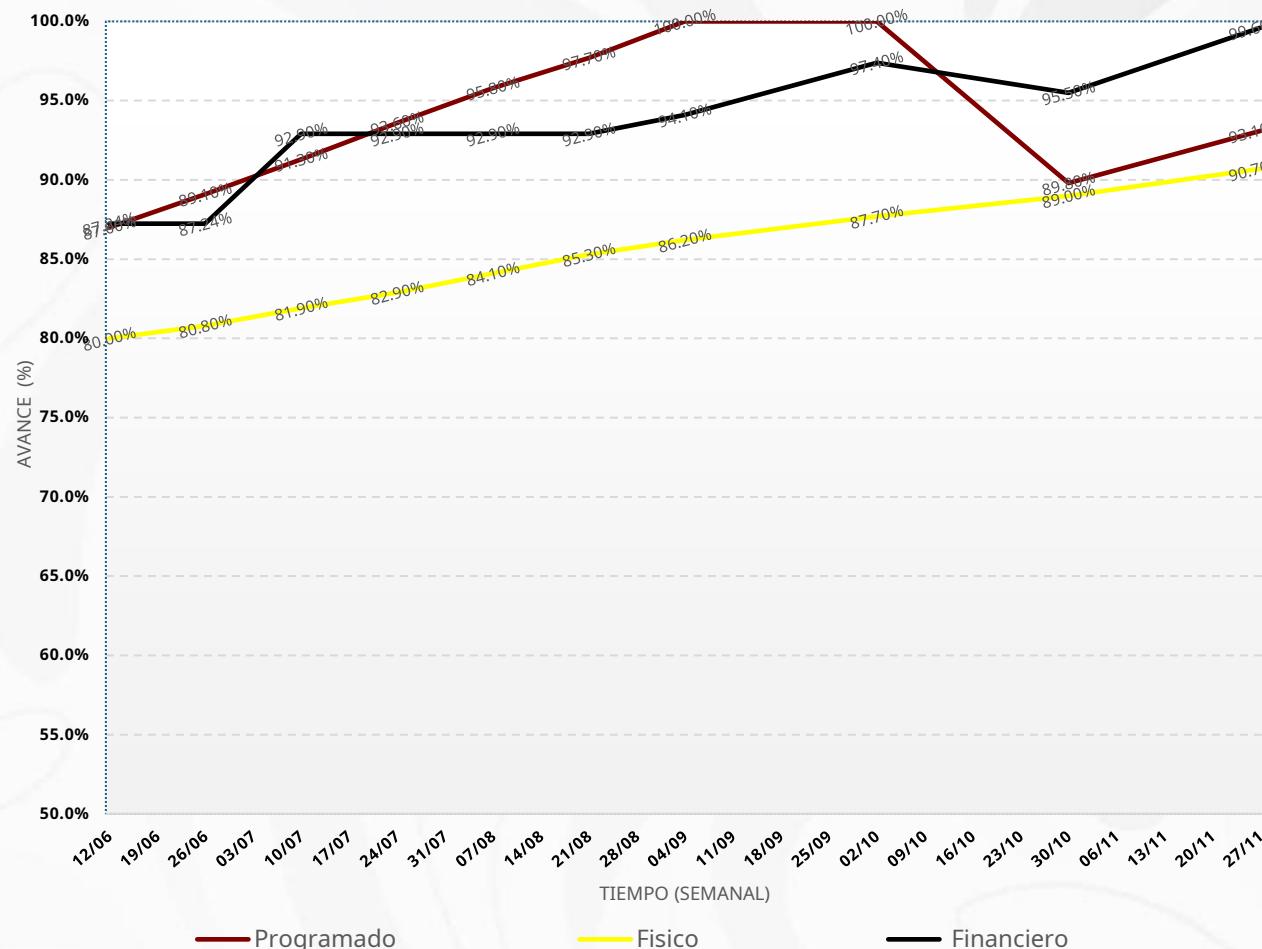

	14 al 20 de noviembre	21 al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	776	770
Maquinaria	89	87
