

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 97.6%
- Real: 92.0%
- (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 99.6%

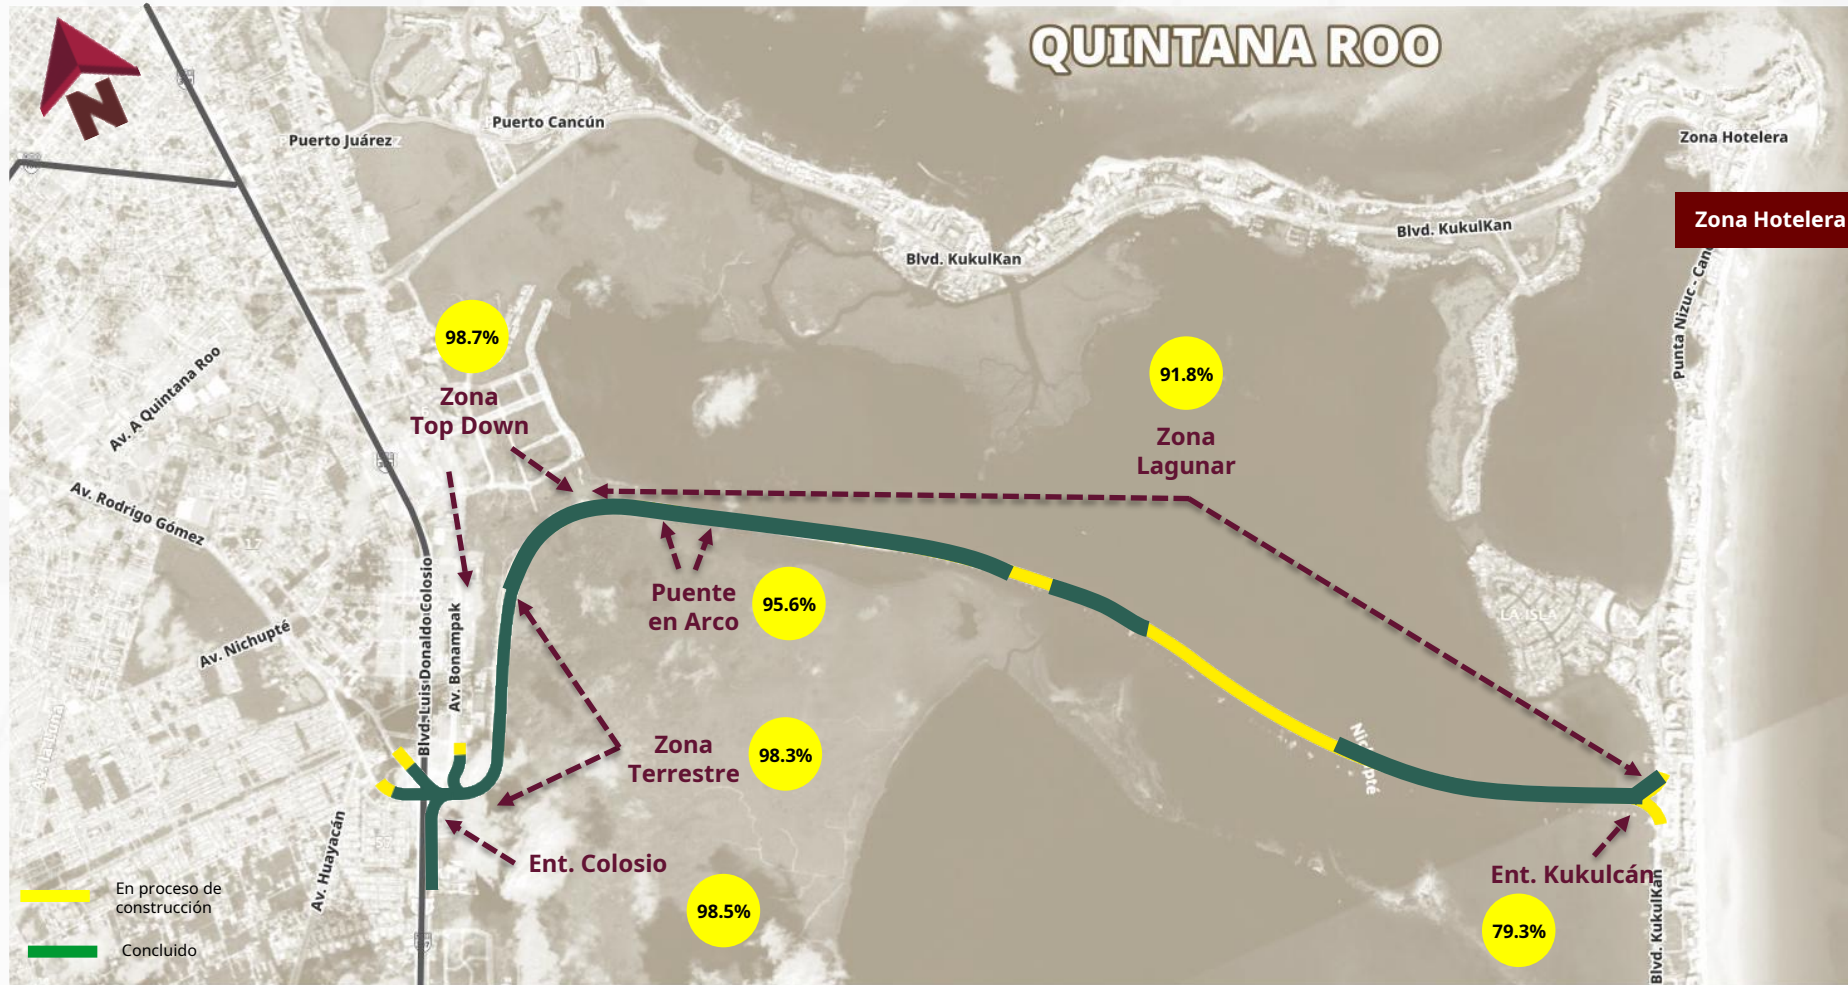

2022-2024: 6,482.6 MDP
2025: 2,939 MDP
2026: 600 MDP



Inversión total: 10, 021.6

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 enero de 2026



Meta: 11.2 km
• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
• 2.4 km entronques (2)
• Puente en Arco Metálico (1) 103 m



Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas



1.32 millones de habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 18 al 24 de diciembre 2025	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación (pza)	1,311	1,311	0	-	Concluido
Pilas apoyo 177	10	10	0	-	Concluido
Trabe de liga (pza)	53	53	0	-	Concluido
Columnas (pza)	921	921	0	-	Concluido
Fabricación de cabezal (pza)	240	240	0	-	Concluido
Montaje de cabezal (pza)	240	238	2	1.5	diciembre 2025
Cabezales colados en sitio (E. Kukulcán)	16	16	0	-	Concluido
Fabricación de trabes tipo Aastho (pza)	1,658	1,658	0	-	Concluido
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,586	72	16	diciembre 2025
Fabricación de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Montaje de trabes tipo tableta (pza)	150	150	0	-	Concluido
Fabricación de prelosas (pza)	45,024	45,024	0	618	Concluido
Montaje de prelosas (pza)	45,024	38,954	6,070	630	Diciembre 2025
Losa (claro)	281	239.5	41.5	6.5	Enero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	13,709.4	7,332.2	887	Enero 2026
Parapeto (m)	21,041.57	10,800.2	10,241.4	570	Enero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	573	1,110	0	Diciembre 2025
Pavimento viaducto (m3)	5,272	532	4,740	445	Enero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	0	82.0	0	Enero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	427	76	351	11	Enero 2026
Luminarias (pza)	427	76	351	39	Enero 2026
ITS (pza)	36	7.3	28.7	2.5	Enero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	26	105	8	Enero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	2	129	0	Enero 2026

