


Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

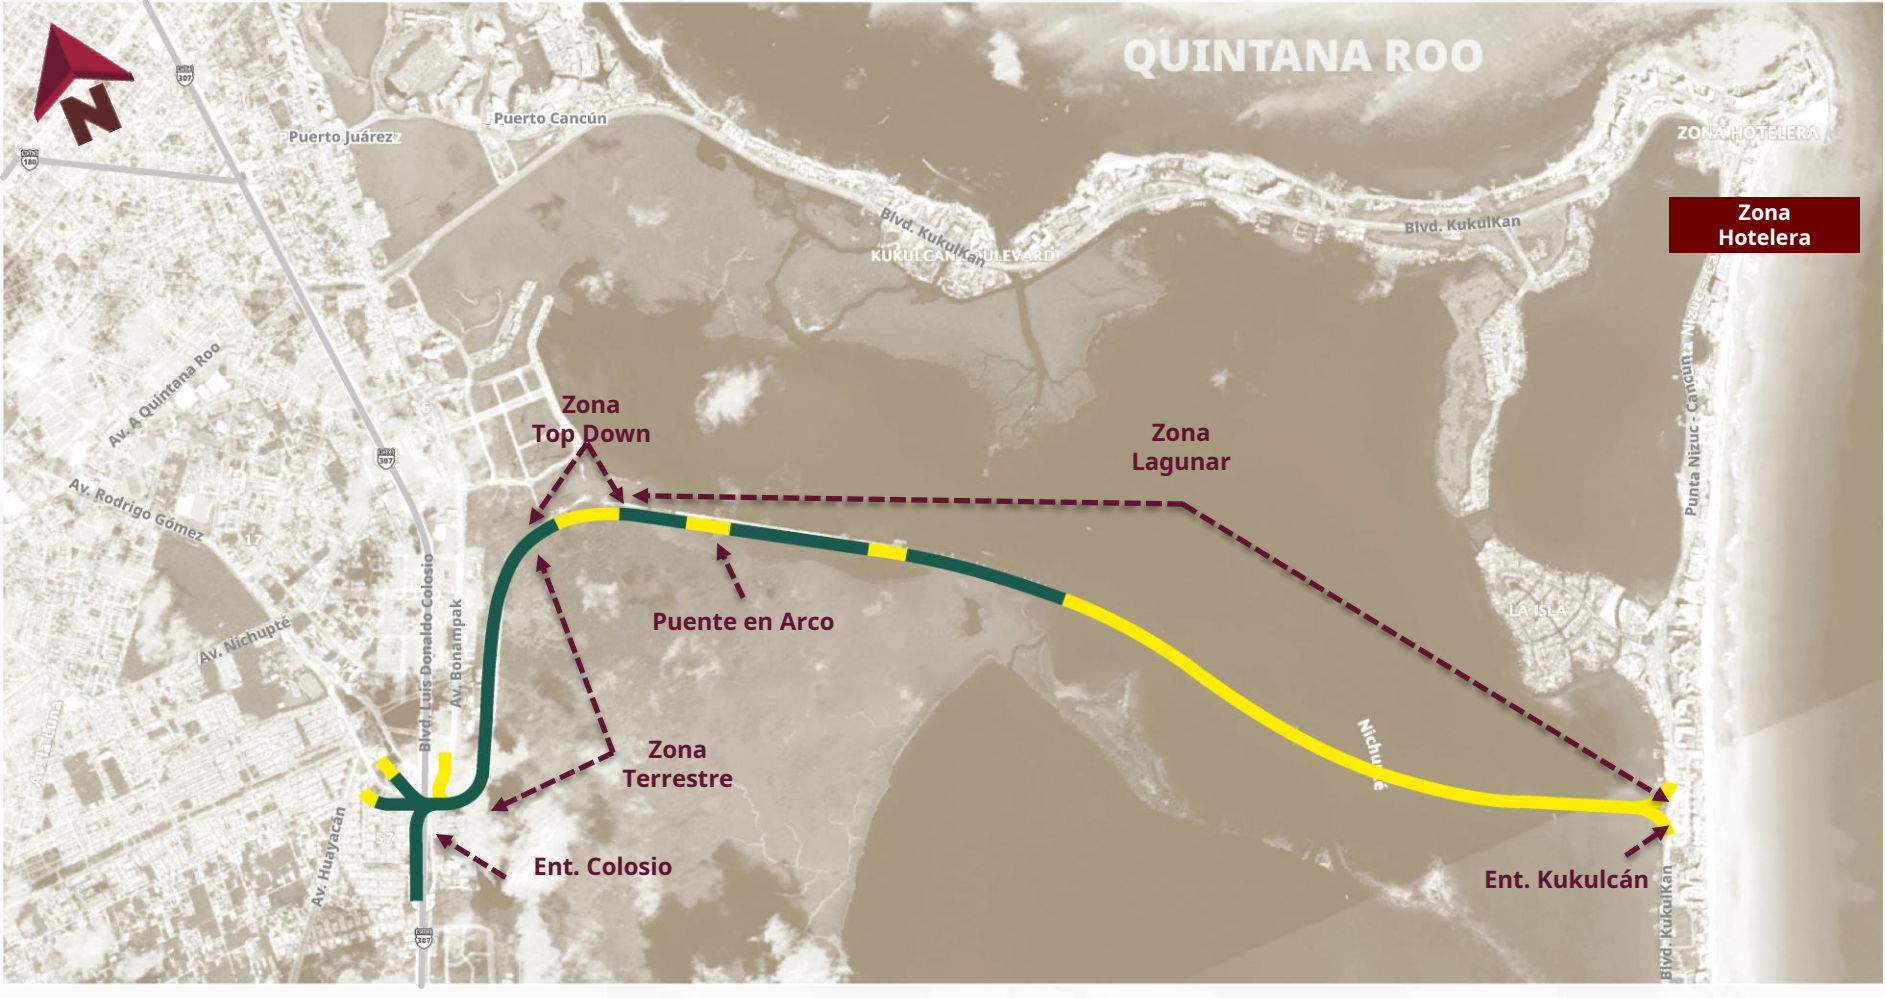

Simbología	
	En proceso de construcción
	Concluido

Quintana Roo

Puente Vehicular

Nichupté



Inversión total: 9,986.4
2022-2024: 6,486.4 MDP
2025: 3,500 MDP



Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 de agosto de 2025



Meta: 11.2 km
• 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
• 2.4 km entronques (2)
• Puente en Arco Metálico (1) 103 m



Avance físico:
• Programado: 82.9%
• Real: 77%
• Financiero: 73.4%



Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas



1.32 millones de habitantes
beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	04/04/25 al 09/04/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Pilas de cimentación (pza)	1,300	1,276	24	24	5	
Columnas (pza)	934	699	235	58.5	4	Se cuenta con 2 frentes en cimentación, 3 en subestructura y 3 en superestructura.
Fabricación de cabezal (pza)	252	194	58	7	2	
Montaje de cabezal (pza)	252	150	102	11	0	
Fabricación de trabes (pza)	1,807	1,260	547	32	9	Se le solicitó a la constructora aumentar sus rendimientos para perforación y colado de pilas, colado de columnas, fabricación y montaje de trabes.
Montaje de trabes (pza)	1,807	880	927	56	5	Programa correspondiente a la semana del 04 al 09 de abril 2025
Montaje de prelosas (pza)	44,809	19,330	25,479	1,554	0	
Losa (claro)	280	138	142	5	2	
Guarnición (m)	20,735.93	5,501.90	15,234.03	121	38.6	
Parapeto (m)	20,735.90	3,920.50	16,815.40	525	0	
Pavimento (m3)	6,556.90	0.00	6,556.90	540	0	

	27 de marzo al 3 de abril	Semana del 4 al 10 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	207	829
Maquinaria	81	124

Quintana Roo: Puente Vehicular Nichupté

