

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
- Financiero: 94.5%
- Real: 100%


CONCLUIDA

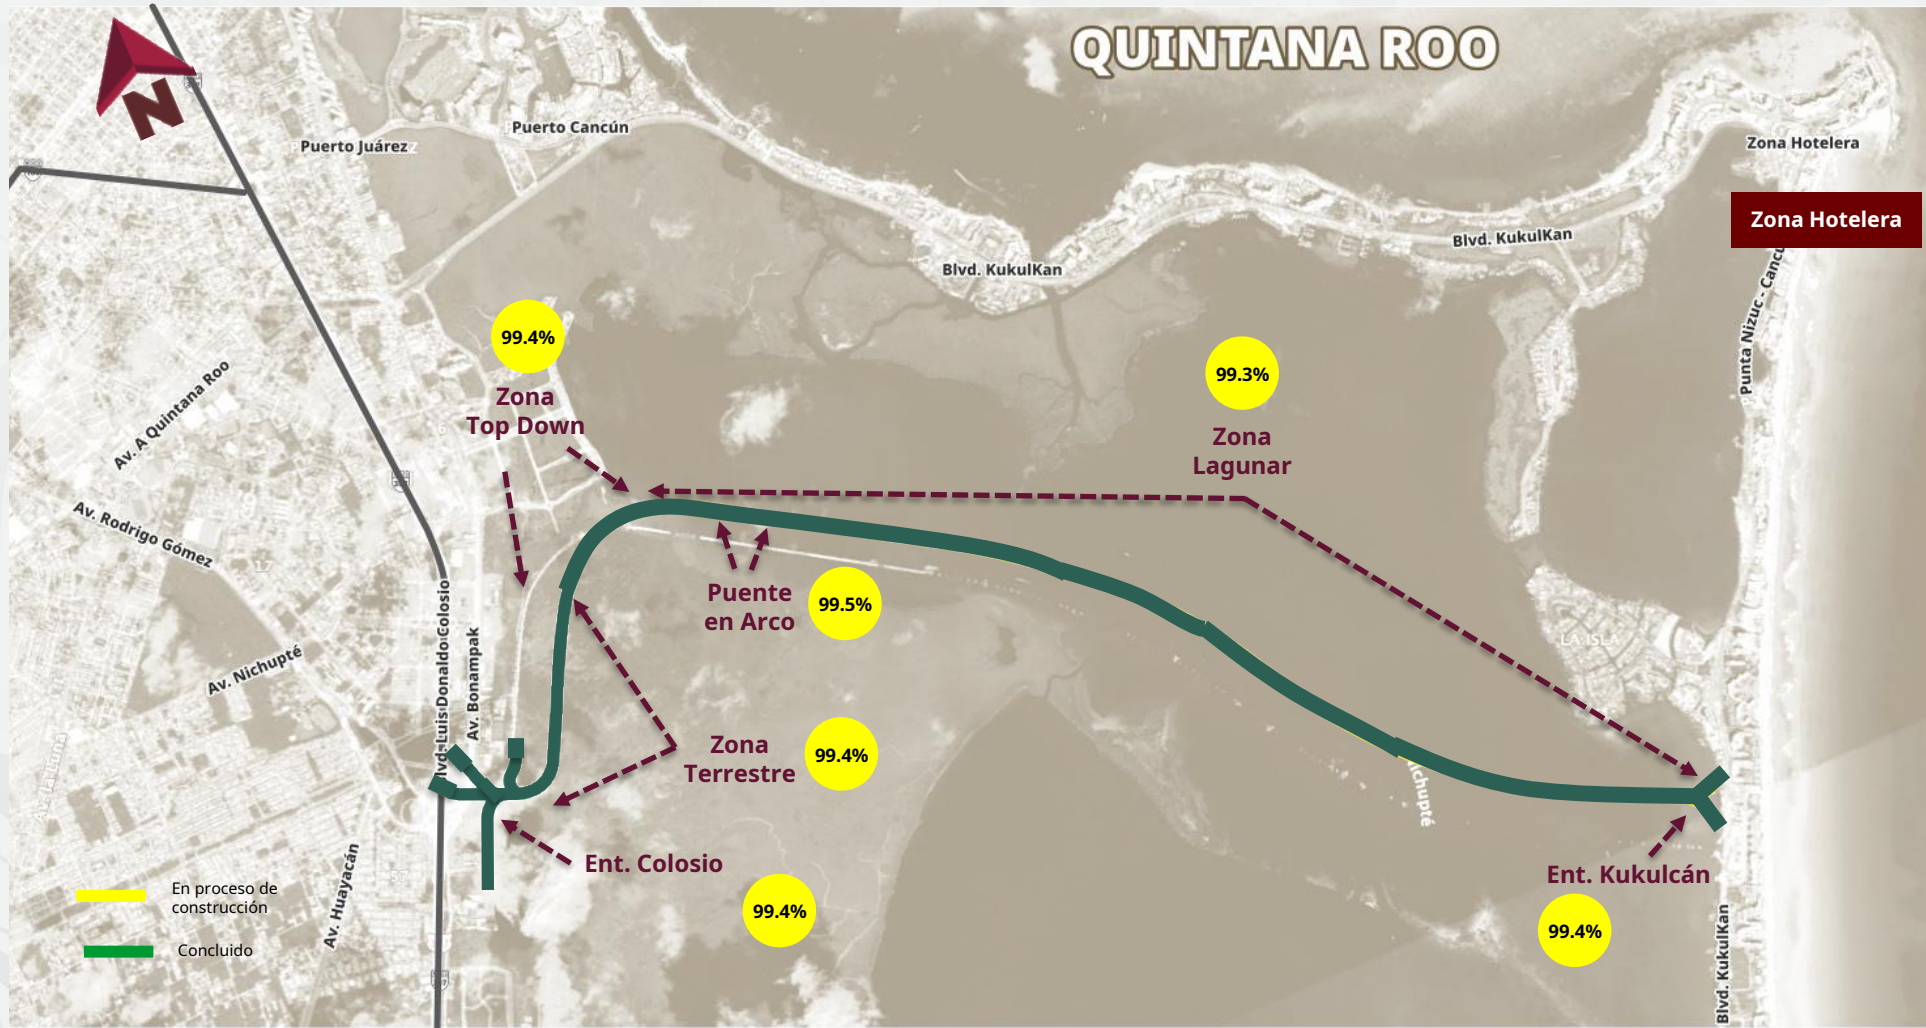

- Inversión Total: 10,319.5**
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP
- Inicio:** 01 de julio de 2022
Término: 30 de abril 2026
- Meta:** 11.2 km
 - 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
 - 2.4 km entronques (2)
 - Puente en Arco Metálico (1) 103 m
- Más de 51 mil** empleos generados
20 millones de turistas
- 1.32 millones** de habitantes beneficiados
- 45 minutos** de ahorro en tiempo



Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

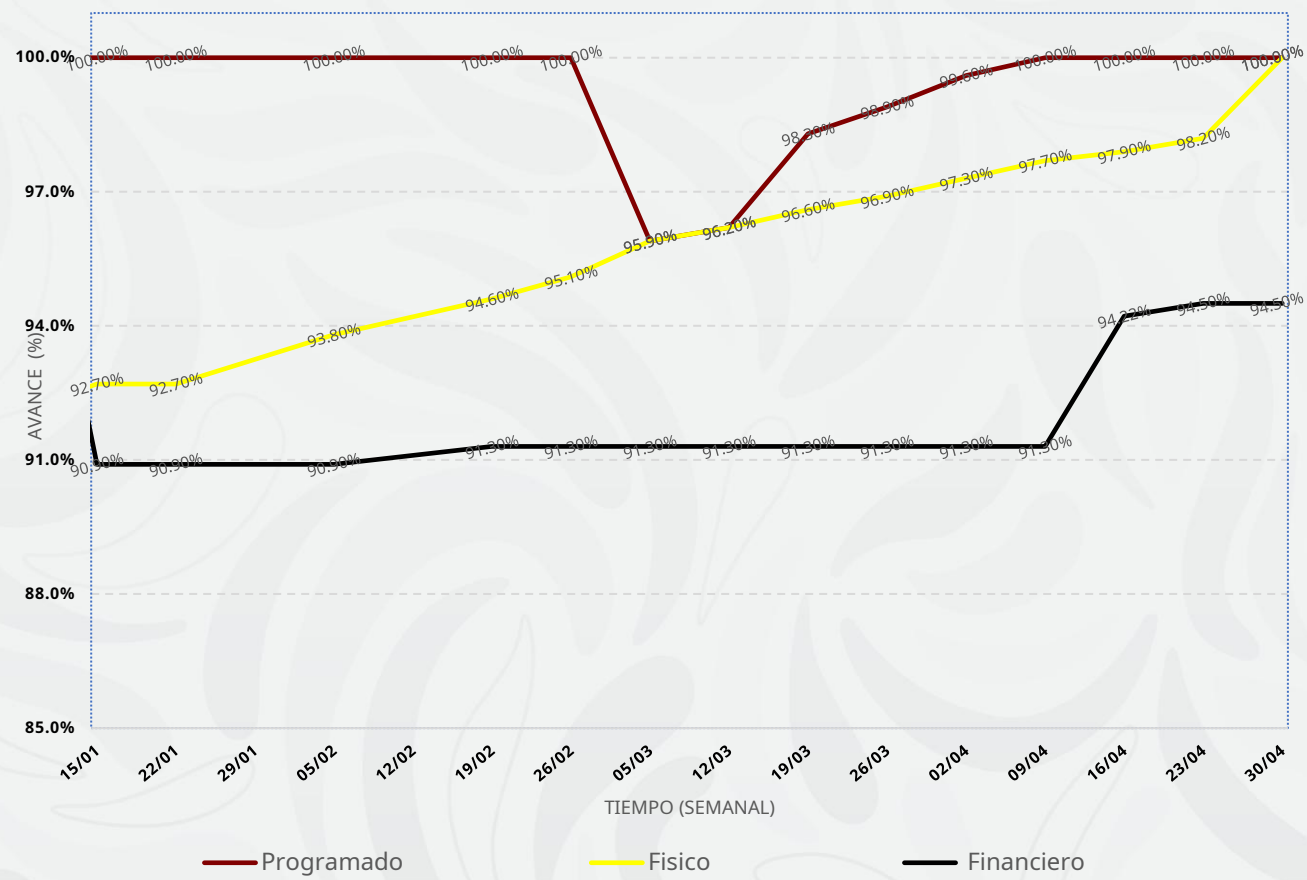

	Del 10 al 16 de abril de 2026	Del 17 al 23 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	510	488
Maquinaria	44	29
Frentes de trabajo	11	12

