Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 97.7% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.4%
- Financiero: 91.3%

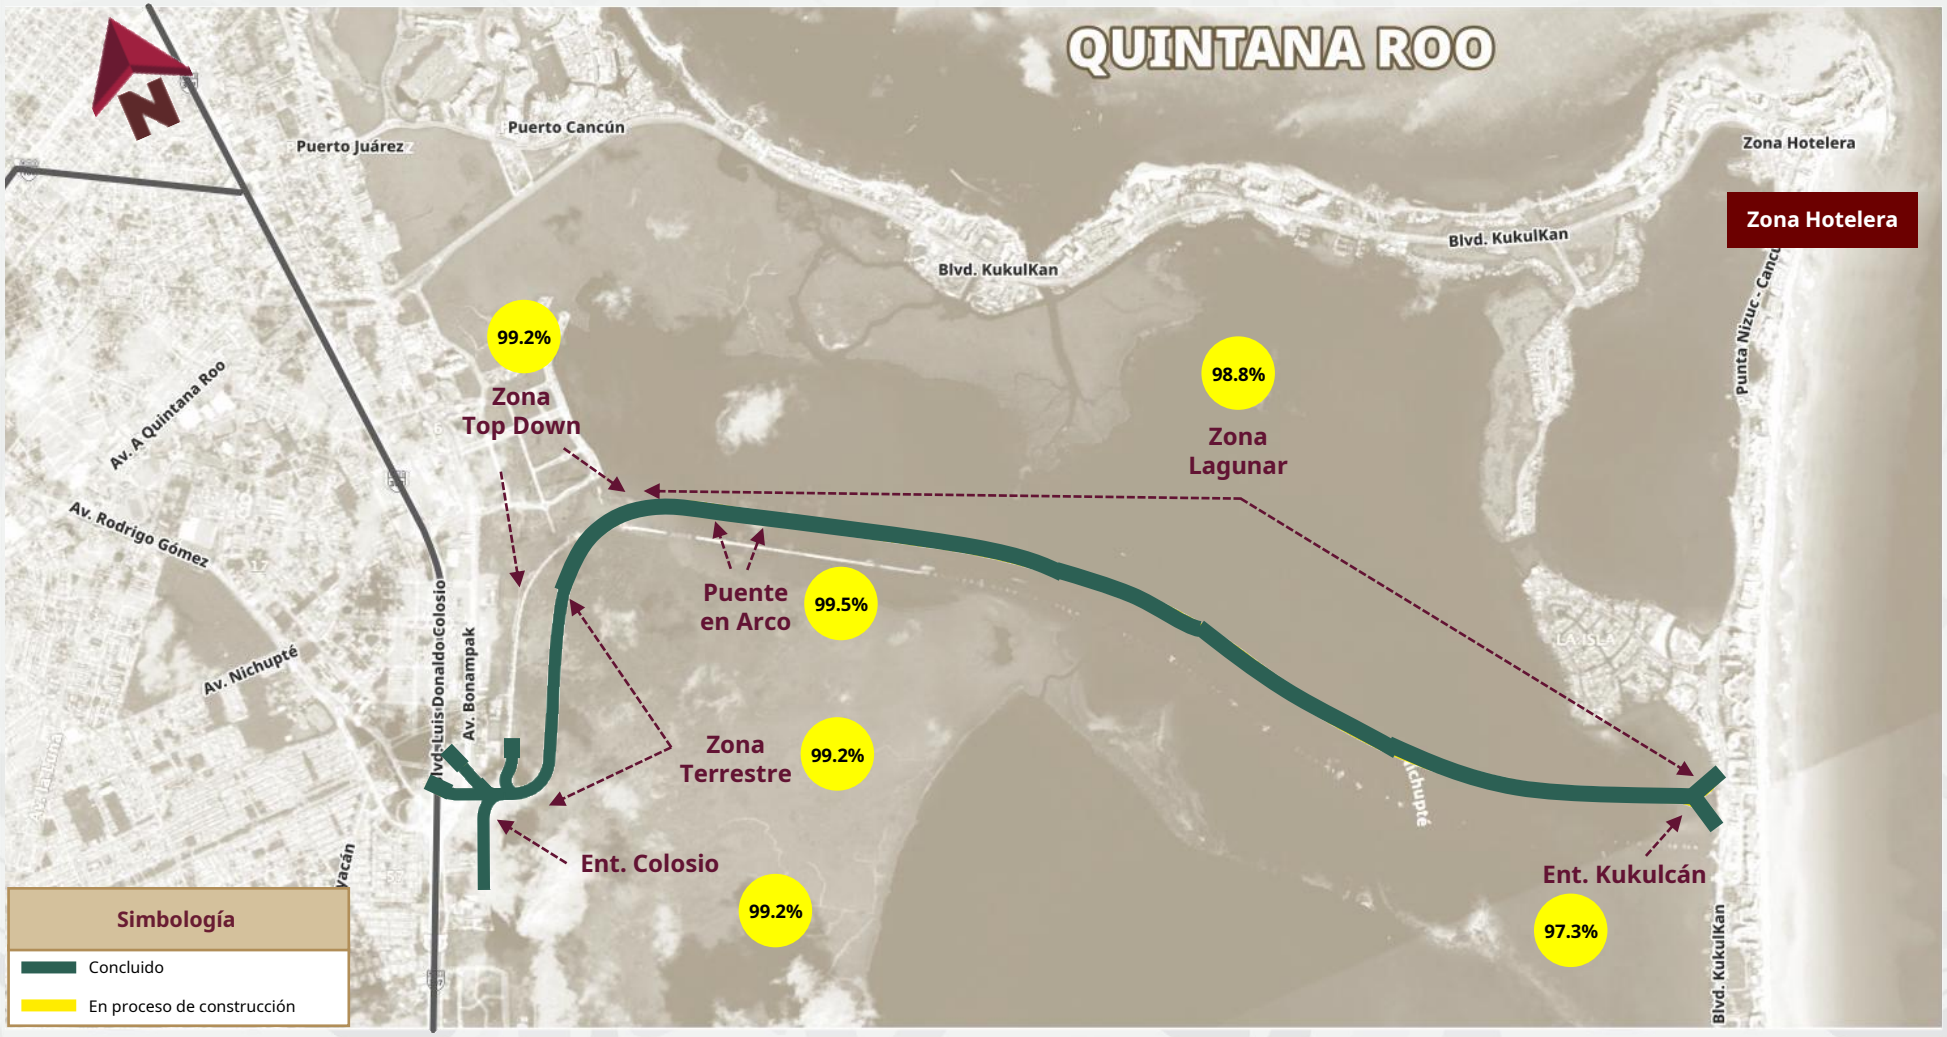

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 15 de abril 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 02 al 08 de abril de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	16	16	0	0	CONCLUIDO
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	3.9	0.1	0	Marzo 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	3.0	1.0	1.0	Marzo 2026
Guarnición (m)	21,036.3	20,686.2	350.1	70.0	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.4	18,321.4	2,708	60.8	Marzo 2026
Pavimento entronques (m3)	1,718.26	1,718.3	0	0	CONCLUIDO
Pavimento viaducto (m3)	5,272	4,581	691	0	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	86.0	63.9	22.1	2.0	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	394	19	0	Marzo 2026
Luminarias (pza)	430	411	19	0	Marzo 2026
ITS (pza)	36	30.4	5.6	1.6	Marzo 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	131	0	3	CONCLUIDO
Montaje de cajas de retención (pza)	131	108	23	1	Marzo 2026
Señalamiento vertical elevado (pza)	13	0	13	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical bajo (pza)	236	86	150	0	Marzo 2026
Señalamiento horizontal (pza)	11.2	0	11.2	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

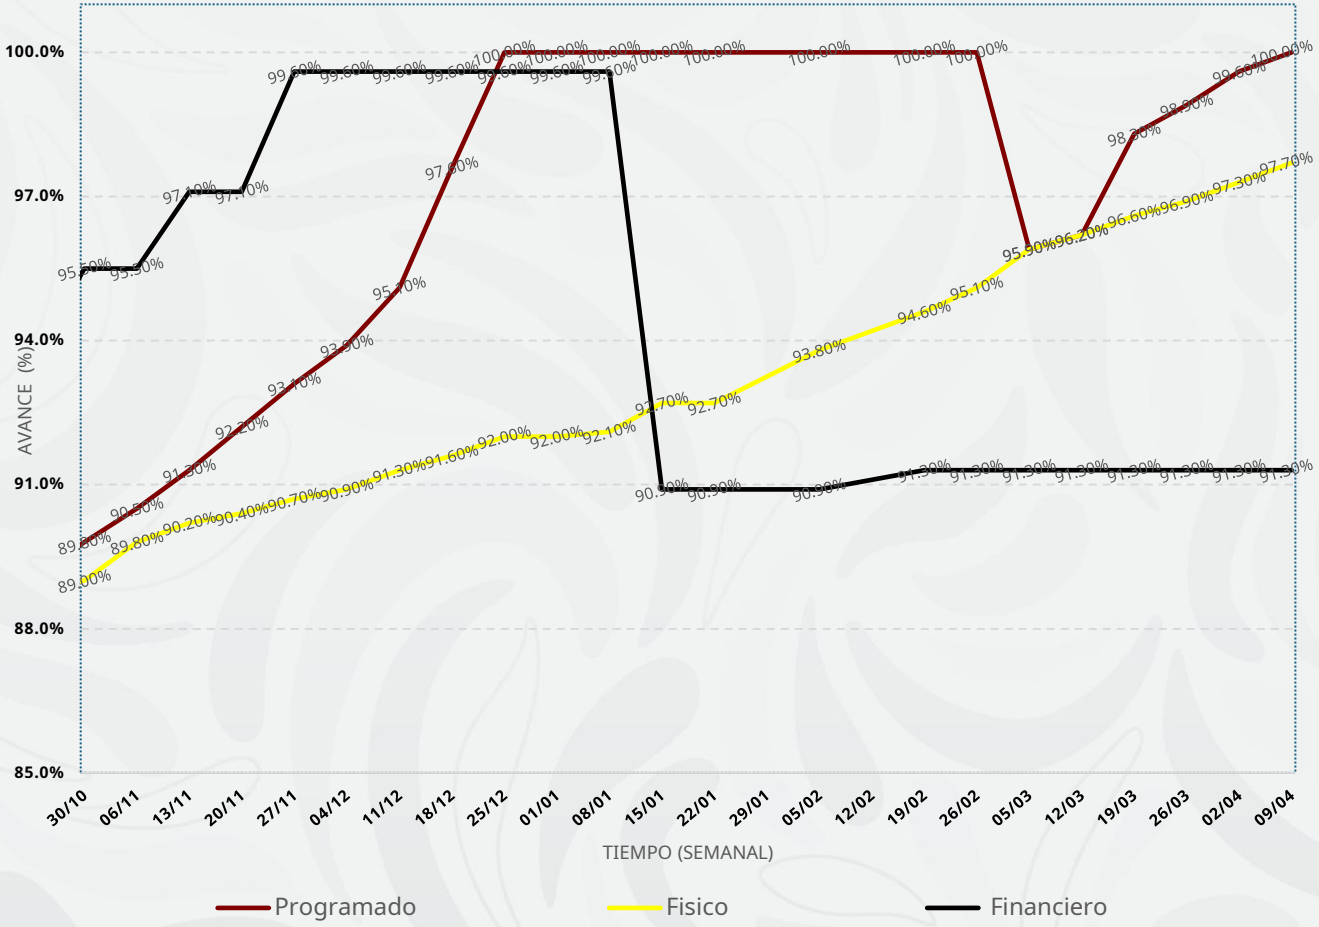

	Del 20 al 26 de marzo de 2026	Del 2 de marzo al 02 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	453	396
Maquinaria	57	43
Frentes de trabajo	13	13
