Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 98.3%
- Real: 96.6% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.4%
- Financiero: 91.3%

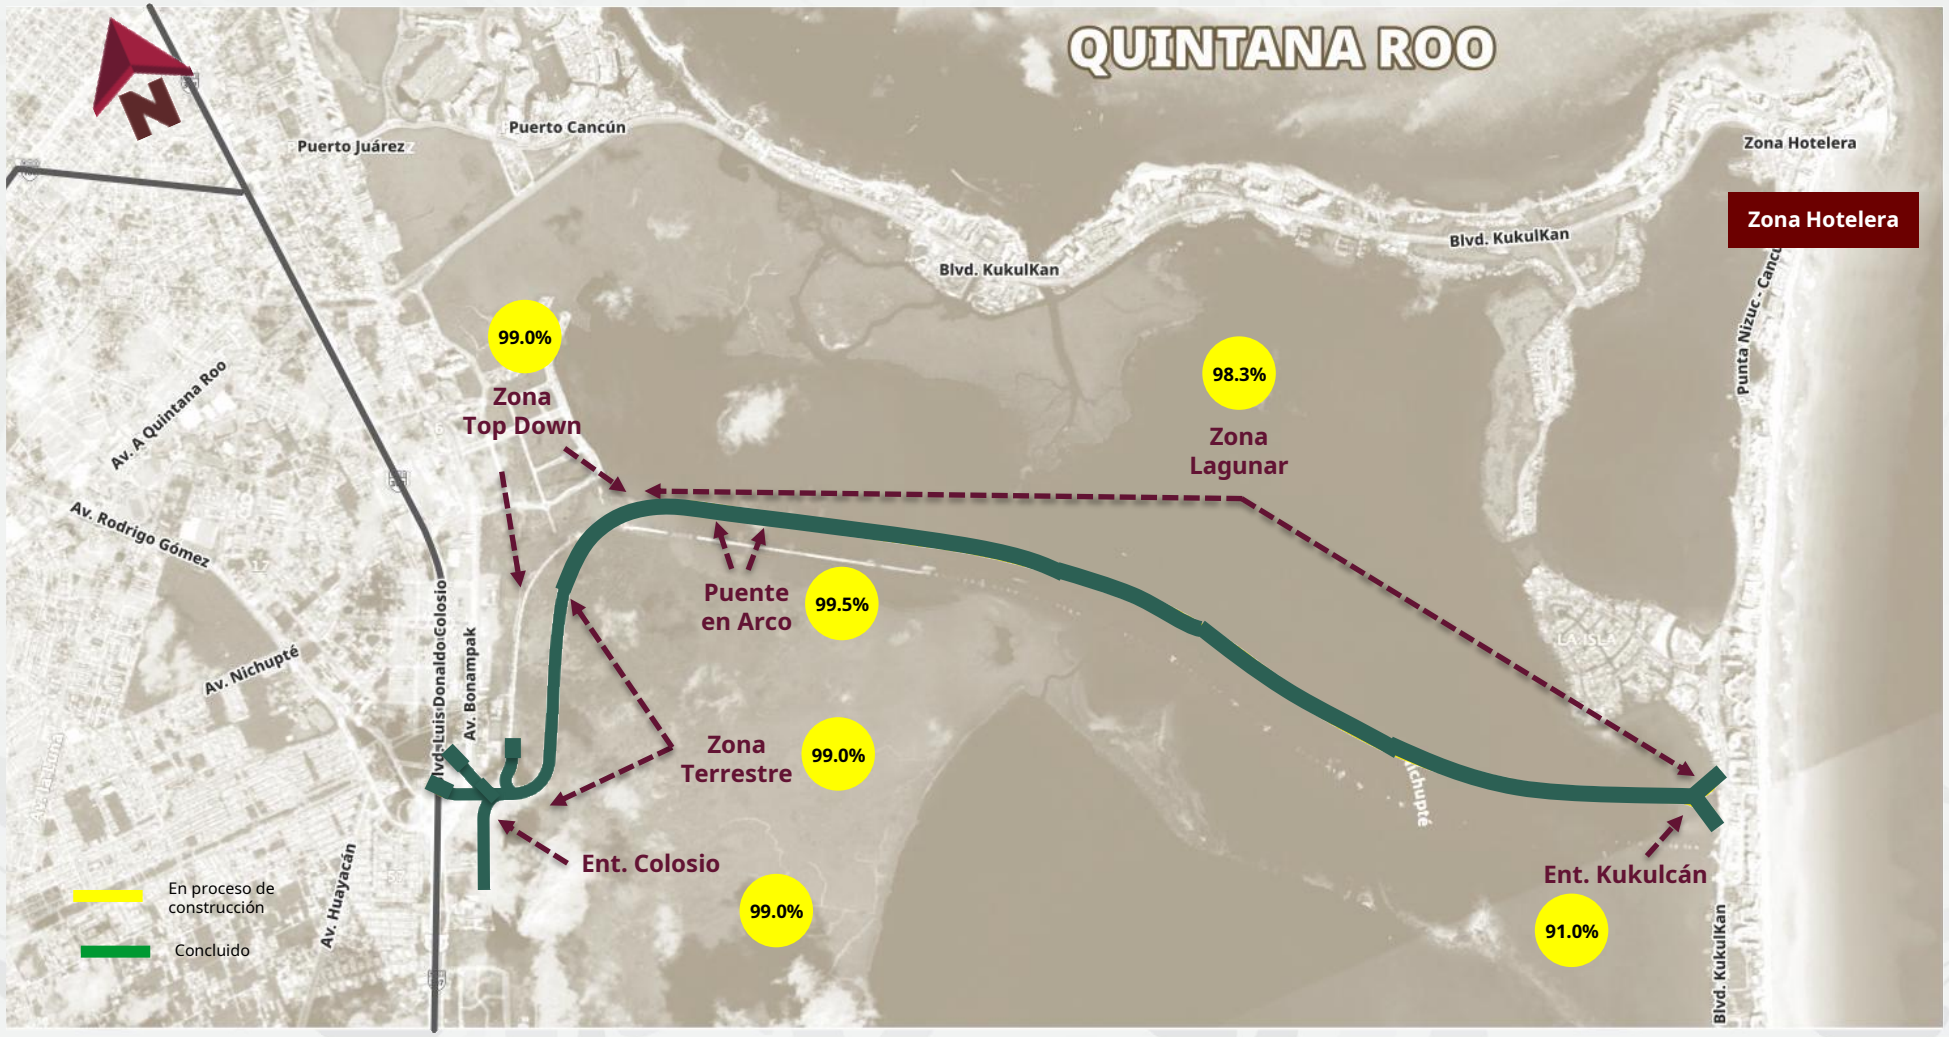

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 marzo 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 12 al 18 de marzo de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	16	13	3	1	Marzo 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	2.5	1.5	1.0	Marzo 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	1.0	3.0	0	Marzo 2026
Guarnición (m)	21,036.3	20,616.2	420	0	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.4	18,260.6	2,768.8	0	Marzo 2026
Pavimento entronques (m3)	1,718.26	1,697.3	20.9	62.6	Marzo 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	3,957	1,315	381	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	51.4	30.6	1.0	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	393	20	0	Marzo 2026
Luminarias (pza)	430	406	24	61	Marzo 2026
ITS (pza)	36	25.2	10.8	0.8	Marzo 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	116	15	12	Marzo 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	78	53	9	Marzo 2026
Señalamiento vertical elevado (pza)	13	0	13	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical bajo (pza)	236	70	166	70	Marzo 2026
Señalamiento horizontal (pza)	11.2	0	11.2	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

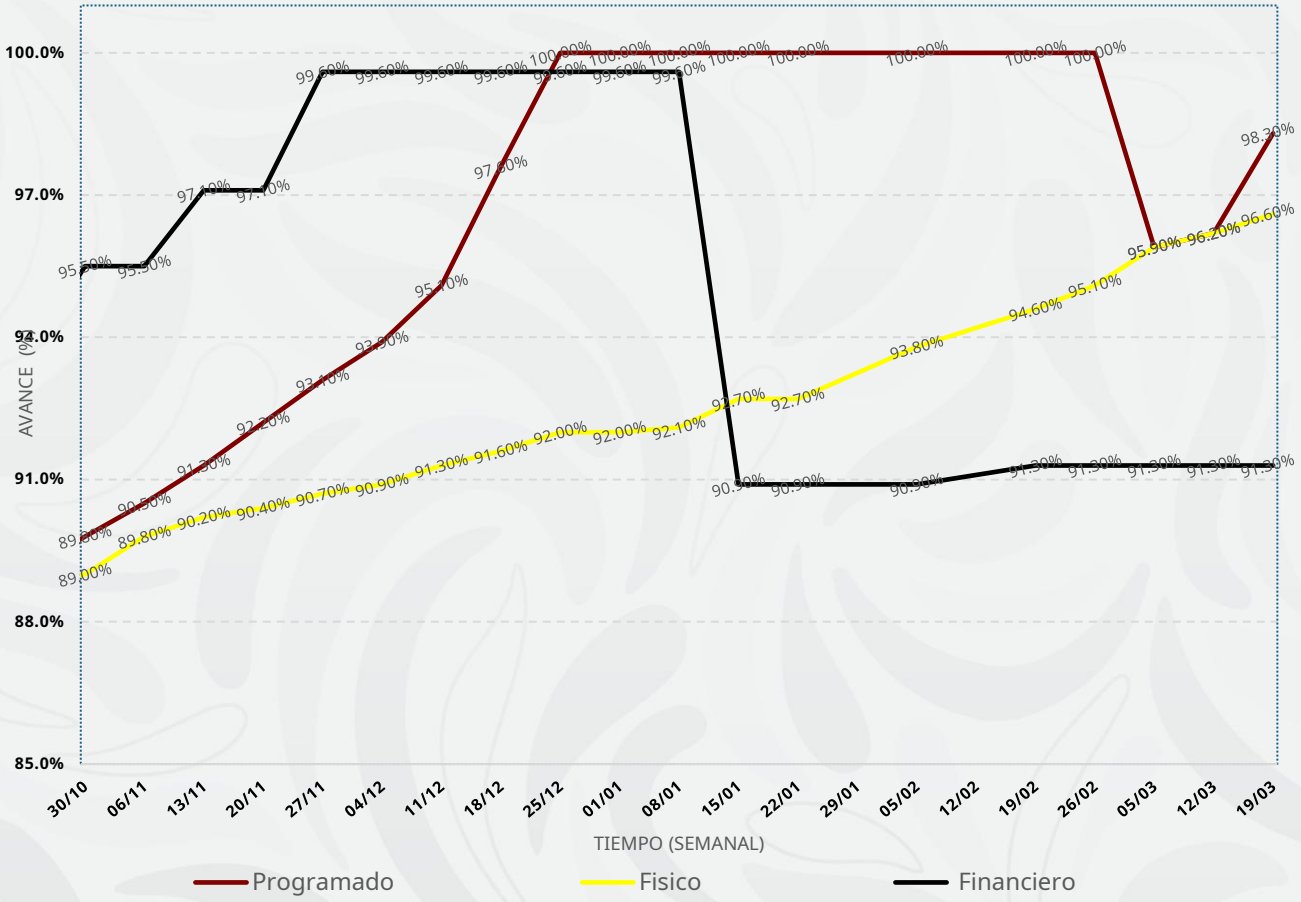

	05 al 12 de marzo 2026	13 al 19 de marzo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	700	506
Maquinaria	55	58
Frentes de trabajo	13	13
