Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico
- Programado: 100%
- Real: 97.9% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.2%
- Financiero: 94.2%

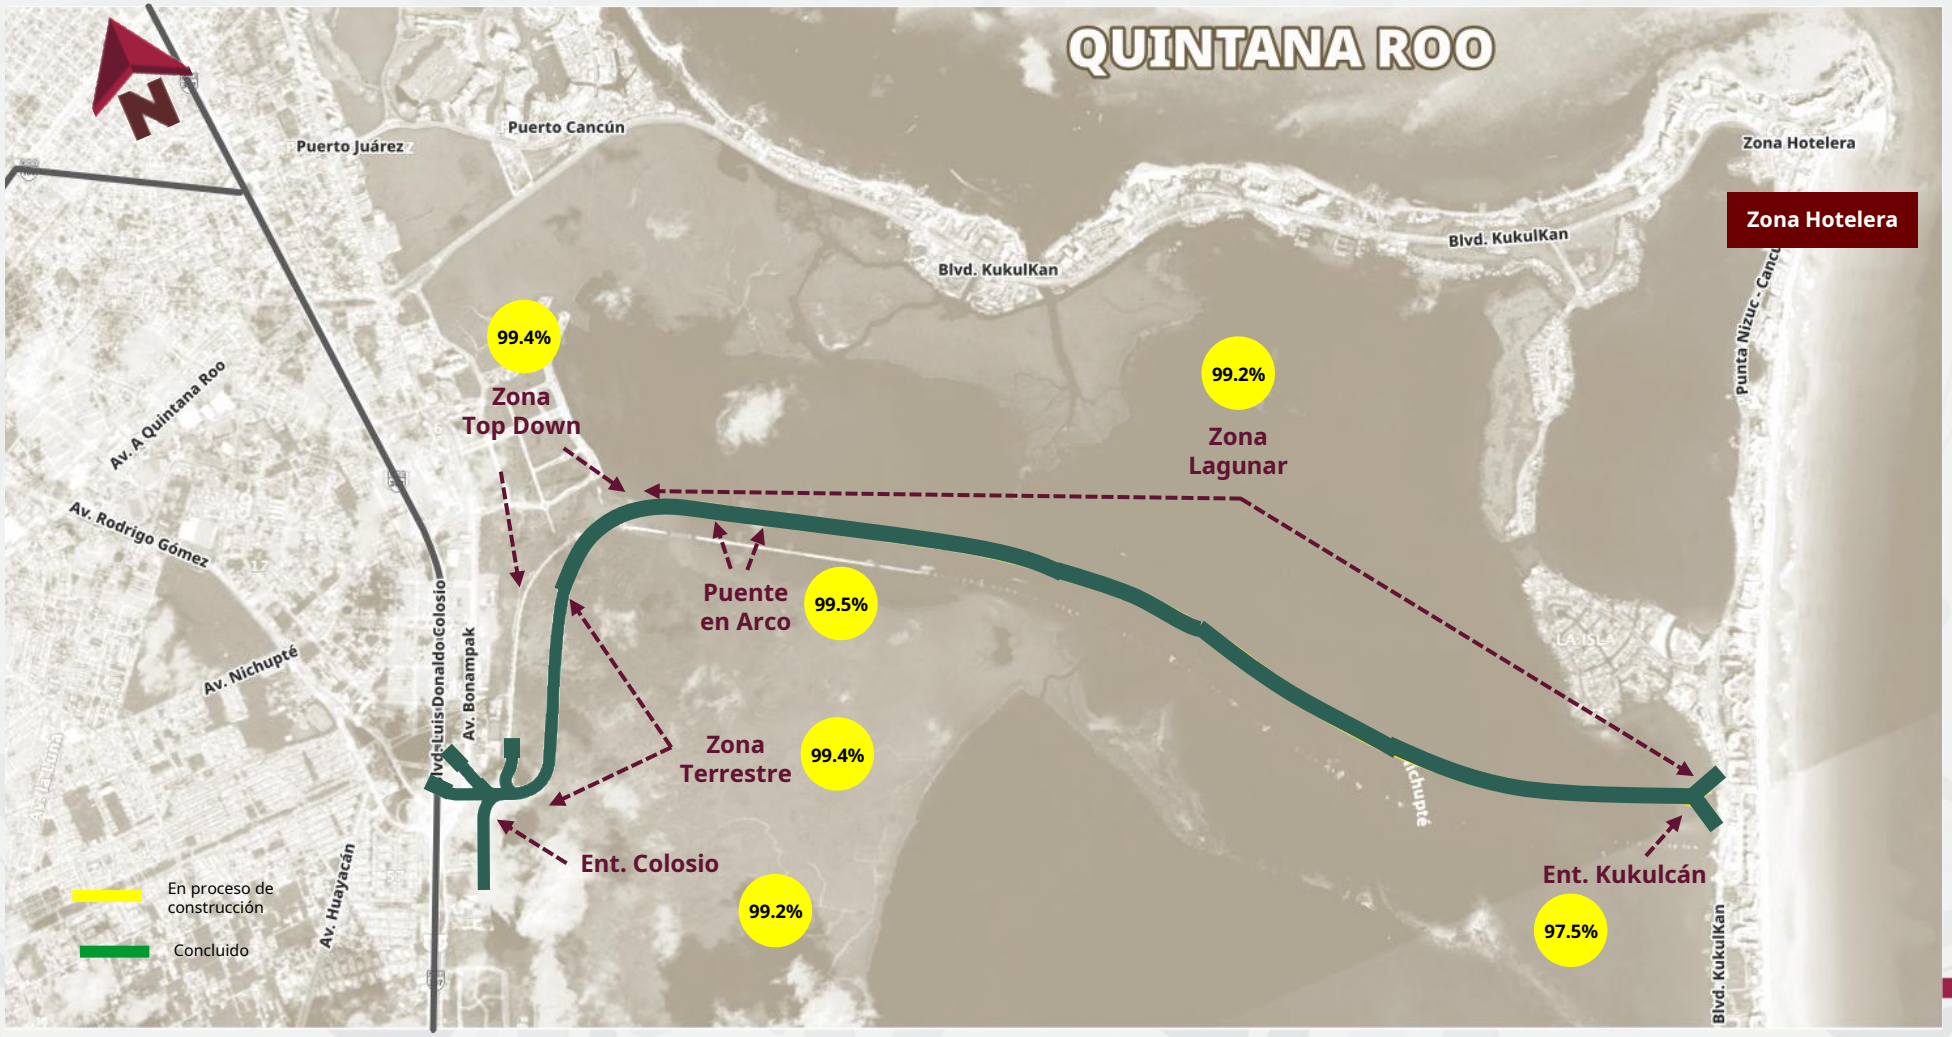

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 30 de abril 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 09 al 15 de abril de 2026	Fecha contractual de terminación
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	4.0	0	0.1	CONCLUIDO
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	3.0	1.0	0	Marzo 2026
Guarnición (m)	21,036.3	20,756.2	280	70.0	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.4	18,909.4	2,120	588	Marzo 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	4,581	691	0	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	86.0	75.7	10.3	11.7	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	402	11	0	Marzo 2026
Luminarias (pza)	430	411	19	0	Marzo 2026
ITS (pza)	36	32	4.0	1.6	Marzo 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	119	12	11	Marzo 2026
Señalamiento vertical elevado (pza)	13	0	13	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical bajo (pza)	236	86	150	0	Marzo 2026
Señalamiento horizontal (pza)	11.2	0	11.2	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

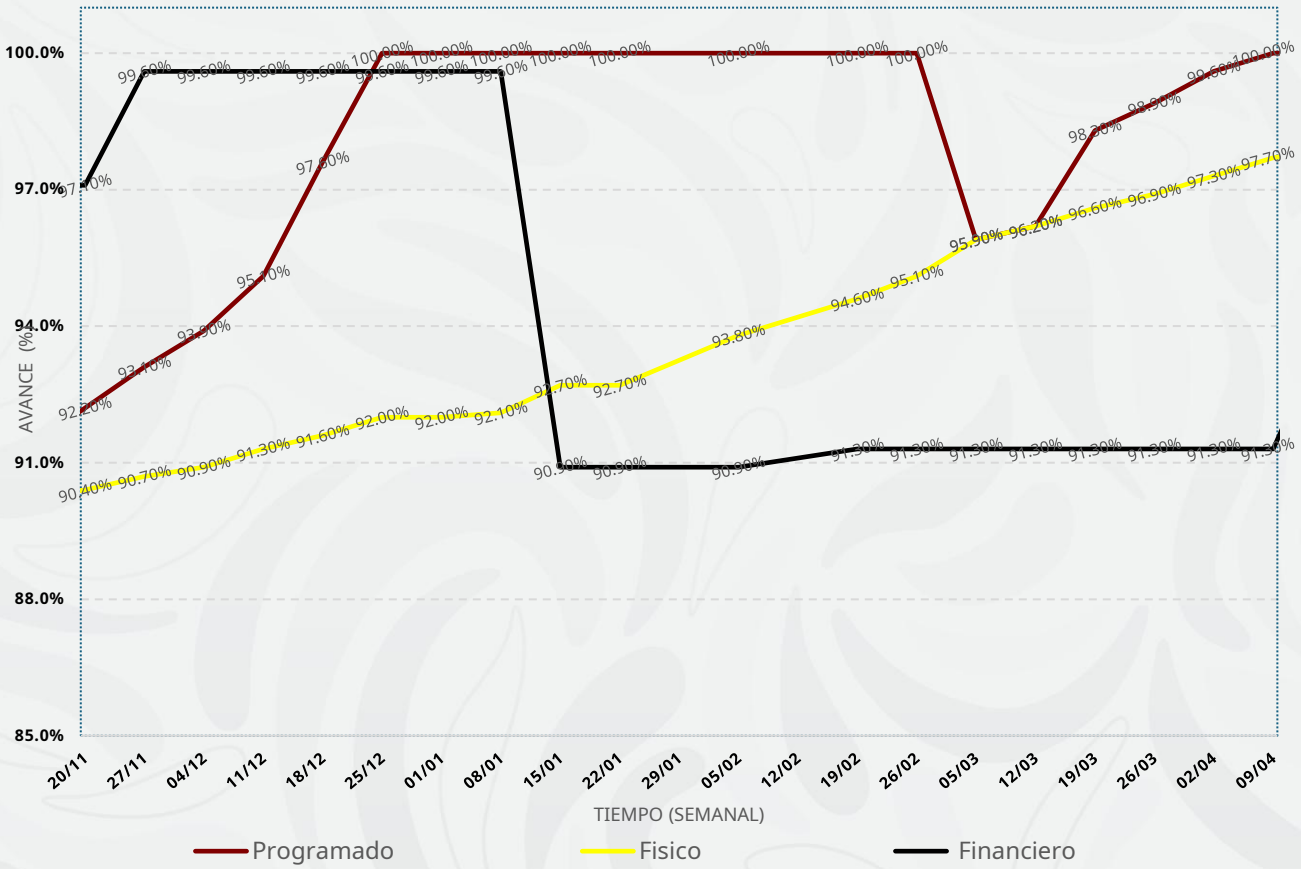

	Del 23 de marzo al 02 de abril de 2026	Del 03 al 09 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	396	484
Maquinaria	43	39
Frentes de trabajo	13	11

2026 año de Margarita Maza
