Chiapas Puente Rizo de Oro

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

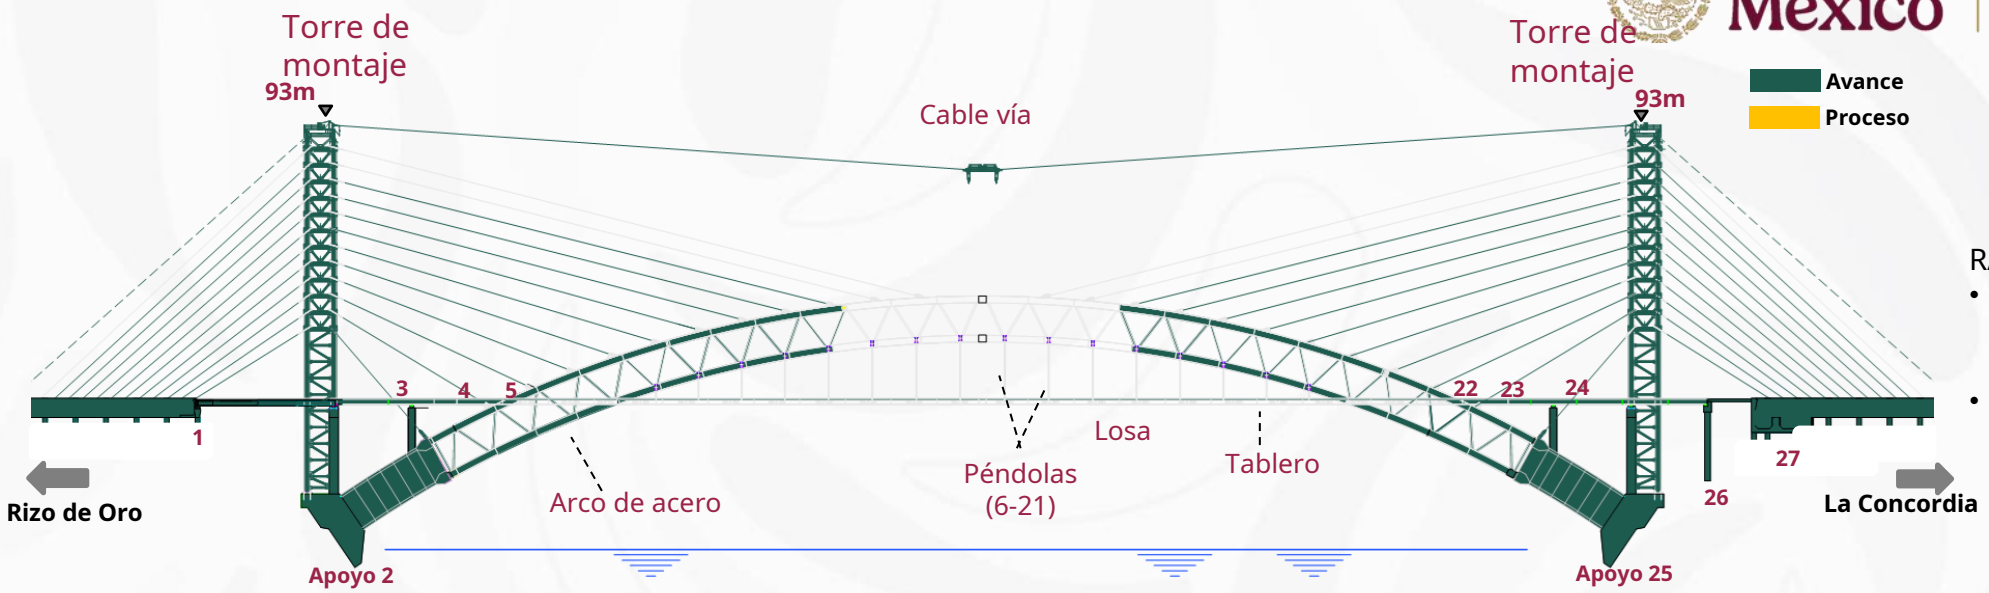

Avance físico

- Programado: 87.70%
- Real: 88.49%
- Incremento Semanal: 0.28%
- Financiero: 75.43%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	06/04/26 al 13/04/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,730.41	2,054.59	675.82	76.01	76.01
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	19.57	7.43	0.73	0.73
6-21	Péndolas	Pza.	32	0	32	Sin iniciar	
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	14	23	0	0
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74	0	0
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfaltico)	m^3	1,681	0	1,681	Sin iniciar	0

Inversión total: 1,810.8 mdp
2023-2025: 1,810.8 mdp
2026: 426.2 mdp

Inicio: Septiembre de 2023
Término: Septiembre de 2026

Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso

5,715 empleos generados

300 mil habitantes beneficiados

60 min de ahorro en tiempo

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/04/26 al 13/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	2,054.59	675.82	76.01	76.01	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m^3)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m^3)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

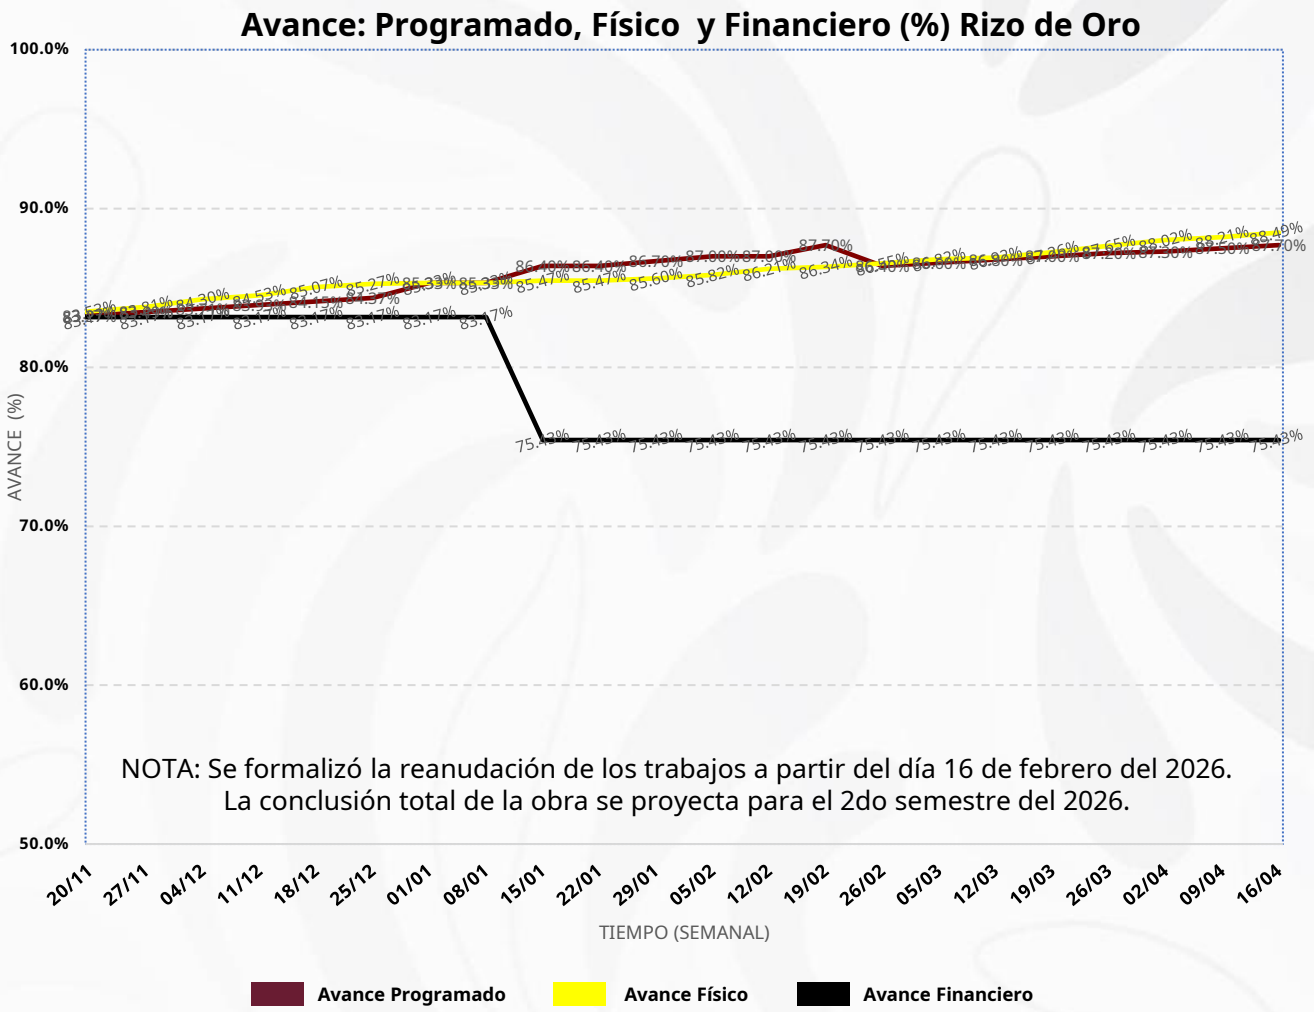

Empresas	
• **Contratista:** COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	• **Supervisión:** JESA INGENIERIA S.A.DE C.V.

	31/03/26 al 06/04/26	06/04/26 al 13/04/26
Fuerza de Trabajo (personas)	193	193
Maquinaria	75	75
