ACTUALIZADA 23/04/26

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Avance físico
- Programado: 100%
- Real: 98.2% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.3%
- Financiero: 94.5%

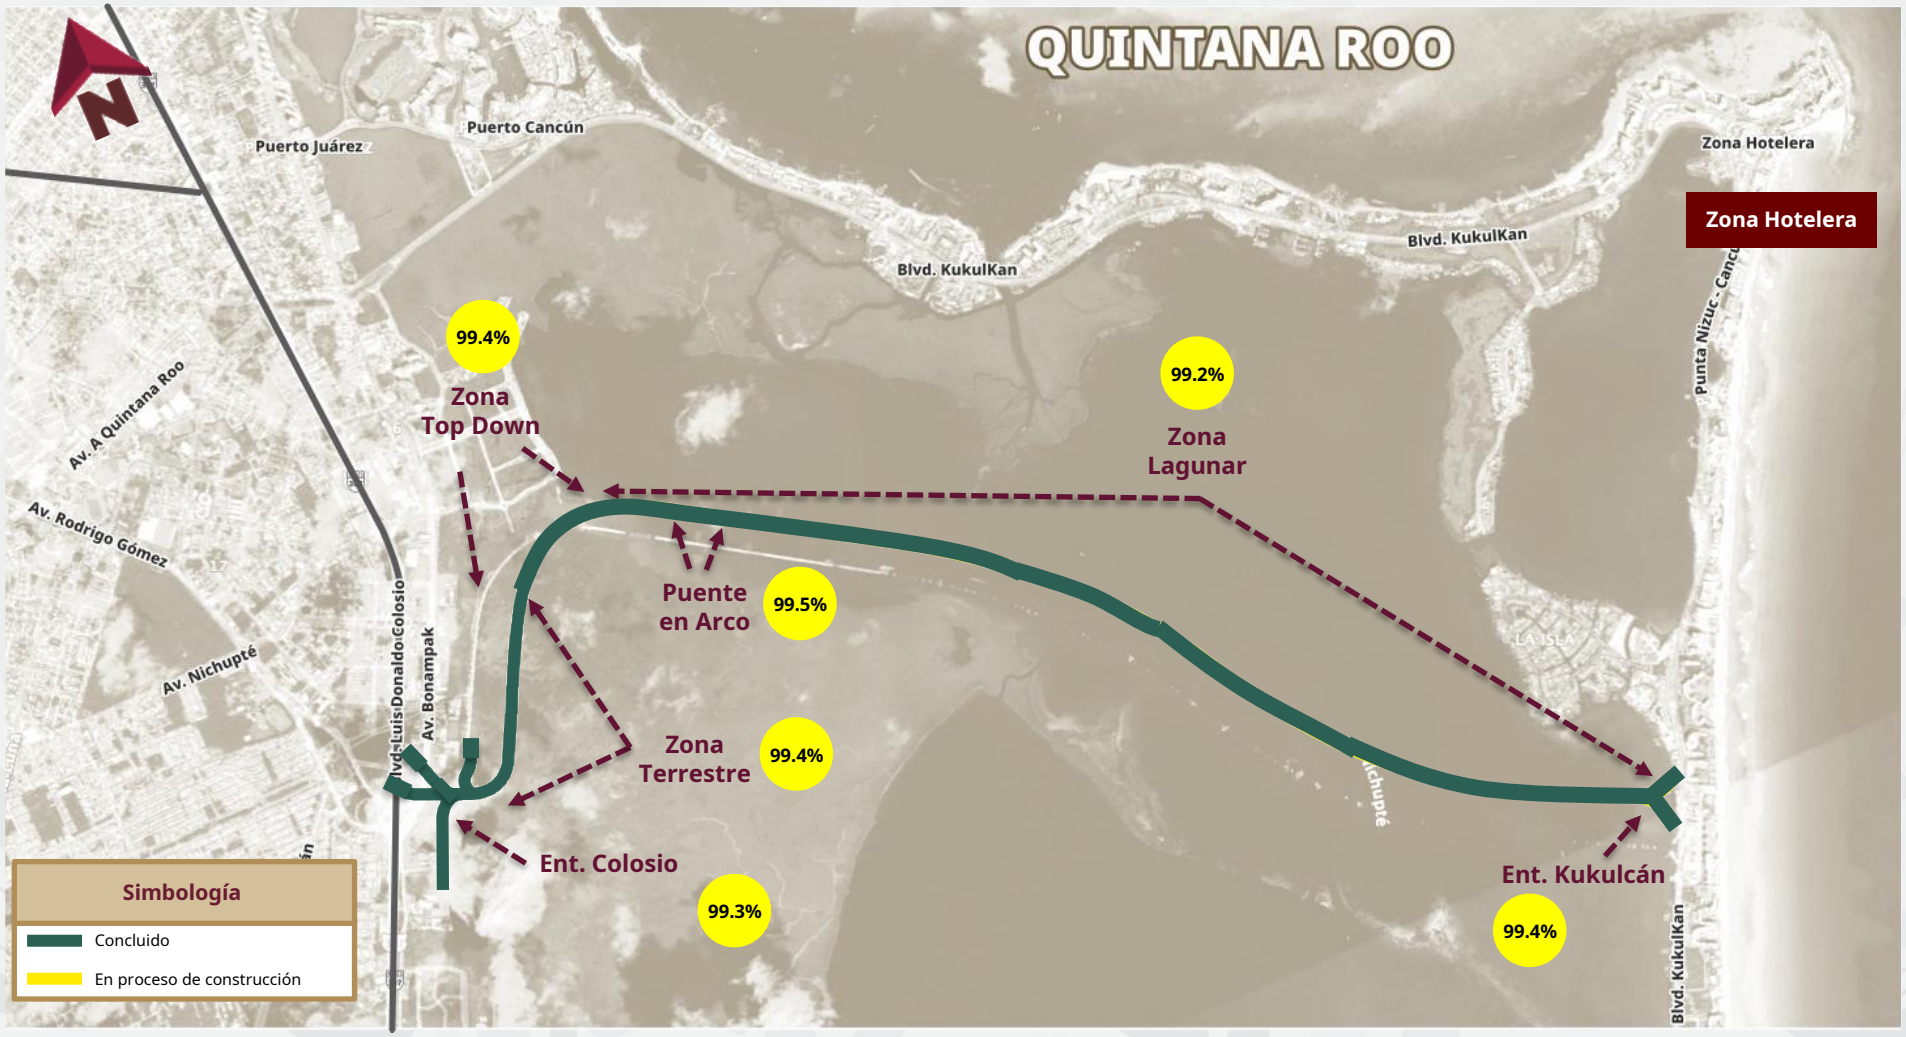

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 30 de abril 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

ACTUALIZADA 23/04/26

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 16 al 22 de abril de 2026	Fecha contractual de terminación
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	4.0	0	-	CONCLUIDO
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	4.0	0	1	CONCLUIDO
Guarnición (m)	21,036.3	20,801.2	235	45.0	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.4	19,097.4	1,932	188	Marzo 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	4,862	410	280.8	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	86.0	84.5	1.5	8.8	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	402	11	0	Marzo 2026
Luminarias (pza)	430	422	8	11	Marzo 2026
ITS (pza)	36	33.2	2.8	1.2	Marzo 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	119	12	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical elevado (pza)	13	0	13	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical bajo (pza)	236	150	86	64	Marzo 2026
Señalamiento horizontal (pza)	11.2	0	11.2	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

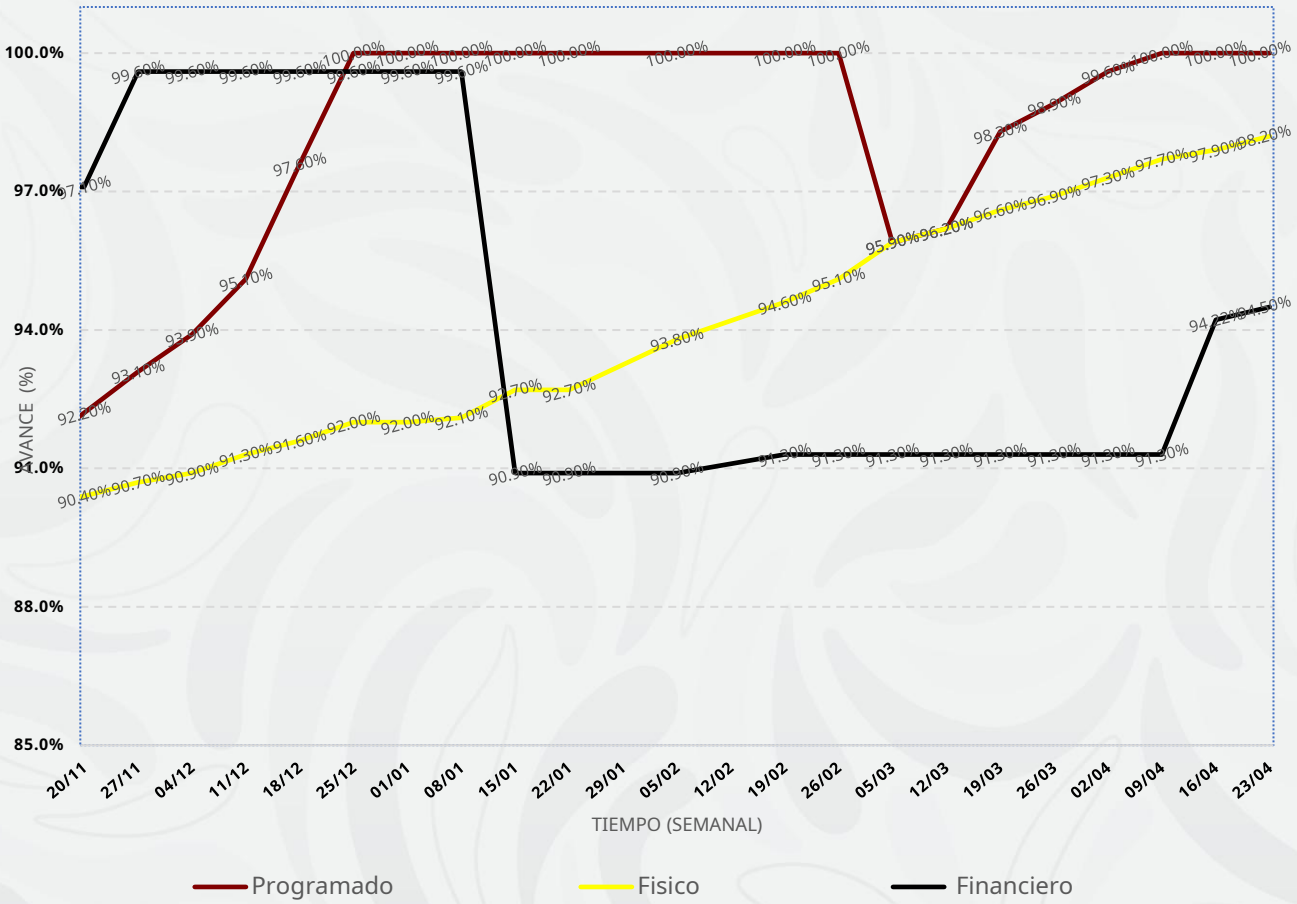

	Del 03 al 09 de abril de 2026	Del 10 al 16 de abril de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	484	510
Maquinaria	39	44
Frentes de trabajo	11	11
