ACTUALIZADA 23/04/26

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Chiapas
Puente Rizo de Oro

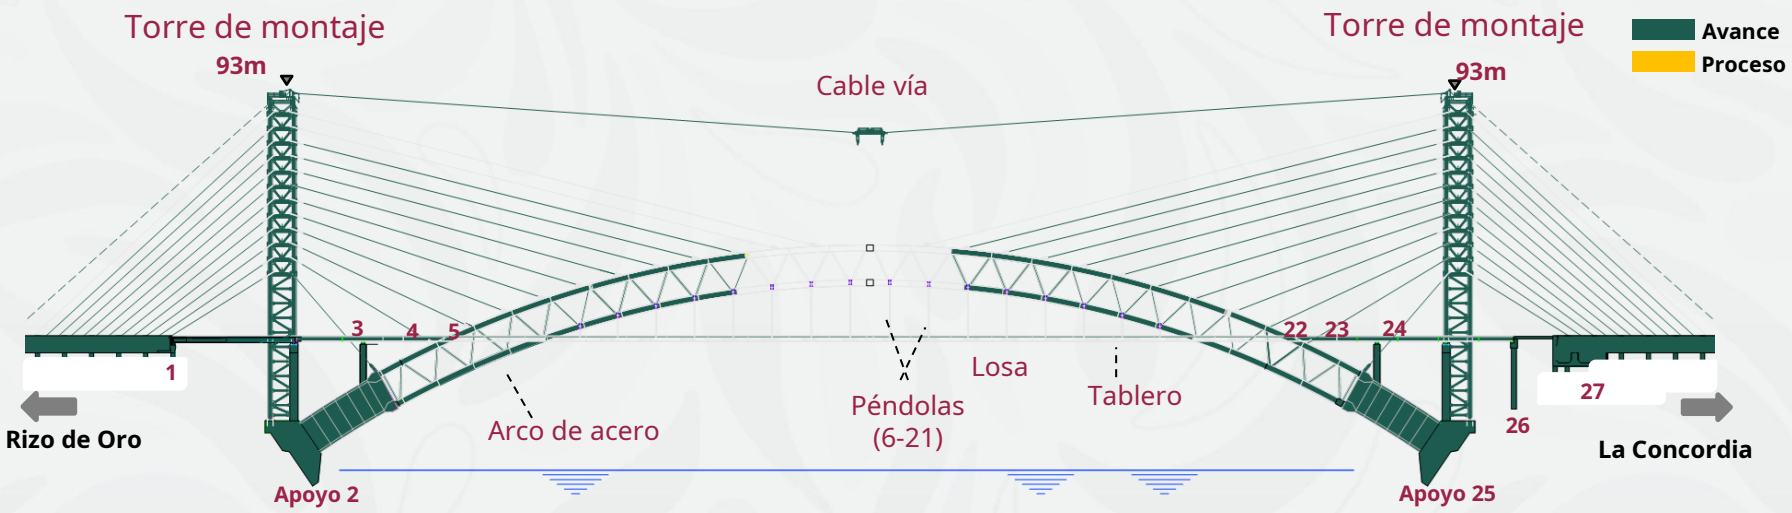

Eje	Elemento	Unidad	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	14/04/26 al 20/04/26	
						Programado	Ejecutado
3-24	Montaje de Dovela de arco	Ton	2,730.41	2,119.69	610.72	65.10	65.10
3-24	Montaje de Dovela de arco	Pza.	27	20.2	6.80	0.63	0.63
6-21	Péndolas	Pza.	32	0	32	Sin iniciar	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Ton.	946.70	367.74	578.96	0	0
1-26	Montaje de Dovela de Superestructura	Pza.	37	14	23	0	0
1-27	Losa	ml	405	152.26	252.74	0	0
1-27	Guarnición	ml	990.96	390.51	600.45	0	0
1-27	Parapeto	ml	982.96	0	982.96	Sin iniciar	0
1,2,26,27	Juntas de calzada	Pza.	4	0	1	Sin iniciar	0
	Pavimento (Concreto Asfaltico)	m^3	1,681	0	1,681	Sin iniciar	0

Avance físico

- Programado: 87.90%
- Real: 88.72%
- Incremento Semanal: 0.23%
- Financiero: 75.43%

RAZÓN DEL ATRASO PRESENTADO:

- En caso de presentarse bloqueos por la delincuencia, impedirían la conclusión de la obra
- Cualquier desviación, incumplimiento o falla detectada durante la ejecución y verificación del cable vía resultará en un retraso directo y proporcional en el cronograma de montaje de los elementos estructurales subsiguientes

Inversión total: 1,810.8 mdp
2023-2025: 1,384.60 mdp
2026: 426.2 mdp

Inicio: septiembre de 2023
Término: Septiembre de 2026

Meta: 1 Puente (405 m)
1.7 km camino de acceso

5,715 empleos generados

300 mil habitantes beneficiados

60 min de ahorro en tiempo

ACTUALIZADA 23/04/26

Chiapas

Puente Rizo de Oro

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/04/26 al 20/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Montaje de Dovelas de Arco (ton)	2,730.41	2,119.69	610.72	65.10	65.10	
Montaje de Dovelas de Superestructura (ton)	946.70	367.74	578.96	0	0	
Péndolas (pza.)	16	0	16	0	0	Sin iniciar
Losa de calzada (m)	404	152.26	251.44	0	0	
Guarnición (m)	990.96	390.51	600.45	0	0	
Terraplén (Terraplén, SY y SR) (m3)	72,614	69,753	2,861	--	--	
Base Hidráulica (m^3)	4,537	3,592	945	--	--	
Carpeta Asfáltica (m^3)	1,681	0	1,681	--	--	Sin iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Rizo de Oro

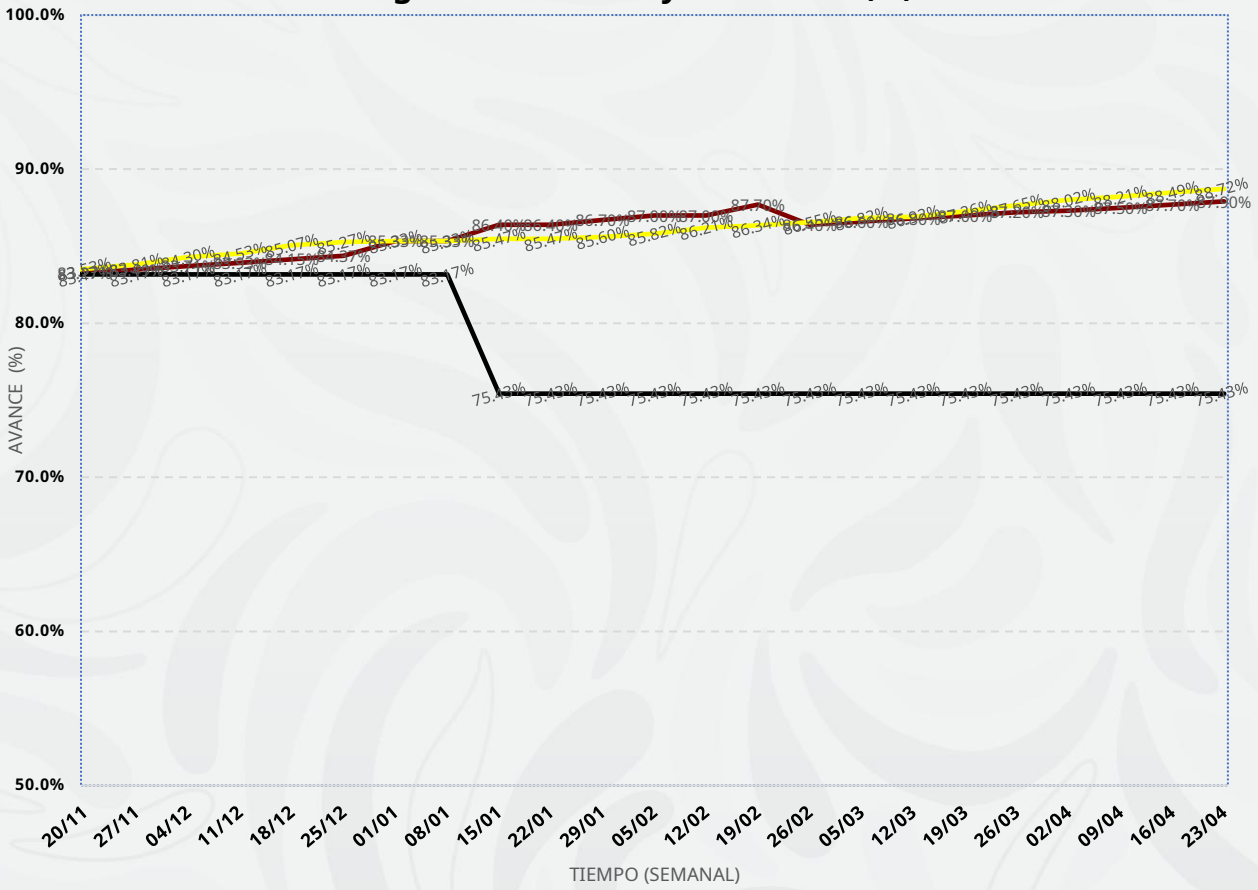

NOTA: Se formalizó la reanudación de los trabajos a partir del día 16 de febrero del 2026. La conclusión total de la obra se proyecta para el 2do semestre del 2026.

Avance Programado | Avance Físico | Avance Financiero

Empresas	
• **Contratista:** COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.	

	06/04/26 al 13/04/26	14/04/26 al 20/04/26
Fuerza de Trabajo (personas)	193	193
Maquinaria	75	75
