Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 95.9%
- Real: 95.9% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.8%
- Financiero: 91.3%

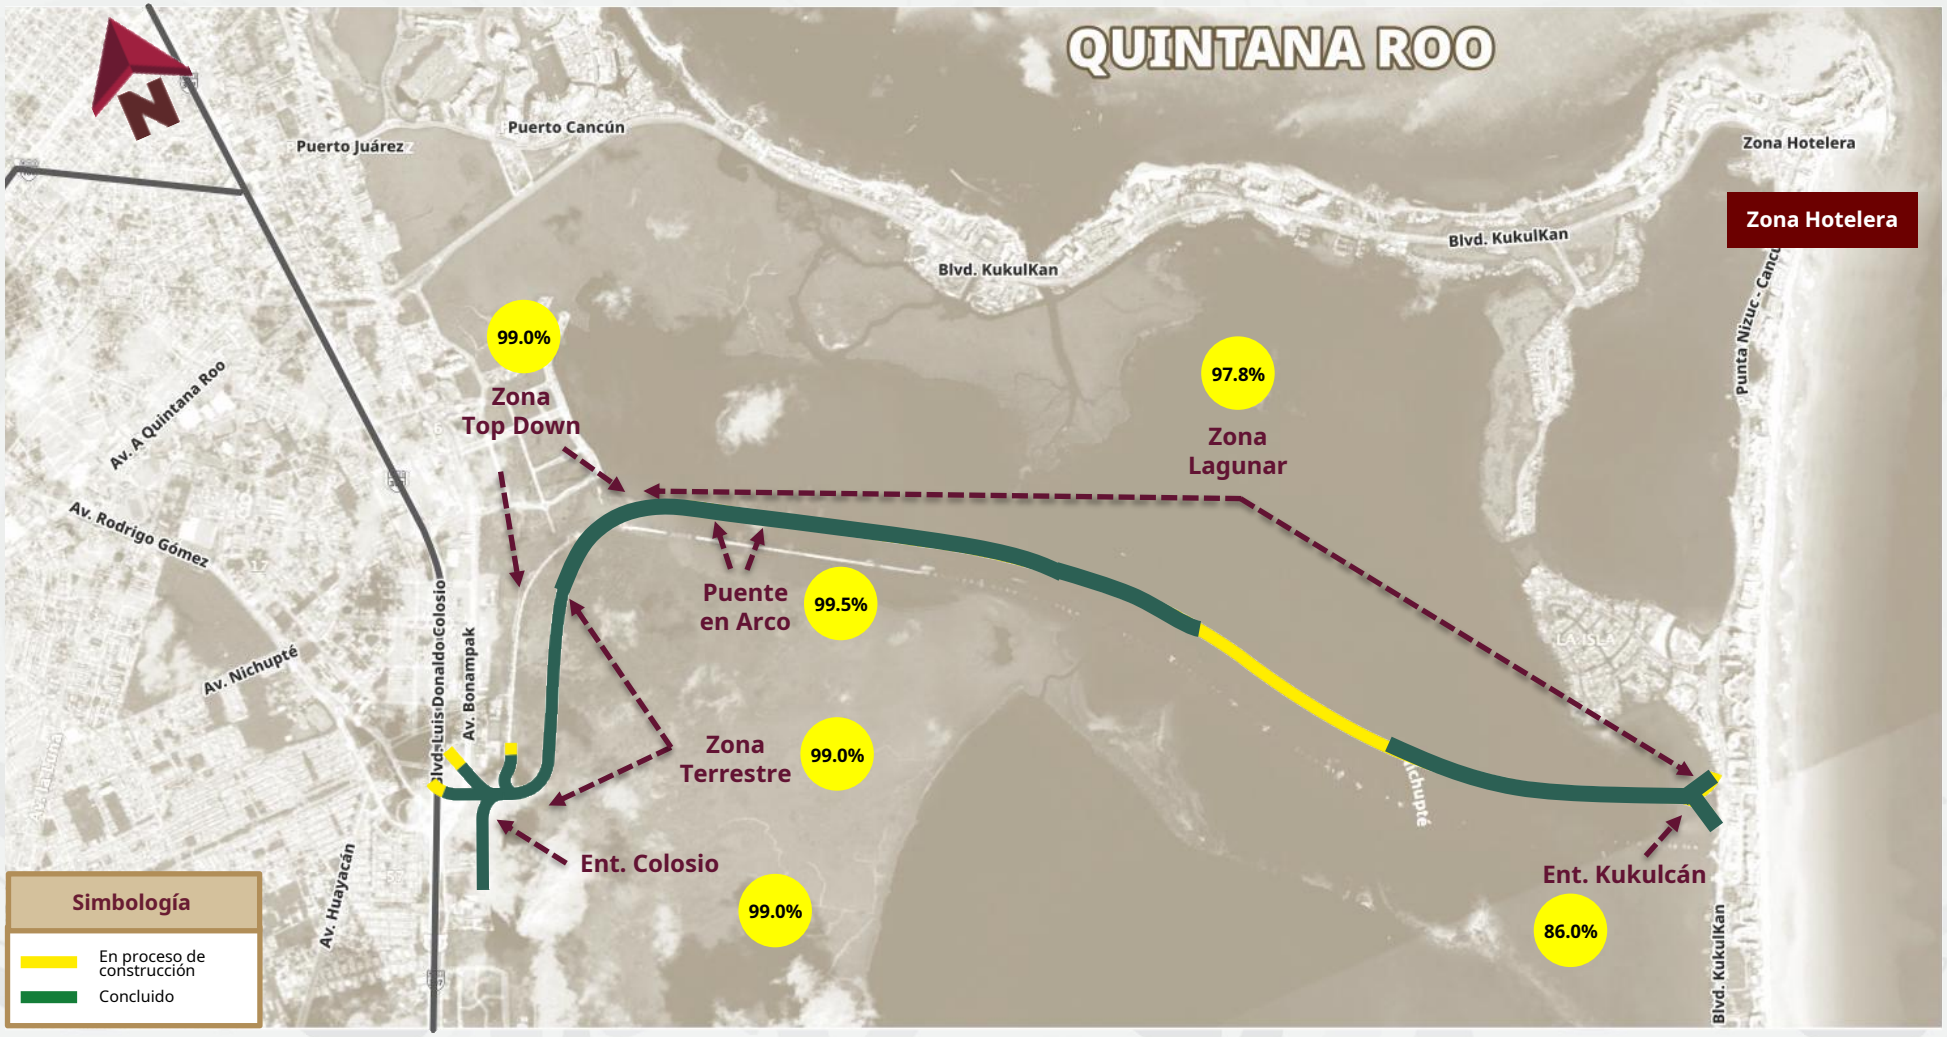

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 marzo 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado 26 de febrero al 04 de marzo de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	16	9	7	1	Marzo 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	1.0	3.0	0	Marzo 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	1.0	3.0	1.0	Marzo 2026
Guarnición (m)	21,041.57	20,175.2	866.4	829.5	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.37	18,011	3,018.4	1,367.2	Marzo 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	1,511.2	171.9	0	Marzo 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	3,348.1	1,923.9	99.3	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	33.3	49	0	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	331	82	30	Marzo 2026
Luminarias (pza)	426	328	98	4	Marzo 2026
ITS (pza)	36	25	11	1.8	Marzo 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	96	35	0	Marzo 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	37	94	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Fisico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

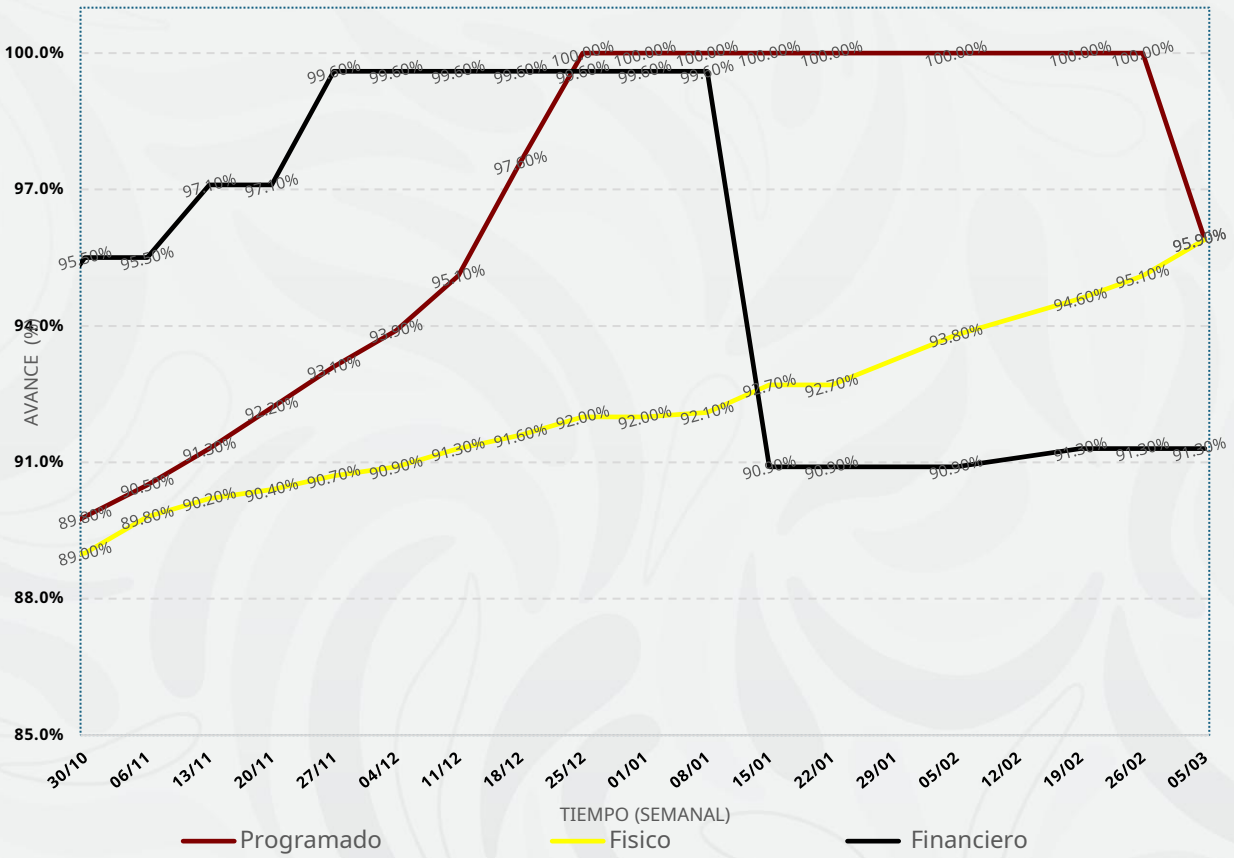

	17/02/26 al 23/02/26	24/02/26 al 02/03/26
Fuerza de Trabajo (personas)	717	700
Maquinaria	71	55
Frentes de trabajo	13	13
