San Ignacio-Tayoltita

Tramo Sinaloa-Durango

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico
- Programado: 100 %
- Real: 100 %
- Financiero: 99.9%

CONCLUIDA

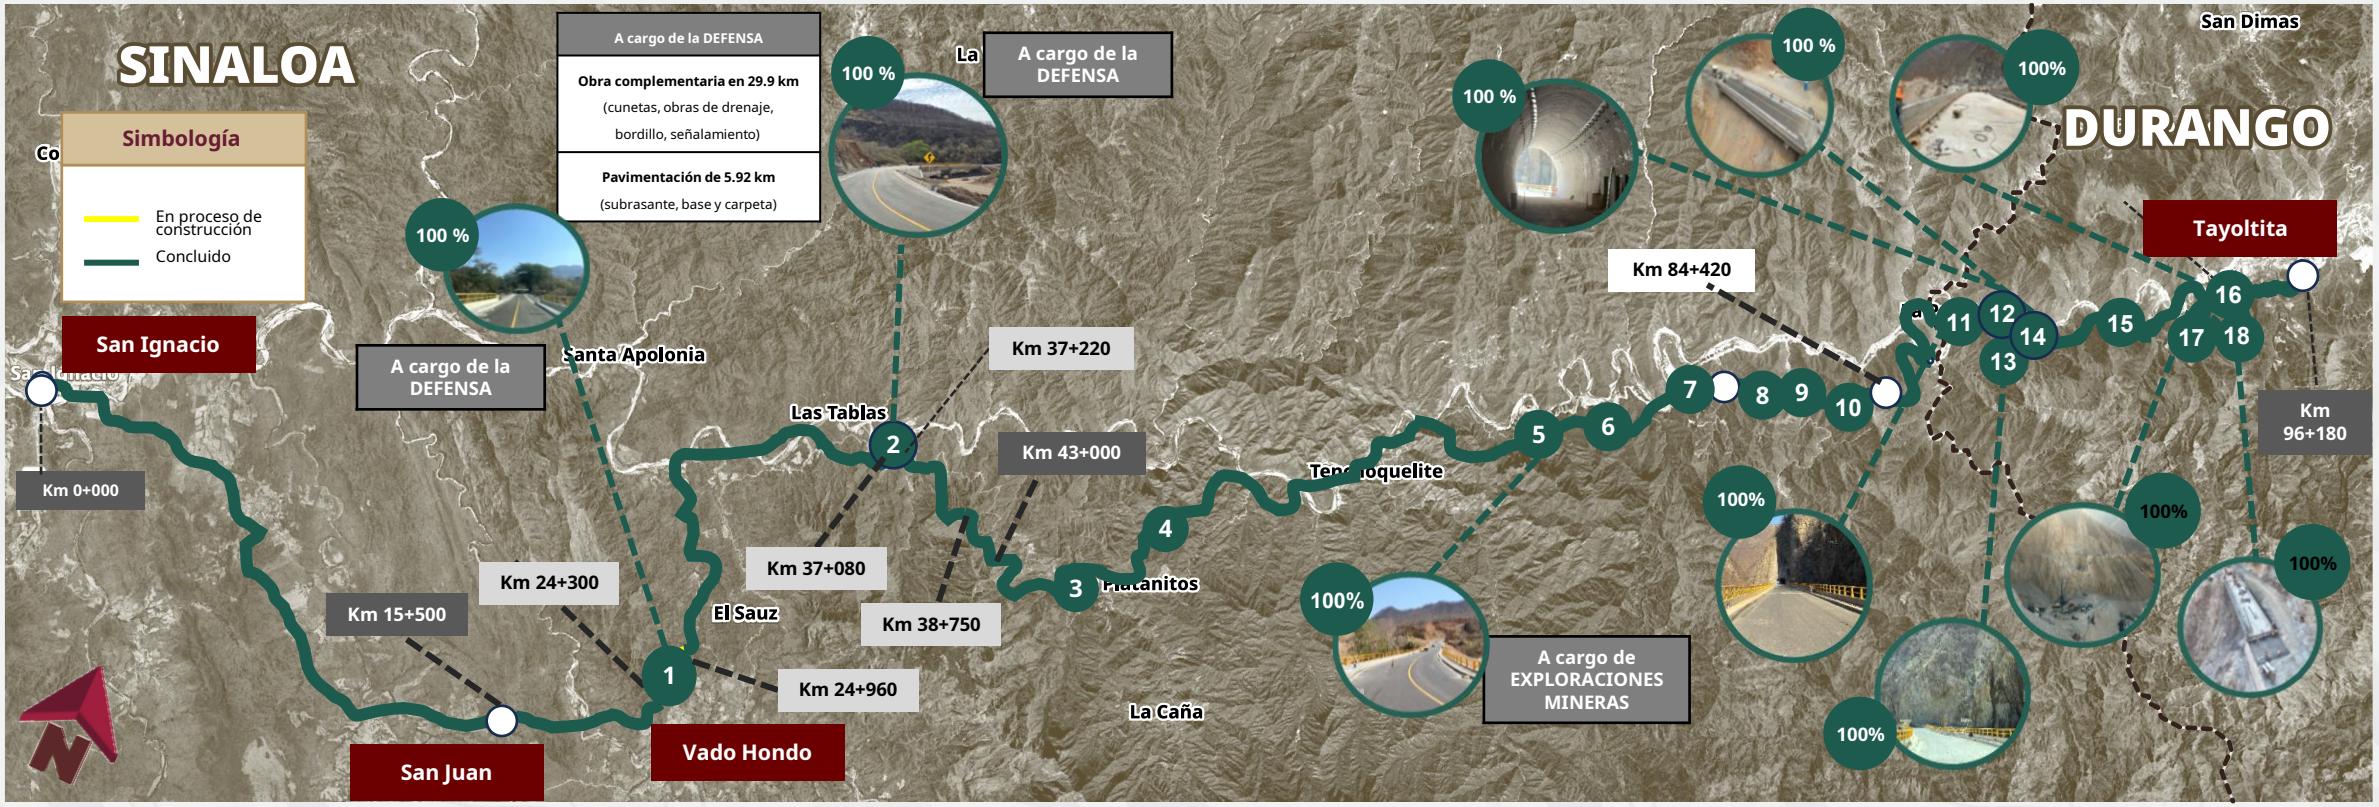

	Descripción	Empresas
16	**Puente Auxiliar I km 93+240** L=240 m	• COCONAL S.A.P.I. de C.V.
17	**Viaducto El Sauz km MDP 93+420** L= 171 m	
18	**Puente Auxiliar II km 93+700** L= 30 m	

Inversión: 3,500.5 mdp
2019-2024: 3,058.5 mdp
2025: 242 mdp
2026: 200 mdp

Inicio: abril de 2019
Término: 25 de agosto de 2025

Meta: 96.2 km
- 94.3km de troncal de ampliación de 7 m de corona
- 515 m Túnel "Duranguense"
- 509 m, viaductos (3)
- 880 m, puentes

10,500 empleos generados

11,131 habitantes beneficiados

10 horas /ahorro en tiempo
