Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 98.9%
- Real: 96.9% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.3%
- Financiero: 91.3%

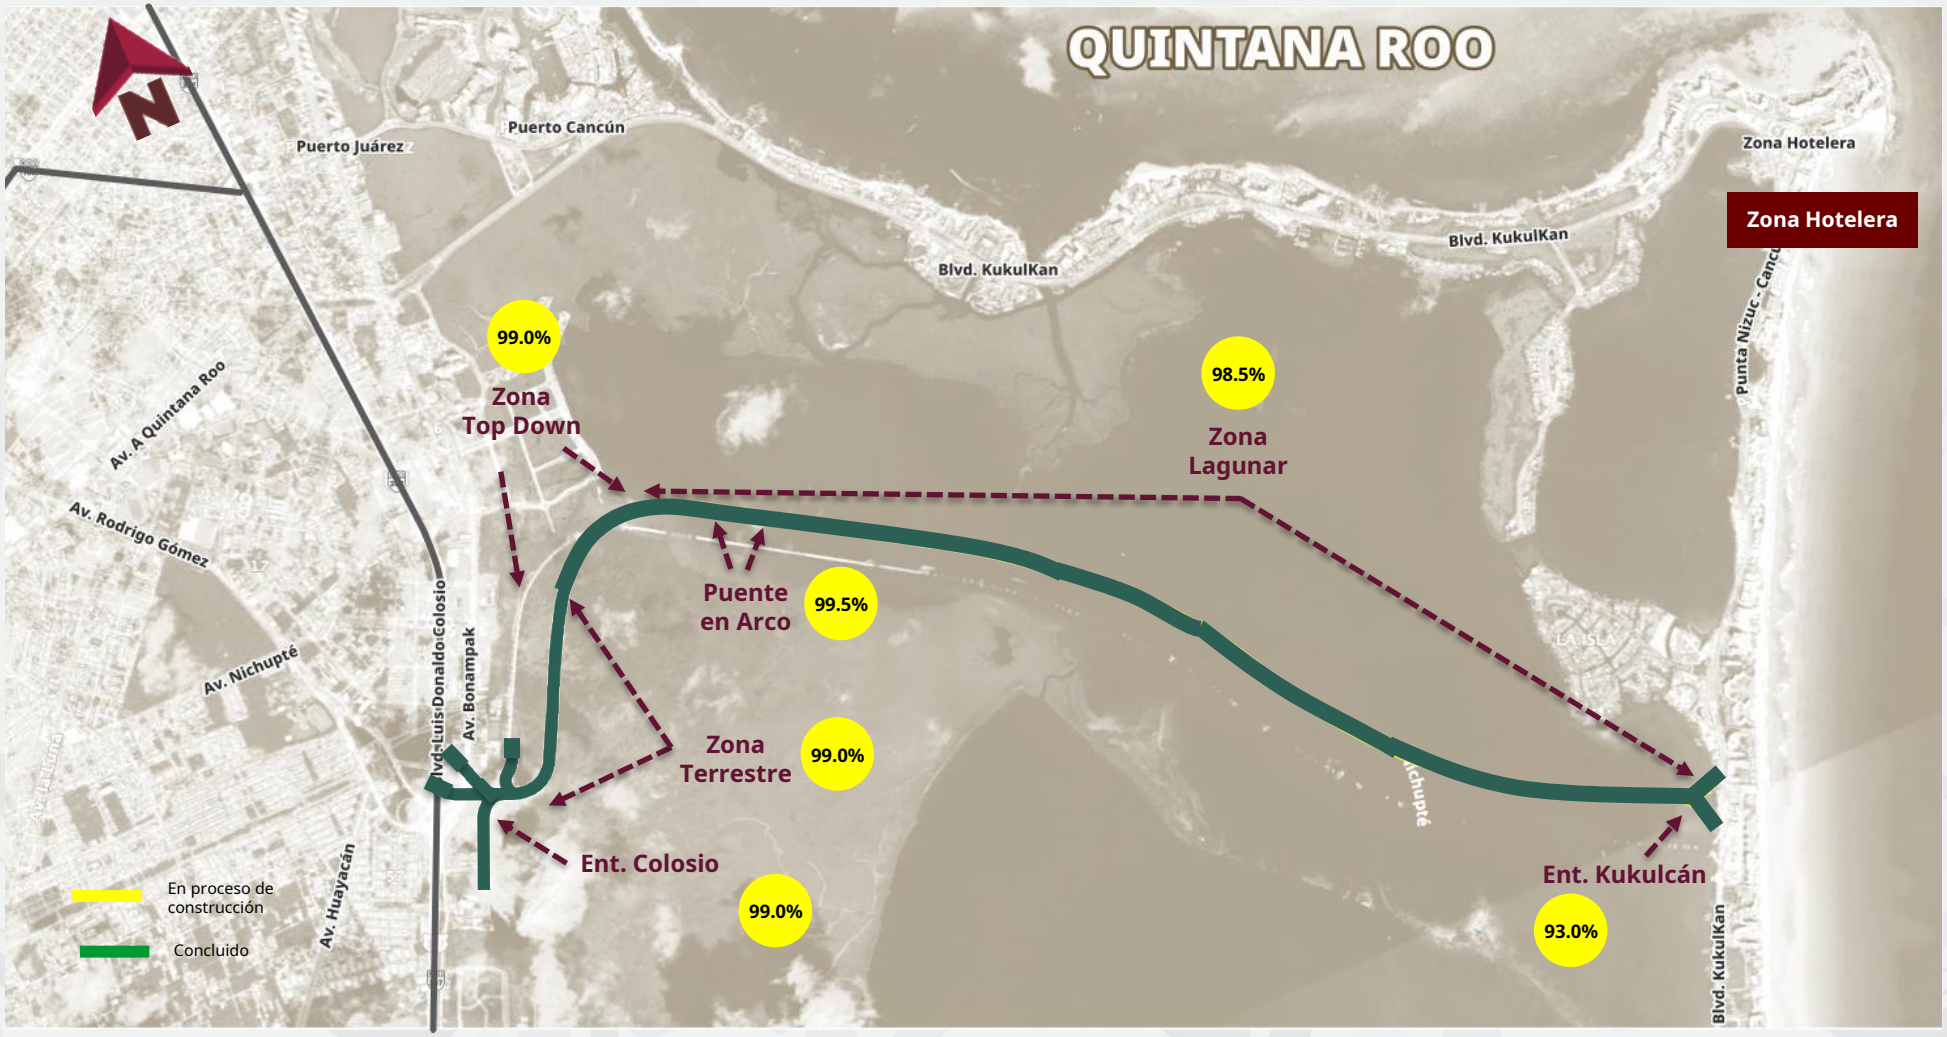

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 15 de abril 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo

Puente Vehicular Nichupté

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 19 al 25 de marzo de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	16	15	1	2	Marzo 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	4	3.2	0.8	0.7	Marzo 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	4	2.0	2.0	1.0	Marzo 2026
Guarnición (m)	21,036.3	20,616.2	420	0	Marzo 2026
Parapeto (m)	21,029.4	18,260.6	2,768.8	0	Marzo 2026
Pavimento entronques (m3)	1,718.26	1,718.3	0	20.9	CONCLUIDO
Pavimento viaducto (m3)	5,272	4,411	861	454.2	Marzo 2026
Juntas de dilatación (pza)	86.0	57	29	5.6	Marzo 2026
Postes de Alumbrado (pza)	413	393	20	0	Marzo 2026
Luminarias (pza)	430	410	20	4	Marzo 2026
ITS (pza)	36	27.2	8.8	2.0	Marzo 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	124	7	8	Marzo 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	90	41	12	Marzo 2026
Señalamiento vertical elevado (pza)	13	0	13	0	Marzo 2026
Señalamiento vertical bajo (pza)	236	73	163	3	Marzo 2026
Señalamiento horizontal (pza)	11.2	0	11.2	0	Marzo 2026

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Puente Vehicular Nichupté

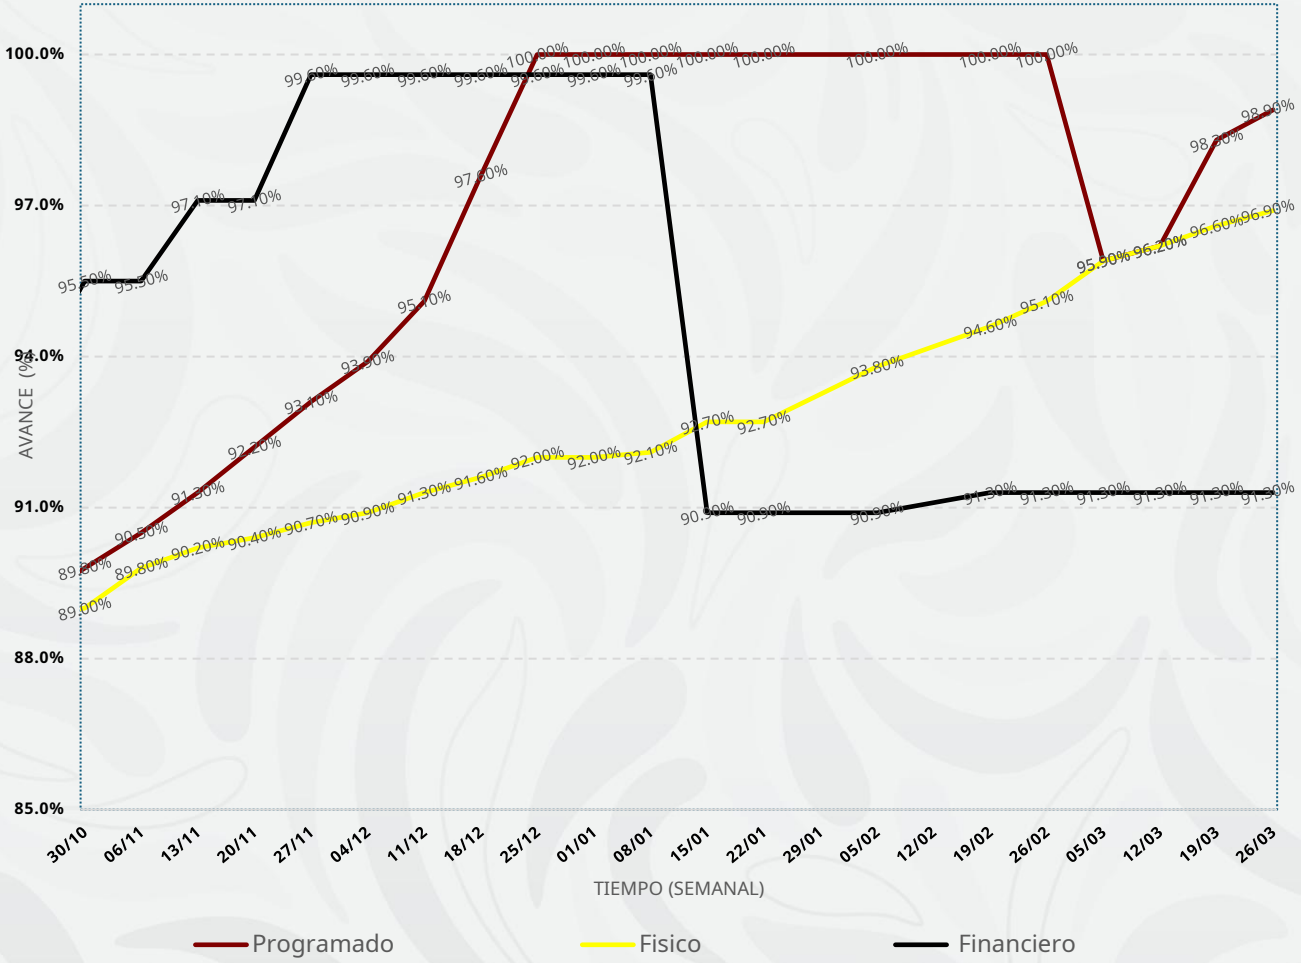

	Del 03 al 12 de marzo de 2026	Del 03 al 12 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	506	436
Maquinaria	58	60
Frentes de trabajo	13	13
