Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 94.6% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.4%
- Financiero: 91.3%

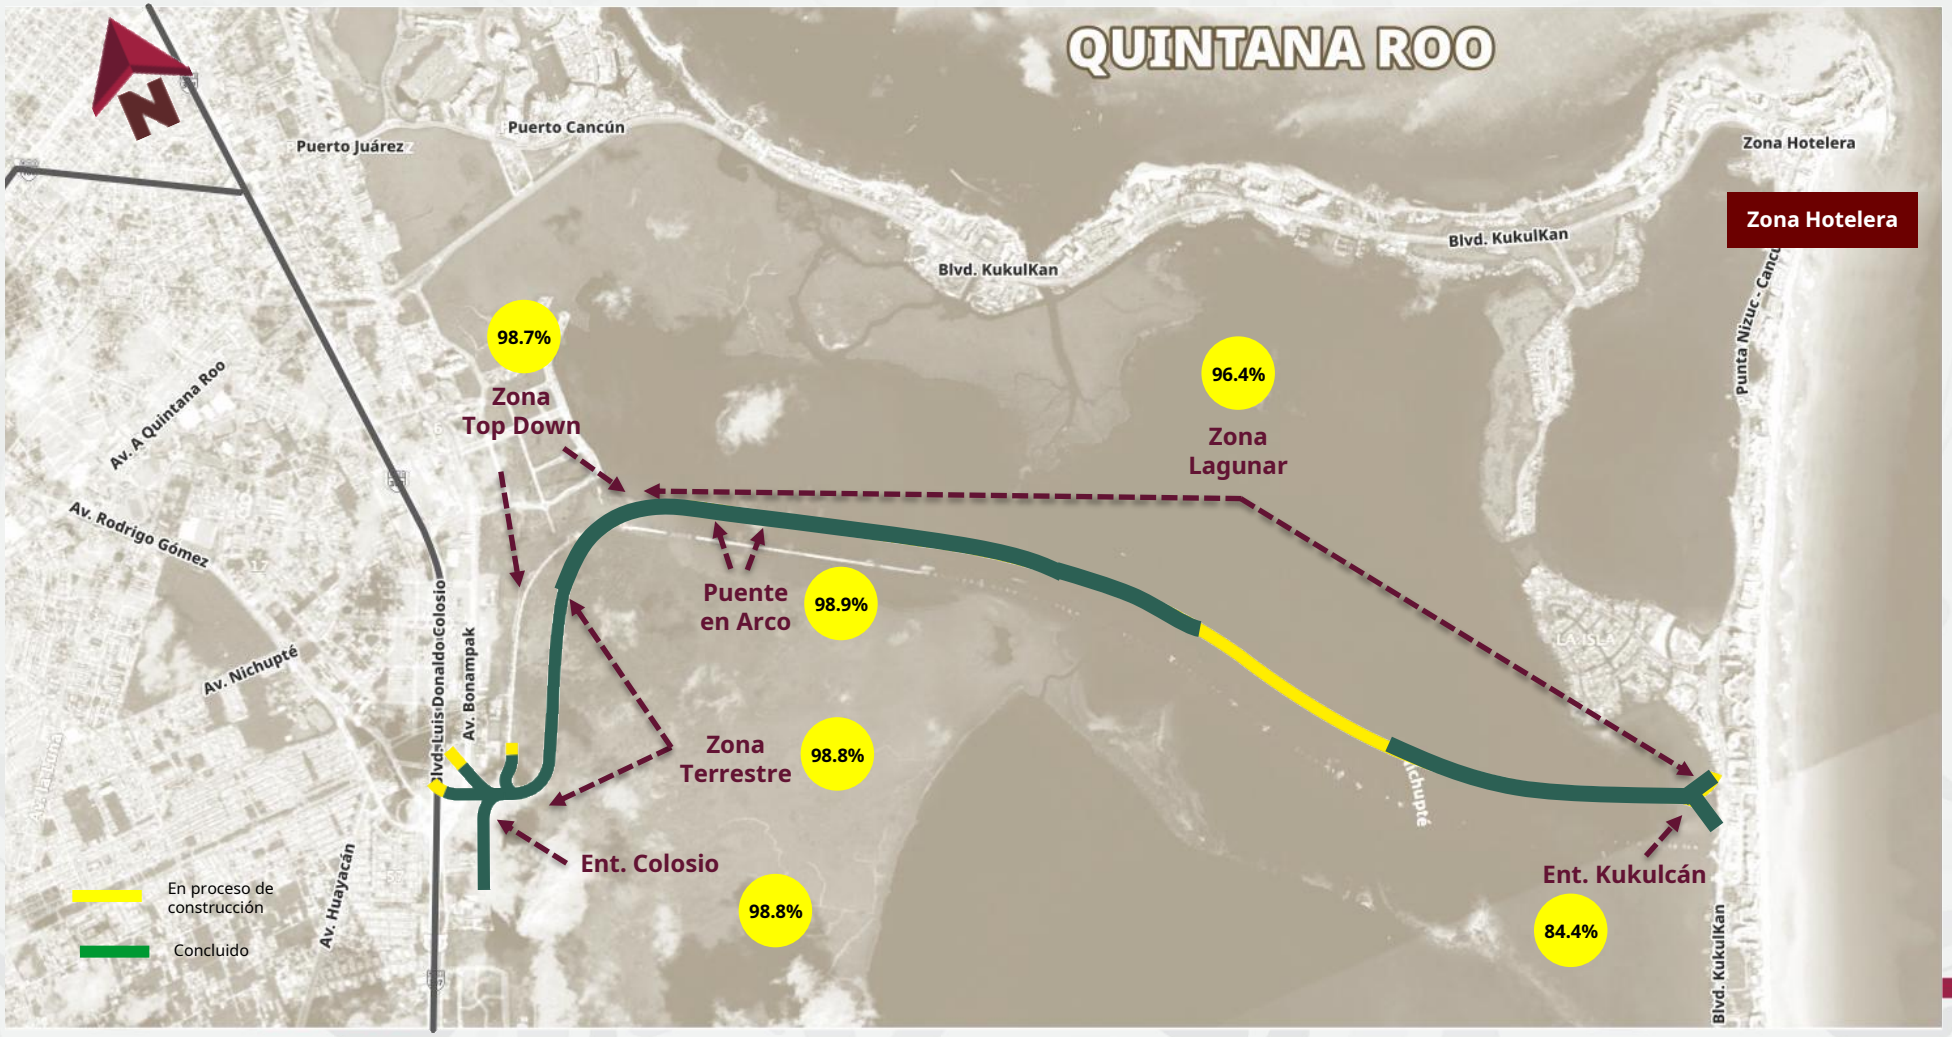

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 marzo 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado del 12 al 18 de febrero de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	12	7	5	2	Febrero 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	3	1.0	2.0	0	Febrero 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	3	0	3	0	Febrero 2026
Apoyo columnas canal de navegación (pza)	5	5.0	-	-	**Concluido**
Columnas alzada (pza)	15	15	-	-	**Concluido**
Mensulas (pza)	5	5.0	-	-	**Concluido**
Montaje de cabezal (pza)	240	240	-	-	**Concluido**
Montaje de trabes Aastho (pza)	1,658	1,658	0	14	**Concluido**
Montaje de prelosas (pza)	45,024	45,024	0	1,240	**Concluido**
Losa (claro)	281	275	6	8	Febrero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	18,632.7	2,403.6	849.2	Febrero 2026
Parapeto (m)	21,029.37	15,859.8	5,169.6	474.6	Febrero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	1,511	172	0	Enero 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	2,824	2,448	282	Febrero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	27.5	54.5	9.2	Febrero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	414	334	99	90	Febrero 2026
Luminarias (pza)	427	326	116	82	Febrero 2026
ITS (pza)	36	16.6	19.4	0	Febrero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	95	36	1	Febrero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	48	83	12	Febrero 2026

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

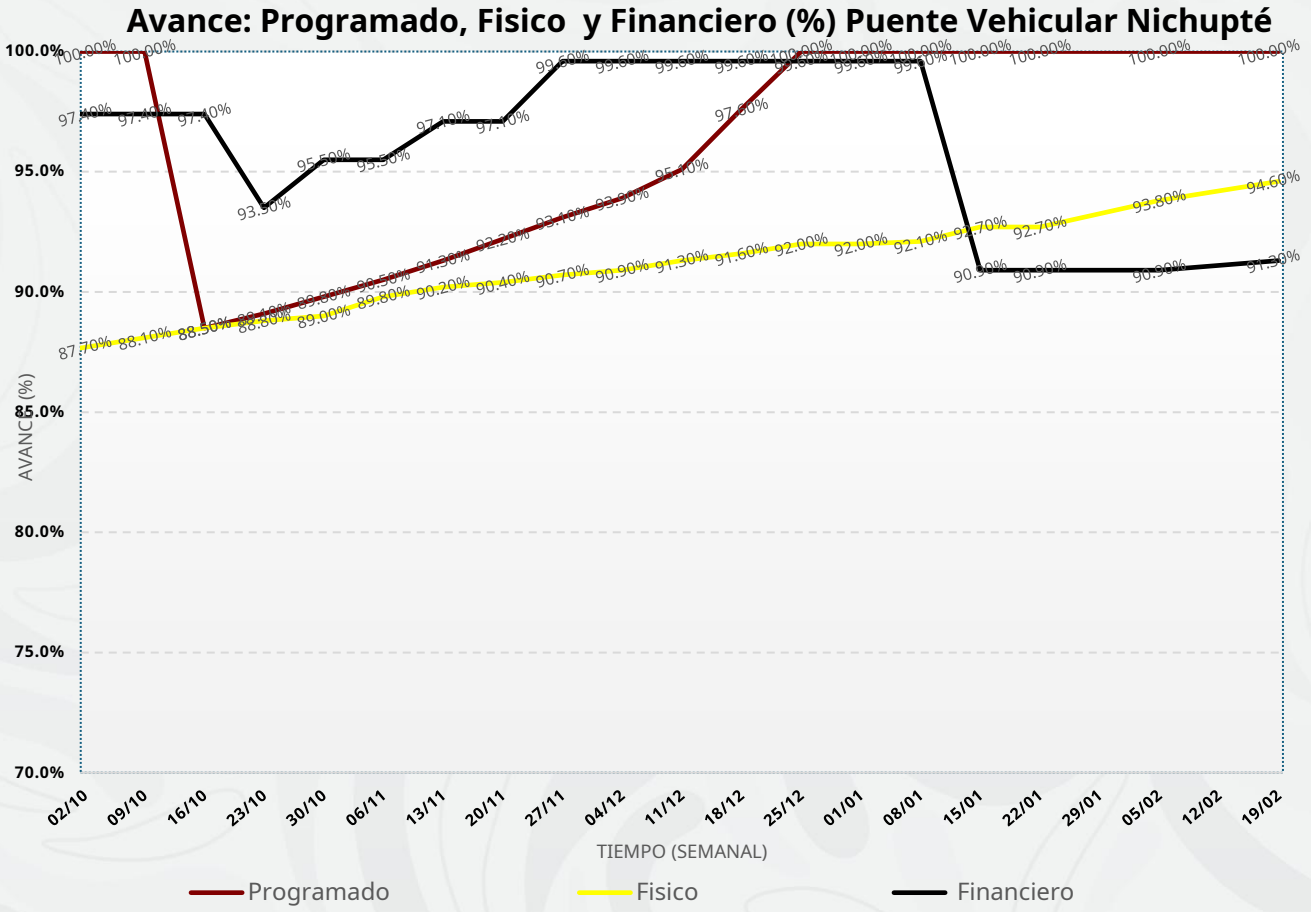

	Del 06 al 12 de febrero de 2026	Del 13 al 19 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	820	820
Maquinaria	83	82
Frentes de trabajo	13	13

2026 año de Margarita Maza
