Quintana Roo
Puente Vehicular Nichupté

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 95.1% (REPROGRAMACION)
- Semanal: 0.5%
- Financiero: 91.3%

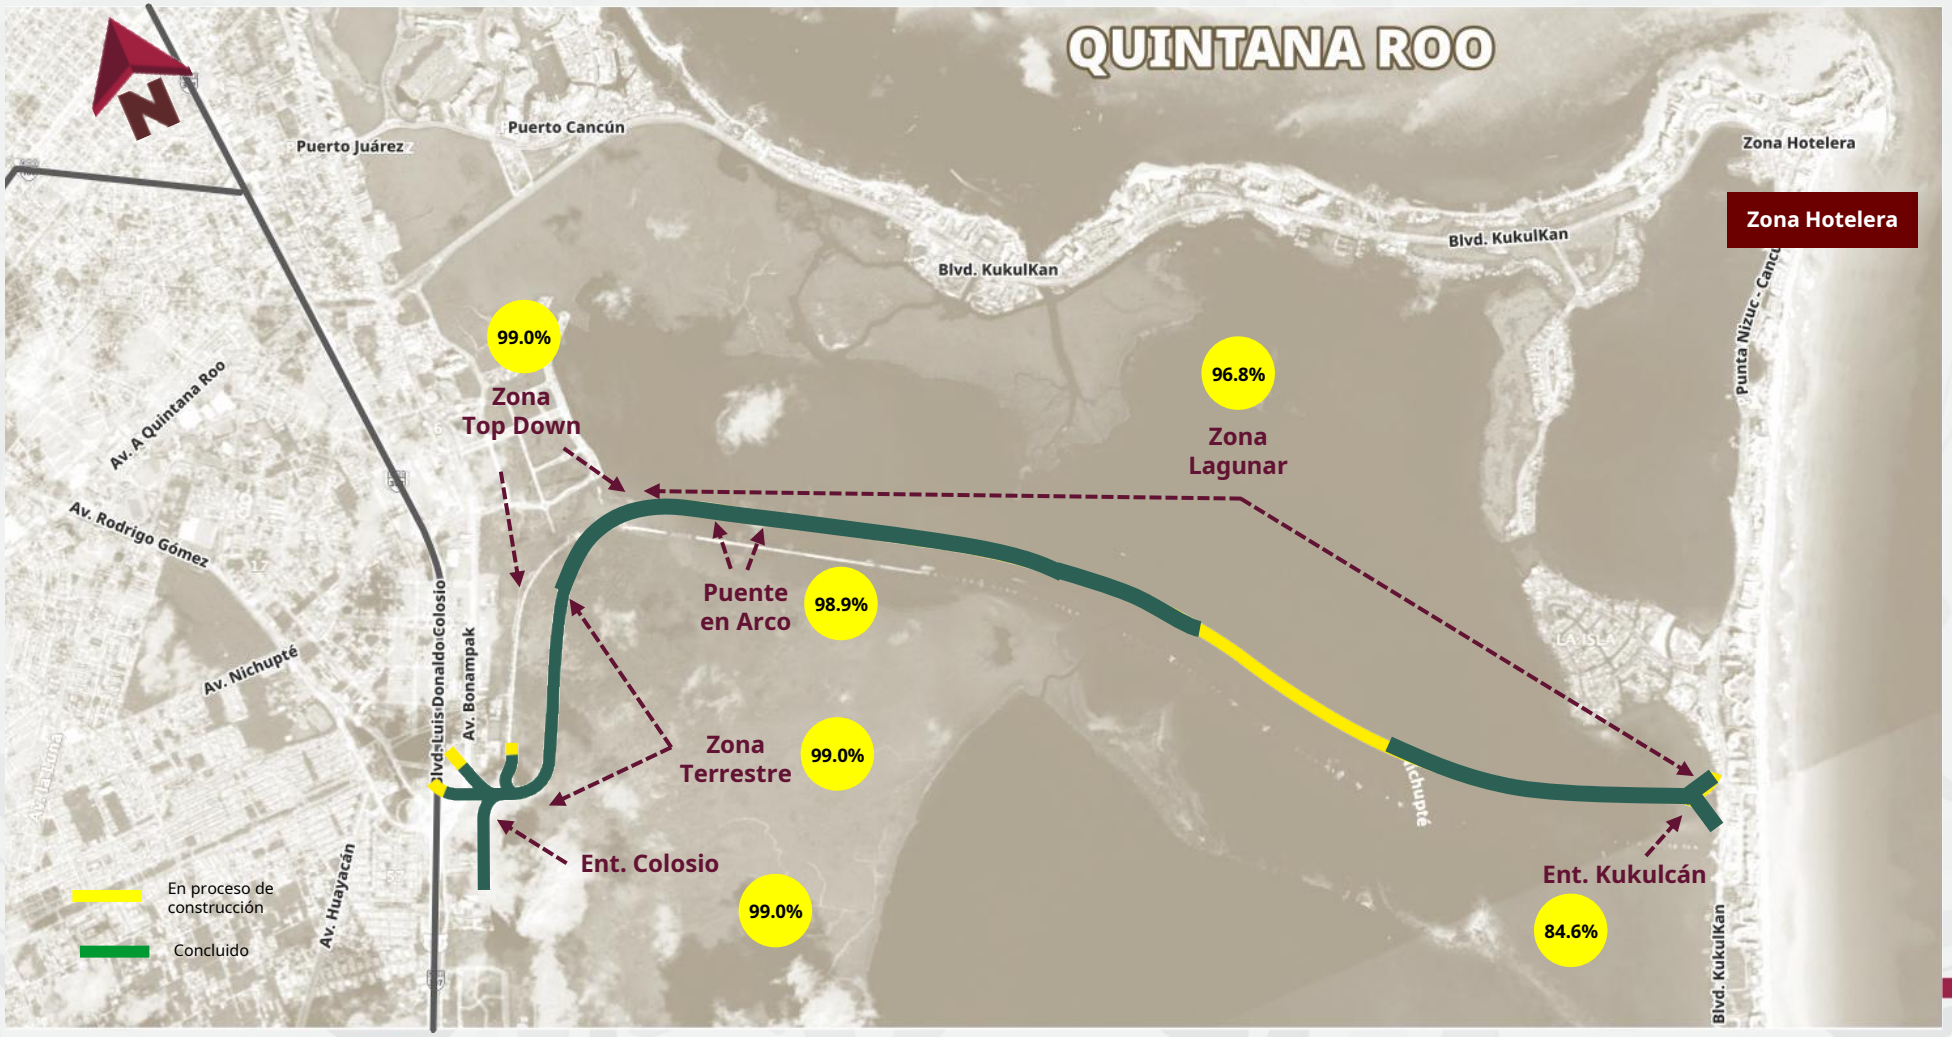

Inversión Total: 10,319.5
2022-2025: 9,419.5 MDP
Programado 2026: 900 MDP

Inicio: 01 de julio de 2022
Término: 31 marzo 2026

Meta: 11.2 km
- 8.8 km, de puente (3 carriles, 2 de circulación y 1 reversible)
- 2.4 km entronques (2)
- Puente en Arco Metálico (1) 103 m

Más de 51 mil empleos generados
20 millones de turistas

1.32 millones de habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo

Quintana Roo (Puente Vehicular Nichupté)

Gobierno de México | Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado de l 20 al 25 de febrero de 2026	Fecha contractual de terminación
Pilas de cimentación adicionales (pza)	12	7	5	2	Febrero 2026
Fabricación de cabezales metálicos (pza)	3	1.0	2.0	0	Febrero 2026
Montaje de cabezales metálicos (pza)	3	0	3	0	Febrero 2026
Losa (claro)	281	281	0	6.0	Febrero 2026
Guarnición (m)	21,041.57	19,345.7	1,690.6	713	Febrero 2026
Parapeto (m)	21,029.37	16,643.8	4,385.6	784	Febrero 2026
Pavimento entronques (m3)	1,683	1,511	172	0	Enero 2026
Pavimento viaducto (m3)	5,272	3,294	1,978	470	Febrero 2026
Juntas de dilatación (pza)	82.0	33.9	48.1	6.4	Febrero 2026
Postes de Alumbrado (pza)	414	328	85	0	Febrero 2026
Luminarias (pza)	427	337	89	0	Febrero 2026
ITS (pza)	36	22.6	13.4	1.2	Febrero 2026
Fabricación de cajas de retención (pza)	131	96	35	1	Febrero 2026
Montaje de cajas de retención (pza)	131	48	83	0	Febrero 2026

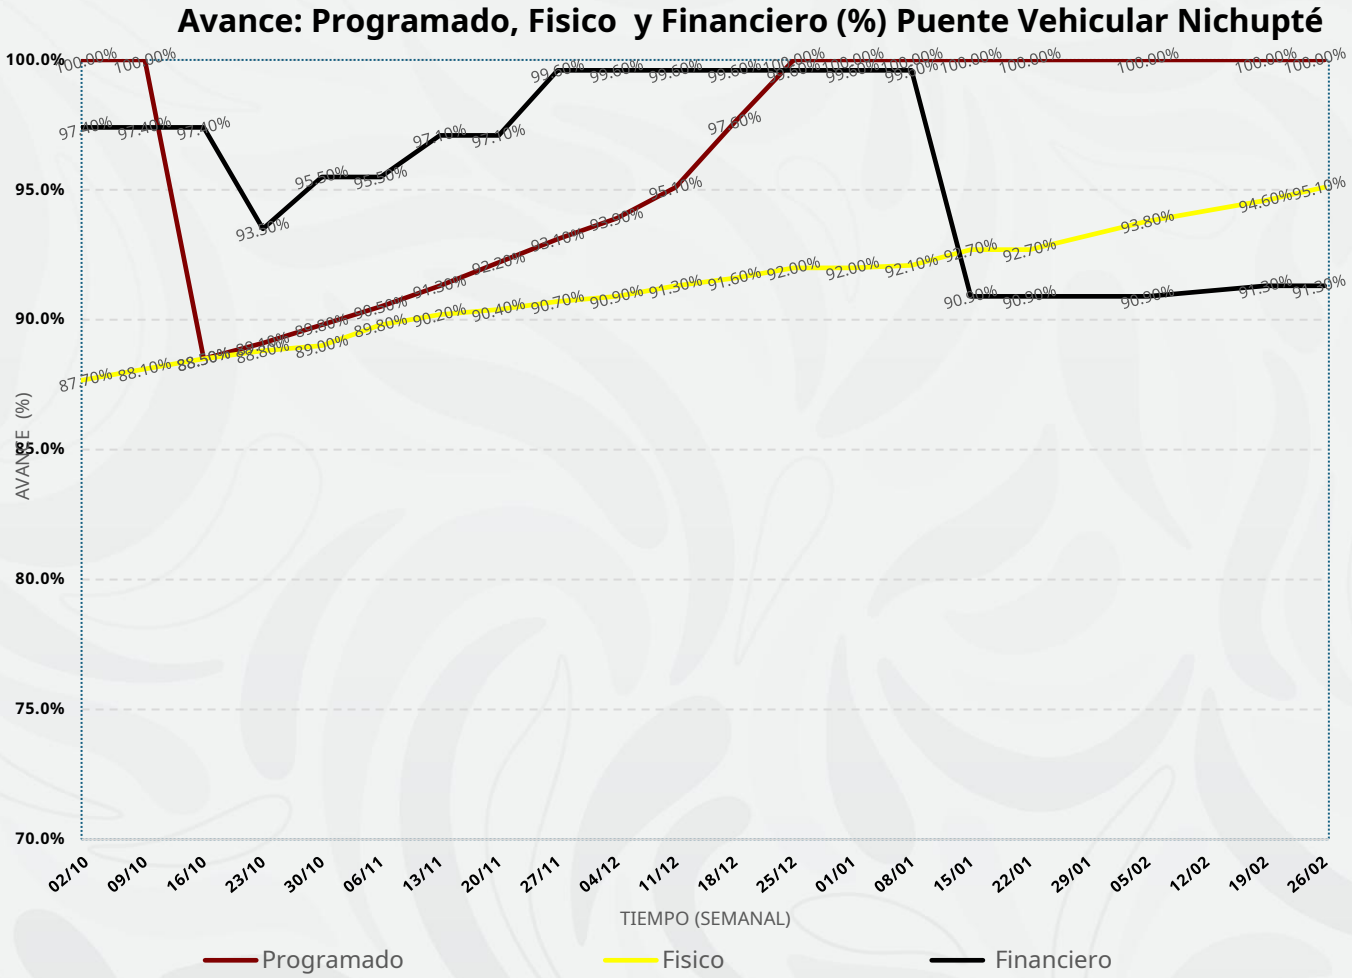

	DeDel 13 al 19 de febrero de 2026 l 06 al 12 de febrero de 2026	Del 20 al 25 de febrero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	820	717
Maquinaria	82	71
Frentes de trabajo	13	13

2026 año de Margarita Maza
